



Europska unija  
Zajedno do fondova EU



GRAD BENKOVAC

# Intervencijski plan Grada Benkovca

# SADRŽAJ:

0	Uvod.....	4
0.1	Svrha i predmet dokumenta.....	4
0.1.1	Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima .....	4
0.1.2	Kronologija i kontekst nastanka dokumenta .....	5
0.1.3	Metodologija izrade podrazumijeva sljedeće korake u pripremi dokumenta .....	6
0.1.4	Svrha i predmet dokumenta .....	11
0.2	Sukladnost s rezultatima analize područja .....	13
0.2.1	Nalazi Analize područja općenito .....	13
0.2.2	Planske domene.....	16
0.2.3	Razvojne teme .....	17
0.2.4	Analiza intervencijske logike.....	18
0.2.5	Razvojni scenariji .....	19
0.3	Informiranje i javne konzultacije u procesu razvoja IP-a.....	24
I	Razvojna strategija grada.....	25
I.1	Razvojna vizija grada .....	25
I.2	Razvojni ciljevi .....	25
II	Razvojni prioriteti .....	38
III	Plan provedbe.....	52
III.1	Prioritizacija projekata.....	52
III.2	Portfolio projekata .....	55
III.2.1	Projektni obrasci .....	55
III.2.2	Vremenski plan provedbe .....	157
III.3	Upravljanje .....	158
III.3.1	Organigram i odgovornosti u provedbi IP-a.....	158
III.3.2	Plan praćenja provedbe IP-a i održivost projektnih rezultata .....	160
III.3.3	Kapaciteti za provedbu IP-a .....	162
Prilozi .....	164	
PRILOG 1	Analiza područja grada Benkovca .....	164
PRILOG 2	Poster plan grada Benkovca.....	164
PRILOG 3	Akcijski plan IP-a Grada Benkovca .....	164

**Popis kratica:**

EFRR	Europski fond za regionalni razvoj
ESF	Europski socijalni fond
ESI fondovi	Europski strukturni i investicijski fondovi
EU	Europska unija
FZOEU	Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
HGK	Hrvatska gospodarska komora
HZMO	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
HZZ	Hrvatski zavod za zapošljavanje
IP	Intervencijski plan
IVD	Indeks višestruke deprivacije
JIP	Jedinica za intervencijski plan
JLS	Jedinica lokalne samouprave
LAG	Lokalna akcijska grupa
MRMS	Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
MRRFEU	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
MSP	Malo i srednje poduzeće (ili poduzetništvo)
NKD	Nacionalna klasifikacija djelatnosti
NN	Narodne novine
OCD	Organizacije civilnog društva
OPKK	Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020.
OPG	Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
OPULP	Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020.
PPDS	Područja od posebne državne skrbi
PPUO/G	Prostorni plan uređenja općine/grada
PRR	Program ruralnog razvoja
SC	Specifični cilj
TP	Tehnička pomoć
TZ	Turistička zajednica
UO	Upravni odjel
ŽRS	Županijska razvojna strategija
EP	Element projekta

# 0 UVOD

---

## 0.1 SVRHA I PREDMET DOKUMENTA

0.1.1 Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima

Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima (u nastavku teksta: Program) program je koji, koristeći sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondova), provode Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) i Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (MRMS). Program prvenstveno obuhvaća integriranu urbanu regeneraciju 5 pilot područja - malih gradova putem intervencijskih planova (IP-ova) za svaki od gradova, koji će zatim poslužiti kao temelj za provedbu pojedinačnih projekata koji doprinose razvojnim prioritetima i ciljevima utvrđenima u intervencijskim planovima. Osim samih intervencijskih planova, Program obuhvaća i razvoj institucionalnog kapaciteta ključnih dionika za provedbu integriranih intervencija te komplementarne aktivnosti na središnjoj razini: unaprijeđenu statistiku siromaštva na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini te odgovarajuće mapiranje siromaštva.

5 pilot područja – Vukovar, Beli Manastir, Petrinja, Benkovac i Knin MRRFEU je odabralo Odlukom o pilot područjima za provedbu Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima od 18. veljače 2015. na temelju sljedećih kriterija: veličina grada iskazana brojem stanovnika (10.000 do 35.000 stanovnika) te stanje okupiranosti tijekom agresije na Republiku Hrvatsku. Pri tome je poštivana i obveza da jedno od pilot područja karakterizira značajan udio pripadnima romske manjine i stoga je pilot područje grada Belog Manastira prošireno na općinu Darda zbog značajnog udjela romskog stanovništva.

Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima financira se iz dvaju fondova: Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Europskog socijalnog fonda (ESF), tj. iz dvaju operativnih programa koji određuju strateške i operativne modalitete njihovog korištenja: Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. (OPKK), specifičnog cilja 9b1 - *Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva i komplementarnih aktivnosti specifičnog cilja 9.i.2 - Jačanje aktivnog uključivanja kroz implementaciju integriranih puteva prema regeneraciji 5 nerazvijenih pilot Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. (OPULJP).* Ukupna alokacija iz dvaju operativnih programa za razdoblje od 2014.-2020. je 120 milijuna EUR, pri čemu je 100 milijuna iz EFRR-a i 20 milijuna iz ESF-a, uz 15% nacionalnog sufinanciranja.

U skladu s OPKK-om, dva su glavna očekivana rezultata korištenja EFRR-a i komplementarnog korištenju ESF-a unutar ovog Programa:

- Poboljšanje socioekonomskih i životnih uvjeta u najmanje pet malih gradova pilota s 10 000 do 35 000 stanovnika što će smanjiti daljnji gubitak stanovništva. Paketi

- intervencija rezultirat će regeneracijom degradiranih područja i doprinijeti smanjenju nejednakosti, socijalne isključenosti i siromaštva.
- Projektiranje i ispitivanje novog modela pristupa regeneraciji depriviranih područja temeljenog na području kroz adresiranje problema socioekonomiske deprivacije koncentrirane na nekom geografskom području.

Programi su koncipirani kao integrirana teritorijalna ulaganja po uzoru na model integriranih teritorijalnih ulaganja razvijen za veće urbane aglomeracije u regulatornom okviru za ESI fondove. Taj je model na adekvatan način prilagođen potrebama i institucionalnim kapacitetima malih i višestruko depriviranih gradova.

#### 0.1.2 Kronologija i kontekst nastanka dokumenta

Proces pripreme Programa, uključujući mapiranje siromaštva s ciljem identifikacije 5 pilot područja, pripremu analitičke i metodološke podloge za izradu intervencijskih planova, oblikovanje relevantnih tijela na lokalnoj razini, provedbu analiza potreba i identifikaciju ciljeva, kao i konačno samu izradu IP-ova, započeo je 2015.

MRRFEU koordinira pripremu i provedbu Programa uz podršku triju vanjskih timova tehničke pomoći.

1. Projekt „Tehnička pomoć Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU u pripremi Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogodjenim područjima“ (Ugovor o uslugama tehničke pomoći br. 06-C\_UK-0259/15-90), koji provode stručnjaci iz WYG savjetovanja, prvi je započeo s radom u prosincu 2015. godine.

Projekt je pripremio analitičku i metodološku podlogu za pripremu intervencijskih planova (Metodologiju izrade analize područja i intervencijskog plana, analize područja za 4 pilot područja, doradu Analize stanja grada Knina, Intervencijski plan za Grad Knin koji je poslužio kao pilot za razvoj ostalih IP-ova te nizostalih relevantnih dokumenata, materijala i rezultata Projekta).

2. Projekt „Tehnička pomoć za izradu intervencijskih planova gradovima Beli Manastir (uključujući Općinu Darda), Benkovac, Petrinja i Vukovar“ (Ugovor o uslugama tehničke pomoći br.: 06-C-UK-0313/16-90) – ovaj projekt - koji provode stručnjaci tvrtke Razbor d.o.o, a koji je započeo s radom u kolovozu 2016. godine.

Projekt nastavlja na i djelomično teče paralelno s prethodnim. Zadaća je stručnjaka pod ovim projektom temeljem izrađene analitičke i metodološke osnove proizišle iz prethodnog, te na osnovu pilot modela Intervencijskog plana za Grad Knin, pripremiti intervencijske planove za preostala 4 područja. Osim toga, projekt ima zadatak pripremiti pozive na dostavu projektnih prijedloga za provedbu IP-ova te pomoći izgradnju kapaciteta jedinica za IP i partnerstava za IP u obuhvaćenim područjima.

3. Projekt „Ex-ante evaluacija intervencijskih planova za gradove Beli Manastir (uključujući Općinu Darda), Benkovac, Knin, Petrinju i Vukovar (Ugovor o uslugama ex ante evaluacije intervencijskih planova br.: 06-C-U-0009/16-90: koji teče paralelno s dva prethodna ugovora, a provode ga stručnjaci tvrtke Urbanex d.o.o..

Za potrebe izrade Intervencijskoga plana, a u skladu s Metodologijom izrade analize područja i intervencijskog plana, osnovana su radna i savjetodavna tijela: Odlukom o imenovanju članova Jedinice za izradu Intervencijskog plana grada Benkovca od 17.02.2016., te Odlukom o imenovanju članova Partnerstva za intervencijski plan Grada Benkovca od 17.02.2016. U periodu od 24. veljače do 10. srpnja 2016. godine, uz pomoć tehničke pomoći „Tehnička pomoć Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU u pripremi Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima“, izrađena je Analiza područja grada Benkovca. Tijekom procesa, održane su 3 radionice s dionicima (Partnerstvo za intervencijski plan). Dokument analize područja usvojilo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU 10. srpnja 2016. godine.


Na temelju ovih intervencijskih planova, MRRFEU će, i dalje uz podršku timova tehničke pomoći i adekvatno uključivanje JIP-ova i PIP-ova, pripremiti i provesti relevantne pozive na dostavu projektnih prijedloga te poduprijeti provedbu na adekvatan način ocijenjenih i odobrenih projekata.

#### 0.1.3 Metodologija izrade podrazumijeva sljedeće korake u pripremi dokumenta

- 1) **Uspostava lokalnog partnerstva i relevantnih kapaciteta na lokalnoj razini** koji omogućuju participativni pristup izradi analize područja i strateškom planiranju.

Formalizacija partnerskog pristupa postignuta je uspostavom:

- Jedinice za IP-e (JIP), zadužene za vođenje planskog procesa i izradu kvalitetnog plana (multidisciplinarni tim službenika Grada te po potrebi ostalih javnih tijela).
- Partnerstva za IP (PIP); koje osigurava adekvatnu uključenost svih relevantnih dionika iz javnog, privatnog i civilnog sektora koji mogu aktivno pridonijeti procesu

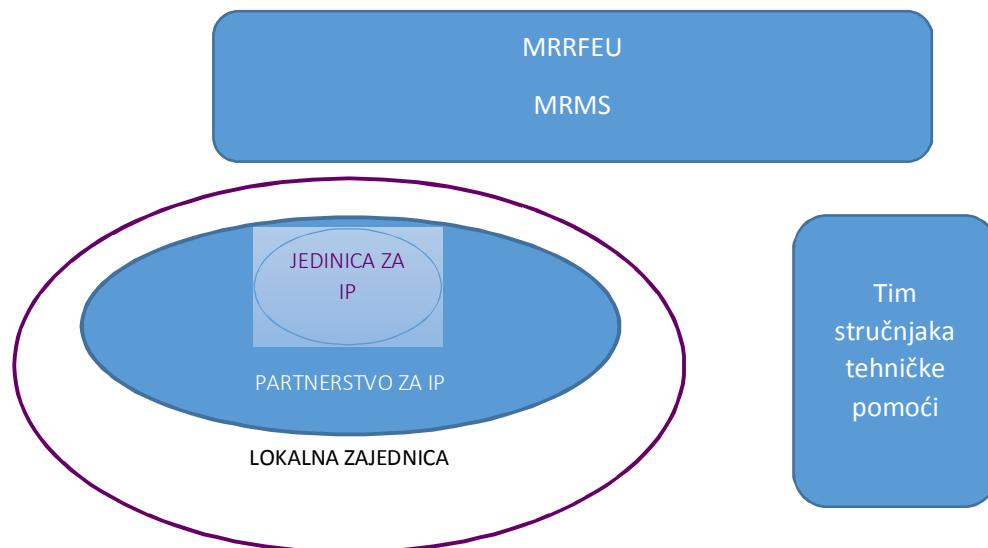

## 2) Izrada analize područja

Analiza područja je zasebni dokument kojim su identificirane teritorijalne potrebe, područja i domene intervencije i prezentirane u obliku tematskih i/ili prostornih razvojnih opcija koje predstavljaju podlogu za daljnje planiranje, tj. izradu intervencijskog plana.

Proces analize obuhvaćao je:

- Identifikaciju i analizu mreže **dionika** (pred-korak, koji je omogućio oblikovanje JIP-a i PIP-a)
- **Analizu pisanih izvora** (prostorno-planskih i strateških dokumenata te dokumentacije o postojećim programima i projektima i baza podataka)
- **Operativnu analizu**, uključujući:
  - identifikaciju **planskih domena**

*Planske domene su razvojni koncepti koji omogućuju preliminarno grupiranje tema i nalaza analize); za potrebe izrade svih IP-ova, definirane su sljedeće planske domene: „Okoliš, krajolik i upravljanje prirodnim resursima“, „Mobilnost, promet i stanovanje“; „Poljoprivreda i ruralni razvoj“, „Industrija i poduzetničko okruženje“; „Društvene djelatnosti, usluge u zajednici, odgoj i obrazovanje“ i „Kulturno nasljeđe i turizam“, koje su se u radu prilagođavale specifičnim okolnostima, nalazima i potrebama pojedinih gradova.*

- dijalog s lokalnim partnerstvom na temu razvojnih hipoteza iz analize pisanih izvora
- preliminarno prikupljanje projektnih ideja i izradu baze projektnih ideja (u svrhu razvoja dijaloga s partnerstvom i bolje identifikacije potreba i mogućnosti)
- izradu **SWOT analize** prema planskim domenama
- na temelju izrađenog SWOT-a i analize stanja: identifikaciju **razvojnih tema**

*Razvojne teme određene su prostorom i sadržajnim fokusom/temom. Pri prostornom definiranju tema razmatrana je koncentracija razvojnih potreba u određenom području Grada te interakcija između različitih projektnih ideja, dok su teme određene sadržajem predloženih intervencija odnosno utvrđenih potreba. U Gradu Benkovcu prostorno gledajući, ističe se jedna tema: Benkovački sajam. Svaka razvojna tema razmatrana je kroz relevantnost odnosno probleme i potrebe, opis teme, predložene intervencije, indikativnu vrijednost i zrelost. Na kraju svake teme dan je prikaz najvažnijih prednosti i nedostataka svake od teme.*

- prezentaciju razvojnih pitanja i dijalog o opcijama s lokalnim partnerstvom
- finalizaciju dokumenta na temelju povratnih informacija dobivenih od dionika

3) Izrada intervencijskog plana, na temelju nalaza Analize područja:


Izrada IP-a prema Metodologiji obuhvaćala je sljedećih nekoliko koraka:

A) Strateško planiranje

- planiranje **razvojnih scenarija**, na temelju identificiranih problema i razvojnih rješenja prepoznatih u analizi područja.

*Metodologija izrade analize područja i intervencijskoga plana predviđa razradu razvojnih scenarija kao prvog koraka u izradi IP-a, a na temelju identificiranih problema i razvojnih rješenja prepoznatih u analizi područja.*

*Tehnika scenarija (planiranje scenarija, izrada planskih scenarija) podrazumijeva konstruiranje mogućih razvojnih budućnosti lokalne zajednice (alternativnih setova razvojnih ciljeva). Svrha upotrebe ove tehnike je omogućiti lokalnom partnerstvu da stvori jasne i postojane poveznice između percipiranih problema i željenih (i/ili favoriziranih) intervencija u nesigurnom okruženju, odnosno, da osigura konzistentnost planskog procesa i njegovih rezultata. Na ovaj način razvojne teme utvrđene kroz analizu područja se razmatraju kao rješenja teritorijalnih problema i razrađuju u smislu definiranja alternativne vizije, ciljeva i prioriteta intervencijskog plana. Scenariji razvoja trebaju dati odgovor na pitanje koja je željena budućnost, koje su alternative na raspolaganju i koje su njihove posljedice.*

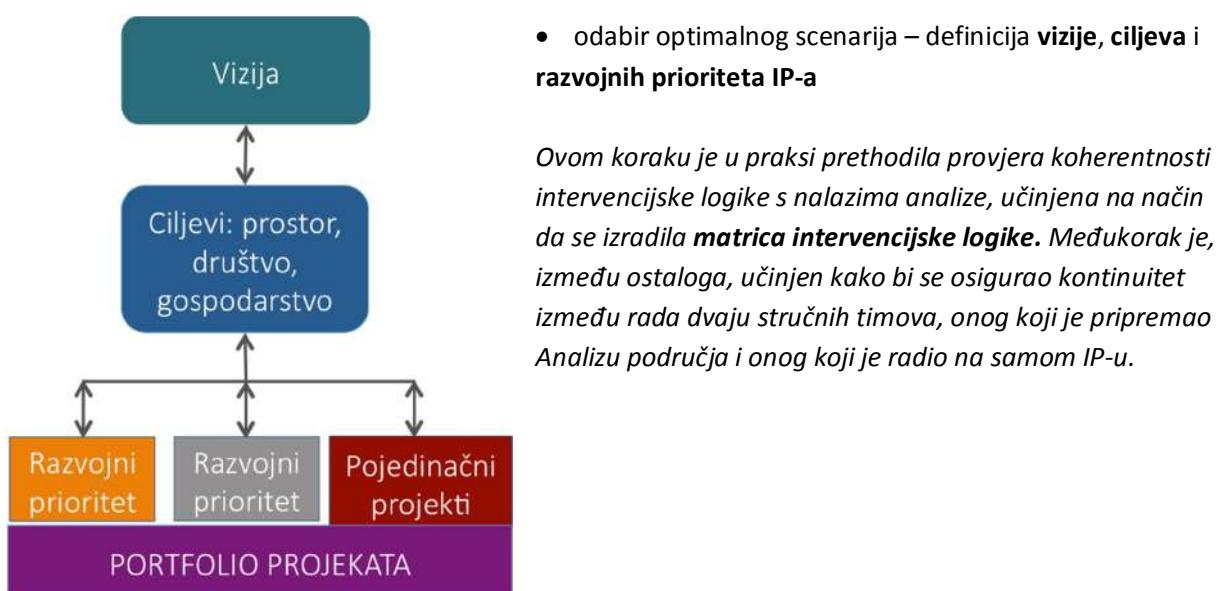

## B) Operativno planiranje

Izrada **akcijskog plana**, što uključuje:

- **detaljnu identifikaciju** projekata prethodno prepoznatih u bazi (vidi fazu analize) i izradu detaljnih projektnih obrazaca
- **prioritizaciju i selekciju** projekata na temelju kriterija ocjene utvrđenih zadanom metodologijom a dodatno razrađenih u suradnji s JIP-om.

Projekti su kategorizirani prema njihovom doprinosu razvojnim ciljevima i prioritetima. Osim toga, razvrstani su u sljedeće kategorije:

- *glavni, ključni* projekti su oni oko kojih postoji snažan konsenzus i obvezanost dionika na njegovu provedbu
- *komplementarni* projekti su bitni za ostvarenje ciljeva IP i logiku intervencije svakog prioriteta teritorijalnog razvoja, ali zbog svoje vrijednosti, širine i/ili jačine utjecaja, nisu od presudne važnosti
- *horizontalni* projekti su nematerijalne aktivnosti (npr. obrazovanje, pružanje usluga, unaprjeđenje učinkovitosti uprave) koje su usmjerene na ljudske resurse i institucionalno jačanje. Horizontalni projekti dio su razvojnih projekata IP-a ili su pojedinačni.


Prioritizacija projekata izvršena je ocjenjivanjem svakog od projekata prema definiranim kriterijima, od kojih svaki ima različitu težinu (doprinos ciljevima Programa, integriranost projekta, izvore financiranja, doprinos zapošljavanju i poticanje lokalnog gospodarstva, normativna zrelost, logika intervencije i metodologija provedbe projekta).

### ○ Izradu projektnog portfelja

Izrada konačne baze projekata, s naznakama o modalitetima njihove provedbe:

- kao individualnih projekata, koji mogu, ali ne moraju biti vezani za specifični razvojni prioritet i koje priprema jedan prijavitelj
- grupe projekata koja se odnosi na jedan razvojni prioritet, tj. tematski su ili prostorno koncentrirani
- otvorenih poziva na dostavu projektnih prijedloga, koji podrazumijevaju prethodno identificirane teme i vrste operacija u okviru razvojnih prioriteta, no ne obuhvaćaju unaprijed definirane projekte ili pojedinačne korisnike/prijavitelje

Grafička shema u nastavku prikazuje planski proces od rezultata analize područja do izrade intervencijskog plana.

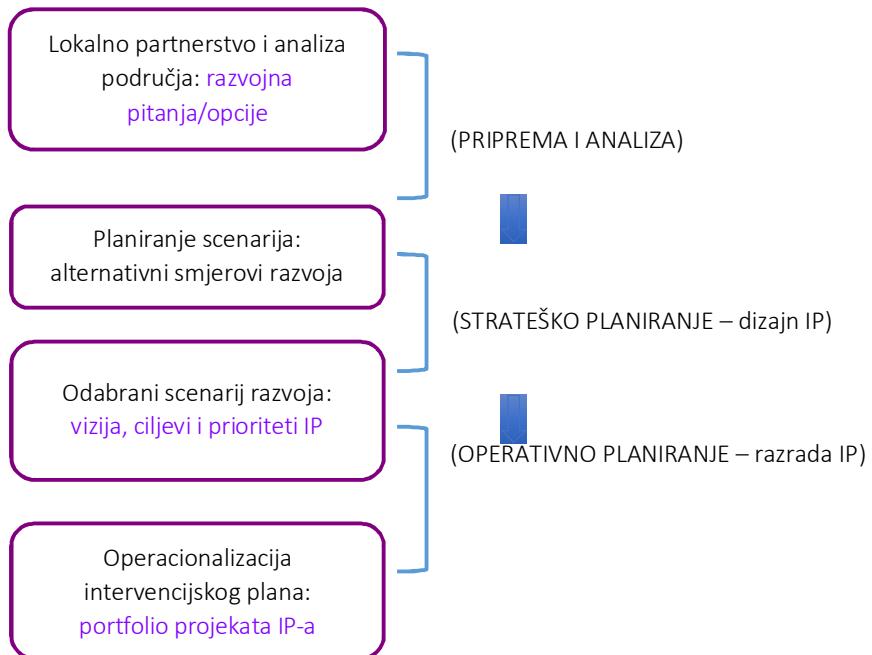

#### 0.1.4 Svrha i predmet dokumenta

Intervencijski plan zamišljen je kao integriran (međusektorski), teritorijalni i participativni dokument čiji je cilj identificirati razvojne potrebe i definirati ciljeve i razvojne prioritete te akcijski plan za provedbu intervencija fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima.

Osnovni elementi koje ovaj dokument sadrži jesu:

- Analitički dio (Poglavlje 3): Ishodišne analitičke pretpostavke, tj. identificirane ključne potrebe područja u odnosu na fizičku, gospodarsku i socijalnu regeneraciju (temeljene na prethodno izrađenim dokumentima Analize područja)
- Strateški dio (Poglavlje 4) : Opis razvojne strategije, uključujući:
  - razvojnu viziju
  - razvojne ciljeve i prioritete
  - modalitete prioritizacije projekata
- Operativno/provedbeni dio (Poglavlje 5):
  - Akcijski plan, uključujući projektni portfelj i vremenski plan provedbe
  - popis upravljačkih mehanizama

Dokument „Intervencijski plan Grada Benkovca“ definiran je na temelju dokumenta Analize područja Grada Benkovca i matrice intervencijske logike te ishodima rada s dionicima u zajednici te je takav rezultirao definiranjem razvojne opcije Grada Benkovca do 2023. godine. Svrha dokumenta je predstavljanje te razvojne opcije tj. scenarija s obzirom na okvire Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima. Dokument je razvojni plan i kao takav daje i strateške i operativne smjernice za ostvarivanje razvoja lokalne zajednice.

Strateški dio dokumenta rezultat je planiranja u kojem su sudjelovali svi dionici s područja Grada Benkovca i temeljen je na njihovoj viziji razvoja. U skladu s definiranom vizijom, a uzimajući u obzir strateški okvir Programa, definirani su ciljevi i razvojni prioriteti s pripadajućim projektima. Operativni dio dokumenta odnosi se akcijski plan provedbe koji uključuje projektne obrasce (portfolio), vremenski raspored provedbe te mehanizme provedbe.

Prilikom izrade IP-a u obzir su uzeti svi relevantni lokalni, regionalni, nacionalni i relevantni planovi/strategije na EU razini.

**Strateški program ukupnog razvoja Grada Benkovca 2012.-2016.** definira strategiju razvoja grada kroz opći cilj: Pokrenut je i usmjereno održivi razvoj benkovačkog gospodarstva i društvenih djelatnosti uz očuvanje i održivo korištenje resursa, a kvaliteta usluga stanovništvu dosije zadovoljavajuću razinu. Također, unutar Programa su definirana 3 posebna razvojna cilja i to: (1) uspješno gospodarstvo, (2) očuvanje i održivo korištenje resursa te (3) visoka kvaliteta usluga stanovništvu.

Opći cilj **Plana razvoja turizma destinacije Benkovac** je dugoročan i sustavan razvoj turizma na području Grada Benkovca kako bi, pored poljoprivredne proizvodnje, turizam postao jedna od glavnih gospodarskih djelatnosti. Plan se temelji na 5 strateških ciljeva: (1) stvoriti organizacijske preduvjete za razvoj turizma; (2) formirati proizvode destinacije Benkovac; (3) uvesti destinaciju Benkovac na tržište; (4) sustavno

razvijati komplementarne sadržaje/atrakcije poticanjem malog i srednjeg poduzetništva – biciklističke/pješačke staze, vinske ceste, boravak na seljačkom gospodarstvu, gastronomiju koji bi produljili boravak turista u ovom području te stimulirali ponovnu posjetu; (5) povezivati se u širi destinacijski sustav tematskim itinererom arheoloških nalazišta.

**Županijska razvojna strategija Zadarske županije 2011.-2013.** godine je temeljni planski dokument za održivi društveno-gospodarski razvoj županije. U strategiji su definirana 4 strateška cilja koja su se koristila prilikom sastavljanja Intervencijskog plana Grada Benkovca. Ti ciljevi su: (1) uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima; (2) razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva; (3) prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine; (4) unaprjeđenje zaštite okoliša i kvalitete života.

**Glavni plan razvoja turizma Zadarske županije 2013.-2023.** je sektorski planski dokument kojim se usmjerava turistički razvitak u Županiji u dužem vremenskom razdoblju. Sastoje se od tri strateška cilja koji doprinose ostvarenju vizije, a temelje se na izvršenim istraživanjima i analizama. Strateški ciljevi su: (1) uspostava održivog učinkovitog sustava upravljanja resursima i potencijalima turizma; (2) smanjenje sezonalnosti kroz razvoj konkurentnog turističkog sektora; (3) unaprjeđenje turističke infrastrukture i usluga, te zaštita okoliša.

Intervencijski plan definiran je također u sukladnosti sa strateškim dokumentima na nacionalnoj razini, prvenstveno *OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.*, *OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.* i *Program ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.* Budući da je IP direktno hijerarhijski ugrađen u ta dva OP-a, on je ujedno i indirektno sastavni dio provedbe europskog strateškog dokumenta *Europa 2020*, koji postavlja okvir za čitavu kohezijsku politiku EU i sve njezine instrumente. Sam Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogodenim područjima u skladu je s ciljem artikuliranim u strategiji Europe 2020 kao «Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti». Strateško usmjerjenje ka provedbi ciljeva Europe 2020 očituje se i u strukturi intervencija u IP-u koje su oblikovane prema trima oblicima regeneracije: društvenoj, gospodarskoj i fizičkoj, pri čemu je društvena regeneracija vođena ciljem uključivog rasta, gospodarska ciljem pametnog rasta, a svi oblici fizičke regeneracije (predviđena ulaganja u fizičku infrastrukturu i prostorni razvoj općenito) artikulirani su imajući u vidu snažan naglasak na aspektima održivosti, osobito u smislu promocije korištenja obnovljivih izvora energije i visoke energetske učinkovitosti. IP je dakle jedan od važnih instrumenata koji ciljevima uključivog, pametnog i održivog rasta doprinositi na lokalnom nivou i to upravo u područjima koja su posebno izložena rizicima siromaštva i socijalne isključenosti.

U obzir su prilikom izrade Intervencijska plana uzimane i za planske domene najrelevantnije nacionalne sektorske strategije, kao što su razvojna usmjerena iz *Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020.*, *Strategije razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013. - 2020.* te *Industrijske strategije Republike Hrvatske 2014.-2020.* Osobito je za Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogodenim područjima značajna *Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti Republike Hrvatske (2014. – 2020.)*, koja uključuje tri okvirna cilja: *osiguravanje uvjeta za borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te smanjenje nejednakosti u društvu;* *osiguravanje uvjeta za sprečavanje nastanka novih kategorija siromašnih kao i smanjenja broja siromašnih i socijalno isključenih osoba te uspostava koordiniranog sustava potpore skupinama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.* Za ostvarenje navedena tri prioriteta i pripadajuće glavne ciljeve

predviđene su aktivnosti u okviru osam strateških područja: obrazovanje i cjeloživotno učenje; zapošljavanje i pristup zapošljavanju; stanovanje i dostupnost energije; pristup socijalnim naknadama i uslugama; pristup zdravstvenom sustavu; skrb o starijim osobama; borba protiv zaduženosti i finansijska neovisnost; uravnoteženi regionalni razvoj. Ovaj Intervencijski plan usmjeren je na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti kroz intervencije u infrastrukturu potrebnu za obrazovanje te cjeloživotno učenje, na razvoj usluga s ciljem većeg samozapošljavanja, otvaranja većeg broja radnih mesta i podizanja konkurentnosti postojećih gospodarskih subjekata.

Prilikom izrade dokumenta uzeti su u obzir razvojni prioriteti europskog strateškog dokumenta *Europa 2020*, čija se vizija socijalne tržišne ekonomije za 21. stoljeće temelji na pametnom, održivom i uključivom rastu, tj. temeljen na prioritetima: (1) pametan rast: razvijanje ekonomije utemeljene na znanju i inovaciji; (2) održiv rast: promicanje ekonomije koja učinkovitije iskorištava resurse, koja je zelenija i konkurentnija; (3) uključiv rast: njegovanje ekonomije s visokom stopom zaposlenosti koja donosi društvenu i teritorijalnu povezanost.

Intervencijski plan definira, na temelju i povrh ovih strateških dokumenata, ciljana teritorijalna ulaganja usmjereni na fizičku, gospodarsku i socijalnu regeneraciju specifičnih područja. Time on donekle ublažava i dokida slabosti općih strategija razvoja kao što su nedostatak finansijskih sredstava za provedbu, nedostatak prioritizacije i sektorska rascjepkanost, i na taj način on efektivno postaje glavni instrument upravljanja razvojem u pet pilot područja. Upravo stoga on funkcionira i kao strateški, ali i kao vrlo operativan dokument kojim će se intervencije usmjeriti na rješavanje najrelevantnijih potreba i iznalaženje najučinkovitijih rješenja za područje Grada Benkovca.

## 0.2 SUKLADNOST S REZULTATIMA ANALIZE PODRUČJA

### 0.2.1 Nalazi Analize područja općenito

Proces izrade Intervencijskog plana za Grad Benkovac započeo je izradom analize područja, koja je definirana temeljem zajedničkog rada Jedinice za Intervencijski plan Grada Benkovca (JIP), Partnerstva za Intervencijski plan Grada Benkovca (PIP) te tehničke pomoći u periodu od veljače do srpnja 2016. godine.

Analiza područja definirala je područje Grada Benkovca kao mjesto koje je još uvijek pod utjecajem ratnih zbivanja, čiji se broj stanovnika 2001. godine smanjio za izuzetnih 62,7% u odnosu na 1991. godinu. Prema Popisu stanovništva iz 2011. godine, na području Grada Benkovca živi 11.026 osoba, od toga 26,0% živi u samom gradu, a preostalih 74,0% u ostalim naseljima. Stanovništvo Benkovca čini 6,5% stanovništva Zadarske županije (170.017), a prema broju stanovnika, Benkovac se nalazi na drugom mjestu u županiji, odmah iza županijskog središta - Grada Zadra. Naglašen je trend starenja stanovnika i depopulacije ruralnih područja Grada, ali i istovremenog povećanja ukupnog broja stanovnika uslijed doseljavanja, što je uzeto u obzir prilikom strateškog planiranja u okviru izrade ovog dokumenta.

Geoprometni položaj Grada Benkovca dobio je na važnosti 1966. godine izgradnjom željezničke pruge Zadar-Knin te posebice 2005. godine izgradnjom autoceste Zagreb-Split. Najvažniju prometnu ulogu imaju državne ceste, ukupne dužine 129,5 km, koje povezuju kopneni dio Republike Hrvatske i obalno područje Zadarske županije. Također, na benkovačkom području se još nalazi 18 županijskih cesta ukupne dužine

153,53 km, 41 lokalna cesta ukupne dužine 107,70 km te 273,22 km nerazvrstanih cesta kojima upravlja Grad.

Gospodarska kretanja ukazuju na pozitivan trend rasta broja poduzetnika. Naime gospodarstvo bilježi trend rasta prihoda i dobiti kod poduzetnika kao i rast broja zaposlenih. Gospodarstvo Grada se oslanja na prerađivačku industriju i trgovinu na veliko i malo, ali su i poljoprivredne djelatnosti (ratarstvo, stočarstvo uz poseban naglasak na vinogradarstvo i voćarstvo) važan faktor razvoja benkovačkog područja. Zbog svojih povoljnih klimatskih uvjeta, područje Grada Benkovca je u posljednje vrijeme prepoznato kao potencijalno središte obnovljivih izvora energije.

Eksplotacija kamena je jedna od glavnih djelatnosti na području Grada Benkovca i ima veliko povijesno i gospodarsko značenje. Prednost ove gospodarske grane se nalazi u velikoj raspoloživosti kvalitetnih prirodnih resursa, postojanju dugogodišnje kamenarske tradicije, kao i prepoznatljivosti benkovačkog kama na kao brenda u kamenarskoj industriji. Dalnjim ulaganjem u rast i razvoj kamenarskog sektora, ova industrijia može postati jedan od nositelja gospodarskog razvoja benkovačkog područja.

*Poljoprivreda je prepoznata kao najznačajniji resurs razvoja benkovačkog područja zbog idealnih klimatskih uvjeta koji pogoduju voćarstvu, vinogradarstvu i povrćarstvu na području Ravnih Kotara te stočarstvu na području Bukovice. Glavna prepreka koja ograničava daljnji razvoj ovog sektora je mala površina posjeda poljoprivrednika koja onemogućava veću iskorištenost proizvodnih potencijala. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, ulaganje u prodajne i skladišne kapacitete te melioracijske sustave bi zasigurno rezultiralo pojačanom aktivnošću lokalnog stanovništva za obradu poljoprivrednih zemljišta i uzgoj stoke. Važno je napomenuti blizinu tržišta poljoprivrednih proizvoda na širem zadarskom području te ulogu Benkovačkog sajma za prezentaciju i promidžbu proizvoda.*

Zbog svoje povoljne geografske i prometne pozicije Grad Benkovac ima dobre mogućnosti za razvoj turizma, ali prema pokazateljima dolazaka i noćenja, ne ostvaruje puni potencijal. Blizina obalnim turističkim mjestima kao i nacionalnim parkovima omogućava Gradu Benkovcu pristup velikom broju potencijalnih turista, koje bi uz povećanje turističkih sadržaja i kapaciteta te intenzivnije promocije Grad mogao privući. Prema pokazateljima dolazaka i noćenja benkovačkog područja, 2012. godine je ostvareno ukupno 469 dolazaka, odnosno 3.245 noćenja, dok je 2013. godine ostvareno 4.099 dolazaka i 36.254 noćenja. Ovaj pozitivan trend se nije nastavio u 2014. godini, kada dolazi do laganog pada dolazaka i noćenja, ali u 2015. godini već se bilježi blagi porast navedenih pokazatelja. Postojeća turistička infrastruktura i ponuda nedostatne su te ih je potrebno proširiti i unaprijediti. Potencijali koje bi Grad Benkovac trebao iskoristiti za ostvarivanje boljeg turističkog rezultata su zasigurno bogato kulturno-povijesno nasljeđe, očuvana tradicionalna i kulturno-povijesna baština te postojanje prirodnih i društvenih resursa za razvoj specifičnih oblika turizma.

Naselje Benkovac i Benkovačko selo čine urbano središte Grada s najvećom koncentracijom usluga i institucija za lokalno stanovništvo i posjetitelje. Iako je dostupnost različitih javnih usluga najveća i najraširenija upravo na ovom području Grada, ipak postoje značajni izazovi s kojima se potrebno suočiti kako bi se osigurali bolji uvjeti života za sve stanovnike: Ulaganje sredstava u uređenje uređenje gospodarske i društvene infrastrukture u jezgri grada (još uvijek prisutni tragovi devastacije jezgre uslijed ratnih razaranja, centar grada trenutno nije dovoljno prepoznat kao točka susreta i privlačenja stanovništva iz drugih, manjih razvojnih središta na ogromnom području Grada Benkovca, a i potencijalni pozitivni efekti pojačanog priljeva ljudi tijekom Benkovačkog sajma minorni su ako se sagleda broj ljudi

koji se zadržava u centru tijekom samog događanja. Potražnja za socijalnim i obrazovnim uslugama kao i uslugama u zdravstvu je velika, ali je nedovoljno pokrivena ponudom kroz ustanove i naročito izvaninstitucionalne oblike podrške. Sadržaji za mlade i usluge u kulturi također nisu dovoljno razvijene, ne provode se kontinuirano te nemaju dovoljno veliku vidljivost na području Grada Benkovca i šire. Inicijative lokalne zajednice iako postoje još uvijek ne generiraju adekvatnu količinu sadržaja i usluga koji bi mogli privući stanovnike iz udaljenijih područja Grada i posjetitelje. Infrastruktura koja može doprinijeti pružanju kvalitetnijih društvenih usluga i obogaćivanju svakodnevnog života različitim sadržajima (kao npr. dnevni boravci za starije i osobe s invaliditetom, društveni domovi, domovi kulture itd.) za građane gotovo u potpunosti nedostaje ili je neadekvatna. Nedostatak usluga i infrastrukture za bolju kvalitetu života posebno pogađa središte grada zbog većeg broja stanovnika i veće frekvencije dolazaka iz drugih naselja te šireg područja županije, ali je problem izražen i u drugim mikro-središtima na području Grada Benkovca kao što su Lisičić, Nadin, Pristeg, Smilčić i Vukšić.

Urbana infrastruktura grada u izrazito je lošem stanju uslijed ratnih razaranja te desetljeća deprivacije i zapuštenosti. Ovdje je primarno riječ o stambenim objektima u staroj jezgri grada koji su u privatnom vlasništvu ali su zbog neriješenih vlasničkih odnosa ili iseljavanja vlasnika neiskorišteni ili nedostupni na tržištu nekretnina. Jedan dio javne infrastrukture u centru grada također nije dovoljno funkcionalan, a po svojoj namjeni bi trebao omogućiti bolju međusobnu interakciju stanovnika i posjetitelja kao što su trgovи, zelene površine i tržnica.

Grad Benkovac ima bogatu industrijsku i poljoprivrednu tradiciju kojoj se ne posvećuje dovoljna pažnja kroz sveobuhvatne programe poticanja poduzetništva i kontinuiranu podršku poduzetnicima početnicima. Nekada snažne gospodarske grane danas jesu značajne ali u usporedbi s nekadašnjim kapacitetima i potencijalom koji imaju, nisu u dovoljnoj mjeri promovirane kao pokretač gospodarskog razvoja. Poseban izazov predstavlja povećanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje. Rad na dalnjem poboljšanju proizvodnih procesa, razvoju novih proizvoda veće dodane vrijednosti i efikasnoj promociji nužan je idući korak u povećanju konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje i lokalnih OPG-ova. Nadalje, lako se u poduzetništvu benkovačkog kraja mogu uvidjeti određeni pozitivni pomaci, kao što je povećanje broja poduzetnika, pozitivni poslovni rezultati ili povećanje broja radnih mjesta čime se utječe na nezaposlenost benkovačkog kraja, još uvijek postoji izazov kako se, planskim ulaganjem u razvoj poduzetničke infrastrukture, mogu stvoriti preduvjeti za stvaranje novih radnih mjesta i otvaranje poslovnih subjekata koji će generirati više razine prihoda i time pridonositi cjelovitom razvoju benkovačkog kraja.

Specifični izazovi vezani uz Benkovački sajam mogu se podvesti pod problem nedovoljno razvijene infrastrukture prostora na kojem se sajam održava zbog čega je nemoguće povećati broj izlagača, a samim time i opseg prihoda, kako subjekata koji prodaju svoje proizvode na Sajmu, tako i Grada Benkovca kao organizatora Benkovačkog sajma. Nadalje, Benkovački sajam se suočava i s problemom gdje se on ne prepoznaje kao jedan od potencijalnih nositelja gospodarstva benkovačkog kraja.

Trendovi na turističkom tržištu ukazuju na rast turističke potražnje, ali i promjene u kvalitativnom smislu, odnosno zahtjevnije suvremene turističke potrošače. Takvi trendovi uvjetovani su različitim društvenim kretanjima koji utječu na promjene u sustavima vrijednosti, sve izraženiju potrebu za učenjem i upoznavanjem lokalnih i autohtonih vrijednosti, kao i na sve izraženiju ekološku svijest. Stoga raste potražnja za posjetom manje poznatim destinacijama i boravkom u ruralnim prostorima. Benkovačko područje raspolaže s brojnim kulturno-povijesnim resursima i atrakcijama te se nalazi u blizini mnogobrojnih prirodnih lokaliteta koji mogu odgovoriti na zahtjeve suvremenog turističkog tržišta. S

jedne strane to su selektivni oblici turizma koji promoviraju aktivni odmor, a s druge strane bogata povijest Benkovca koja pruža mogućnosti svim zainteresiranim u upoznavanje tradicije i povijesti određenih turističkih destinacija. Unatoč bogatoj resursnoj osnovi, turizam na području Grada Benkovca je u početnim fazama razvoja te su potrebna znatna ulaganja kako bi se potaknuo njegov daljnji razvoj. Kada bi se postojeći nedovoljno iskorišteni resursi stavili u funkciju riješio bi se problem održivog korištenja i očuvanja prirodne i kulturne baštine te bi se ujedno generirala i nova radna mjesta, a samim time bi se doprinisalo poboljšanju kvalitete života na tom području. Posljednje tri godine na benkovačkom području nema znatnijeg povećanja ili smanjenja broja noćenja pa bi se ulaganjima trebalo potaknuti stvaranje novih smještajnih kapaciteta ali i stvaranje turističkih proizvoda koji će uspješno privlačiti potencijalne turiste u benkovačko područje.

#### 0.2.2 Planske domene

Prilikom izrade analize područja definirane su planske (tematske) domene za svih 5 gradova. Planske domene su razvojni koncepti koji su se koristili prilikom strukturiranja operativne analize (planskog procesa i rada lokalnog partnerstva). Kroz njih su se organizirale tematske podskupine lokalnih dionika, a iste grupe (teme) su se koristile i za organizaciju analitičko planskog rada (konceptualna organizacija projekata i izrada SWOT analize). Korištenje planskih domena nadalje omogućilo je bolje razumijevanje i utvrđivanje interakcija, potencijalnih sinergija i integracije između potreba/mogućnosti područja, konkretno u ovom slučaju Grada Benkovca.

Za potrebe izrade intervencijskih planova u pet pilot područja **sljedeće domene su odabране kao prikladne kategorije za identificiranje i klasificiranje teritorijalnih izazova malih gradova:**

PLANSKE DOMENE	STUPOVI ODRŽIVOG RAZVOJA	
Okoliš, krajolik i upravljanje prirodnim resursima		Intervencije mahom u gradsko tkivo <sup>1</sup>
Mobilnost, promet i stanovanje	OKOLIŠ	(više EFRR )
Poljoprivreda i ruralni razvoj		
Industrija i poduzetničko okruženje	GOSPODARSTVO	Intervencije mahom u društveno tkivo <sup>2</sup>
Društvene djelatnosti, usluge u zajednici, odgoj i obrazovanje		(više ESF)
Kulturno nasljeđe i turizam	DRUŠTVO	

Kako je prikazano u gornjoj tablici, planske domene povezane su s općeprihvaćenim stupovima održivog razvoja i univerzalnim kategorijama interpretacije urbanih transformacija – okoliš, gospodarstvo, društvo.

<sup>1</sup> Gradsko tkivo – *urban (city) fabric* = morfologija naselja, fizičke karakteristike prostora

<sup>2</sup> Društveno tkivo – *civic (social) fabric* = demografske, socijalne, ekonomske i kulturološke karakteristike i poveznice između ljudi na danom području

Partnerstvo za IP na prvom sastanku u Benkovcu podijeljeno je u šest tematskih skupina:

- I. Tematska skupina ruralni razvoj i poljoprivreda
- II. Tematska skupina mobilnost, promet i stanovanje
- III. Tematska skupina okoliš, prirodni resursi i krajolik
- IV. Tematska skupina industrija, poduzetništvo i poduzetnička infrastruktura (uključujući strukovno, više i visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih)
- V. Tematska skupina društvene djelatnosti, usluge u zajednici, odgoj i obrazovanje
- VI. Tematska skupina kulturno nasljeđe i turizam

#### 0.2.3 Razvojne teme

Identifikacija prioritetnih razvojnih tema rezultat je provedene analize područja, SWOT analize po odabranim planskim domenama te mapiranja projektnih prijedloga pristiglih od dionika. Preliminarno odabrane razvojne teme razmatrane su na konzultacijama s Jedinicom za IP, Partnerstvom i ostalim dionicima, nakon čega su određene prioritete razvojne teme za urbanu regeneraciju područja Grada Benkovca. Razvojne teme ili opcije predstavljaju potencijalne smjerove razvoja koji objedinjuju više planskih domena.

Svaka od tema razmatrana je kroz relevantnost odnosno utvrđene razvojne potrebe identificirane kroz analizu stanja te kroz predložena rješenja. Utvrđena je povezanost teme s razvojnom vizijom Grada (Strateški program ukupnog razvoja Grada Benkovca 2012.-2016) i SWOT analizom te su definirane prednosti i potencijalni nedostaci svake od odabralih razvojnih tema.

Odabrane razvojne teme determinirane su ili prostornim odrednicama pa predstavljaju kombinacije različitih projekata koncentriranih na specifičnom području ili su određene tematski i strateški te predstavljaju kombinaciju tematski povezanih projekata raspršenih na području Grada.

Analizom područja definirane su četiri razvojne teme Grada Benkovca. Razvojne teme su korištene kao svojevrsni razvojni koncepti tijekom procesa izrade analize i rada s Partnerstvom i Jedinicom za IP te su kroz njihovu perspektivu razmatrane i razvojne potrebe i potencijali Grada Benkovca. Projekti koji su prikupljeni prilikom izrade Analize područja također su na listi projekata kategorizirani pod jednu od razvojnih tema. Te teme su sljedeće:

- Benkovac – centar društvenog života Ravnih Kotara i Bukovice
- Benkovac – centar razvoja poduzetništva Ravnih Kotara i Bukovice
- Valorizacija Benkovačkog sajma
- Projekt razvoja turističke ponude temeljene na selektivnim oblicima turizma

Kao prijelazni metodološki korak između nalaza Analize područja, definiranih razvojnih tema i početka strateškog planiranja provedena su tri procesa: usklađivanje intervencijske logike pomoću matrice

intervencijske logike predloženih projekata i nalaza analize, razrada razvojnih scenarija te proces odabira planskih scenarija sa strateškim planiranjem.

Proces strateškog planiranja odabranog razvojnog scenarija IP-a slijedio je unaprijed zadalu metodologiju po kojoj su razvojni ciljevi način ostvarenja vizije razvoja te su postavljeni u odnosu na 3 stupa održivog razvoja (prostor, društvo i gospodarstvo), te mjerljivi. Ciljevi nisu 'skupovi prioriteta', već konkretnе mjere koje se namjeravaju postići u srednjoročnom razdoblju (5 do 10 godina), i ostvaruju se kroz sve razvojne prioritete (skupove projekata), iako će, naravno, neki specifičan prioritet doprinositi jednom određenom cilju više nego drugom. Dakle, ovakvim pristupom pokušalo se izbjegći 'umjetno' formuliranje ciljeva kao skupova prioriteta, jer u slučaju malih gradova, kao što je Benkovac, koji nemaju kritičnu masu za to nema logičkog opravdanja (vidljiviji su mrežni učinci, npr. utjecaj ekonomskih mjera na siromaštvo), a niti potrebe s aspekta upravljanja, jer se IP efektivno provodi putem projekata.

#### 0.2.4 Analiza intervencijske logike

Analiza intervencijske logike putem matrice intervencijske logike koristila se za usklađivanje dobivenih podataka iz Analize područja te predloženih projekata. Provjerom intervencijske logike, još jednom su se pripadajućim podacima pokušale ilustrirati sve izjave u SWOT analizi, u kojoj se kombinacijom jakih strana Grada Benkovca (gradske uprave, ali i vanjskih okolnosti koje idu u prilog razvojnim prvcima) planiraju koristiti prilike koje se otvaraju u definiranom području kako bi se umanjile detektirane prijetnje kroz predložene projekte. Analizom intervencijske logike utvrđeno je da za oko 30% izjava u SWOT analizi ne postoji utemeljenje u Analizi područja te je nužno da se prikupe dodatni podaci iako bez dodatnih izmjena samog dokumenta Analize područja. Utvrđeno je da se većina predloženih projektnih ideja u bazi projekata Grada Benkovca uklapa u SWOT. Za projekte za koje se utvrdilo da se ne uklapaju u SWOT dodatno je utvrđeno mogu li se uobičiti drugačije ili pripojiti nekoj grupi projekata.

Kako bi Intervencijski plan imao jasnu intervencijsku logiku, u ovoj fazi je bilo potrebno pronaći utemeljenje/argumente za one SWOT izjave u okviru kojih je predložen veliki broj razvojnih projekata.

Analizom intervencijske logike utvrđeno je da je za razvoj Grada Benkovca nužno ulagati u dodatne socijalne, sportske i rekreacijske sadržaje (društvenu infrastrukturu), ali i u unaprjeđenje konkurentnosti poljoprivrede. Utvrđeno je da postoji potreba za dodatnim sadržajima (materijalnim i nematerijalnim) za djecu, mlade, ranjive skupine.

Nadalje, utvrđeno je da je prilikom planiranja razvoja važno uzeti u obzir potrebe i potencijale poslovnog sektora (dodatni razvoj poslovnih zona i poticanje poduzetništva, osobito potpore inovacijama, novim/mladim poduzetnicima, potpore klasterima itd.) te potrebe i prilike u području razvoja turizma kao gospodarske grane te korištenje poljoprivrede kao poluge razvoja turizma.

Usporedno ovom procesu analize odvijala se kontinuirana kategorizacija projekata radi razdvajanja onih koji bitno utječu na revitalizaciju područja Grada Benkovca od onih koji mogu biti dio drugih projekata s većim opsegom djelovanja. Baza projekata je dopunjena novim projektnim prijedlozima, ali dijelom i pročišćena, te je kao takva bila smjernica za definiranje razvojnih scenarija.

## 0.2.5 Razvojni scenariji

Razvojni scenariji su planski modeli temeljeni na glavnim (flagship/ključnim) projektima koji, uzimajući u obzir postojeće resurse (materijalne, ljudske i prostorne), predviđaju utjecaj modela na konkurentnost grada/regije, demografski razvoj, na izgradnju prometne/energetske infrastrukture te utjecaj na očuvanje okoliša. Razrada razvojnih scenarija predstavljala je prvi korak u izradi IP-a. Tehnika scenarija koristila se prema unaprijed zadanoj/definiranoj metodologiji kako bi se postigla logička konzistentnost IP-a. Svaki model, u skladu s nalazima, opisan je i iz perspektive održivosti i rizika s kojima se nositelji mogu susresti u provedbi. Za Grad Benkovac definirana su 3 razvojna scenarija i svaki se temelji na nekoliko gore spomenutih razvojnih tema.

Kroz ovaj proces, primjenom ove metodologije **lokalno partnerstvo stvorilo je jasne i postojane poveznice između percipiranih problema i željenih (i/ili favoriziranih) intervencija u nesigurnom okruženju, odnosno, osiguralo konzistentnost planskog procesa i njegovih rezultata.**

Grad Benkovac razmotrio je svoje razvojne teme utvrđene kroz Analizu područja kao rješenja teritorijalnih problema te razradio teme u smislu definiranja **vizije, ciljeva i prioriteta intervencijskog plana**. Scenariji razvoja dali su **odgovore na pitanja „Koja je željena budućnost?“, „Koje su alternative na raspolaganju?“ i „Koje su njihove posljedice?“**.

Temeljem svega navedenog za Grad Benkovac razmatrala su se 3 moguća razvojna scenarija:

### **SCENARIJ 1.**

#### **Gospodarski razvoj s naglaskom na povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u sektoru poljoprivrede i korištenja prirodnih resursa Grada**

Ovaj scenarij obuhvatio je kombinaciju razvojnih tema: 2. Benkovac – centar razvoja poduzetništva Ravnih Kotara i Bukovice i 3. Valorizacija Benkovačkog sajma.

Doprinos razvojnoj viziji Grada kod ovog scenarija ogleda se u tome što bi se njime stvorili preduvjeti za razvoj malog i srednjeg poduzetništva te time doprinijelo i razvoju gospodarstva u cijelosti, što je jedna od glavnih premisa razvojne vizije Grada. Nadalje, osiguravanje poduzetničke infrastrukture u vidu uređenja poslovne zone rezultirat će novim ulaganjima i zapošljavanjem, dok će se kroz potporne institucije poduzetništву (inkubator i sl.) ciljano će potaknuti poduzetničke inicijative na području Grada.

Razvojem Benkovačkog sajma, razvojnoj viziji Grada Benkovca doprinosi se kroz tri elementa: (1) kroz doprinos razvoju gospodarstva, pri čemu će Benkovački sajam biti žarišna točka na kojoj će se susretati potražnja i ponuda za lokalnim proizvodima što će poslijedično doprinijeti stvaranju povišene razine prihoda lokalnog stanovništva, a samim time rezultirati i poboljšanjem kvalitete života; (2) kroz doprinos plasmanu lokalnih poljoprivrednih proizvoda zainteresiranim kupcima; (3) kroz razvoj jednoga od atraktivnih turističkih proizvoda koji će svojom stoljetnom tradicijom privlačiti posjetitelje u benkovačko područje.

Prilikom analize svakog predloženog scenarija jedan od osnovnih elemenata bilo je utvrđivanje opsega "nalaza" SWOT-a koje dotični scenarij obuhvaća. Ovim scenarijem odgovorit će se na sljedeće nalaze: nedovoljno poticajno okruženje za poduzetništvo, nedostatne kapacitete trenutne poduzetničke

infrastrukture, nedostatak inovacija u gospodarstvu, nedovoljnu podršku poduzetništvu i slično te neorganiziranost u fazi prodaje, u kojoj poljoprivredni proizvođači nisu organizirani u svrhu zajedničkog nastupa i promocije na tržištu.

Osnovni nedostatak scenarija 1 nakon detaljne analize svih aspekata identificiran je u tome što se fokusira na jedan razvojni cilj: razvoj gospodarstva, te se tek nekim indirektnim učincima dotiče ostalih relevantnih razvojnih ciljeva. Gospodarski razvoj je svakako neminovni pokretač cjelokupnog razvoja, ali nije dovoljan obzirom na potrebe i probleme Grada Benkovca prepoznate u analizi.

### **SCENARIJ 2.**

#### **Gospodarski razvoj tradicijske poljoprivrede i gospodarstva s naglaskom na korištenje turističkih potencijala za selektivne oblike turizma i baštinu**

Ovaj scenarij obuhvatio je kombinaciju razvojnih tema 3. (Valorizacija Benkovačkog sajma) i 4. (Razvoj turističke ponude temeljene na selektivnim oblicima turizma).

Doprinos razvojnoj viziji Grada ovog scenarija ogleda se u tome što bi se kroz ovakav scenarij, razvojem Benkovačkog sajma te širenjem turističke ponude kroz selektivne oblike turizma koji promoviraju kulturnu baštinu i tradicijsko naslijeđe, kombinirajući ih s prirodnim resursima i bogatstvom područja doprinijelo društvenom i gospodarskom razvoju. U ovom scenariju Benkovački sajam bi bio žarišna točka na kojoj će se susretati potražnja i ponuda za lokalnim proizvodima, što će dugoročno rezultirati stvaranjem povišene razine prihoda lokalnog stanovništva, a samim time i poboljšanjem kvalitete života. Nadalje, razvojem selektivnih oblika turizma u kombinaciji s valorizacijom sajma doprinijelo bi se boljem plasmanu lokalnih poljoprivrednih proizvoda zainteresiranim kupcima, a sam sajam, kao jedan od atraktivnih turističkih proizvoda, svojom stoljetnom tradicijom ima potencijal privlačiti posjetitelje u benkovačko područje.

Ovim scenarijem pokušalo bi se odgovoriti na sljedeće nalaze SWOT-a: problem neorganiziranosti poljoprivrednih proizvođača u fazi prodaje, ali i zajedničkog nastupa te promocije na tržištu, nedovoljna promocija benkovačke baštine u turističke svrhe, nedovoljan broj smještajnih kapaciteta, nedovoljna zaštićenosti i valoriziranost kulturne baštine i slično.

Nakon analize svih aspekata, došlo se do zaključka kako je osnovni nedostatak scenarija 2, slično kao i u scenariju 1, u tome što se usredotočuje na ograničenu kombinaciju dvaju razvojnih ciljeva (a to su razvoj gospodarstva i prostora) te se tek nekim indirektnim učincima dotiče ciljeva razvoja društvene infrastrukture i poboljšanja kvalitete života građana.

### **SCENARIJ 3.**

#### **Integrirani razvoj gospodarskog, turističkog i društvenog sektora Grada Benkovca kao glavni pokretač razvoja**

Ovaj scenarij obuhvatio je kombinaciju razvojnih tema: 1. Benkovac - centar društvenog života Ravnih Kotara, 2. Benkovac – centar razvoja poduzetništva Ravnih Kotara i Bukovice, 3. Valorizacija Benkovačkog sajma te 4. Razvoj turističke ponude temeljene na selektivnim oblicima turizma.

Scenarij 3 integrirani je pristup cjelokupnom razvoju Grada i kao takav predstavlja potencijalno najučinkovitiji scenarij razvoja. U okviru ovog scenarija unaprijedit će se vizura grada, poboljšati fizička infrastruktura kako bi stanovnici i posjetitelji mogli lakše i kvalitetnije provoditi vrijeme u Gradu Benkovcu

te će se kvalitetno unaprijediti usluge koje se za stanovništvo pružaju u samom Benkovcu. Nadalje, scenarij 3 obuhvaća projekte koji doprinose stvaranju preduvjeta za razvoj malog i srednjeg poduzetništva te radu na unaprjeđenju poslovne infrastrukture, čime se doprinosi razvoju gospodarstva u cijelosti, a to je jedna od glavnih premlisa razvojne vizije Grada. Nadalje, kroz ovakav scenarij, projektom razvoja Benkovačkog sajma u kombinaciji sa projektima kroz koje se proširuje turistička ponuda (promocija kulturne baštine i tradicijskog nasljeđa), kombinirajući vrijednosti područja postižu se ukupni efekti razvoja. U ovom scenariju Grad Benkovac sa svojom društvenom, gospodarskom, turističkom i ostalom infrastrukturom te projektima razvoja koji imaju dodanu vrijednost kao što je Benkovački sajam postaje žarišna točka razvoja Ravnih Kotara i Bukovice.

Kako je već navedeno u prethodna dva scenarija prilikom analize svakog predloženog scenarija jedan od osnovnih elemenata bio je da se utvrdi koje "nalaze" SWOT-a obuhvaća određeni scenarij. Projektima integriranim u ovaj scenarij radit će se na rekonstrukciji i stavljanju u funkciju ratom devastiranih objekata, popravit će se zapuštena infrastruktura u centru grada, poboljšati socijalne usluge u zajednici koje će biti relevantne za različite ranjive skupine te povećati aktivnosti civilnog društva. Nadalje ovim scenarijem će se potaknuti gospodarski razvoj, budući da će se predviđenim intervencijama osigurati poticajno okruženje za poduzetništvo, unaprijediti poduzetnička infrastruktura te potaknuti organiziranost poljoprivrednih proizvodača u svrhu zajedničkog nastupa i promocije na tržištu. Projektima u sektoru turizma iskoristiti će se bogato kulturno-povijesno nasljeđe, razviti dodatni sadržaji selektivnih oblika turizma, povećati turističke kapacitete (smještaj, prehrana, manifestacije i slično) te će se unaprijediti promocija benkovačke baštine u turističke svrhe.

Kako je već ranije opisano, priređeni scenariji analizirani su u odnosu na podatke iz Analize područja, SWOT te u odnosu na izvedivost predloženih projekata. JIP je u suradnji s timom tehničke pomoći pripremio razradu scenarija na način da ih jasno prezentira Partnerstvu, a odmah zatim sumira prednosti i nedostatke svakog scenarija. Na temelju rasprave članova Partnerstva i Jedinice za Intervencijski plan na zajedničkoj radionici, odabran je scenarij 3.

Kako je navedeno u njegovom opisu, scenarij 3 odražava integrativni razvoj područja i sinergiju koja proizlazi iz integriranog ulaganja u razvoj poduzetništva s naglaskom na poduzetništvo u poljoprivredi, društvenu infrastrukturu i sadržaje te turizam. Očekivanja od takvih ulaganja su da poboljšaju općenitu investicijsku klimu u Gradu, ali i kvalitetu i standard života građana, kao i da potaknu malo i srednje poduzetništvo te time povećaju broj radnih mesta.

Nakon što je odabran razvojni scenarij 3, uslijedilo je strateško planiranje koje je sam scenarij 3 razradilo u razvojnu strategiju Grada (poglavlje 4).

Prilikom strateškog planiranja u okviru definiranog scenarija 3 pazilo se na povezanost identificiranih razvojnih potreba (identificirane Analizom područja i izrađenim SWOT-om) sa definiranom vizijom i pratećim ciljevima te predloženim razvojnim prioritetima kako je prikazano u tablici niže u tekstu.

**Tablica: Povezanost identificiranih razvojnih potreba i predloženih rješenja**

Identificirane razvojne potrebe	Razvojni ciljevi	Razvojni prioriteti	Projekti
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nedostatak sadržaja za kvalitetniji društveni život;</li> <li>- Potreba za unaprjeđenjem pojedinih vrsta usluga;</li> <li>- Zapuštena infrastruktura u centru grada;</li> <li>- Neriješeni imovinsko-pravni odnosi;</li> <li>- Nedostatna atraktivnost grada za stanovnike i posjetitelje;</li> <li>- Nedovoljan broj stručno osposobljenih osoba za rad na specifičnom području djelovanja udruga;</li> </ul>	<p>RC1: Iskoristiti potencijal prostornog značaja Grada Benkovca kroz očuvanje i održivo korištenje prostornih resursa</p> <p>RC2: Ojačati ulogu Grada Benkovca kao središta društvenog života Ravnih Kotara i Bukovice te podići životni standard građana</p>	<p><b>1RP Os razvoja: Razvoj Benkovca kao centra društvenog života Ravnih Kotara i Bukovice</b></p> <p><b>4RP Os razvoja: Razvoj turističke ponude temeljene na selektivnim oblicima turizma</b></p>	<p>Glavni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekonstrukcija i uređenje gradske jezgre</li> <li>- Dom kulture Benkovac</li> <li>- Centar za podršku i dodatne usluge u zajednici</li> <li>- Revitalizacija i uređenje Zavičajnog muzeja Benkovac</li> <li>- Razvoj tematskih ruta</li> <li>- Uređenje karinske plaže i pripadajuće infrastrukture</li> <li>- Veteranski vojni turizam</li> </ul> <p>Komplementarni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vodovodne mreže u službi razvoja</li> <li>- Rekonstrukcija i sanacija nerazvrstanih cesta</li> <li>- Mreža domova</li> <li>- Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih dječjih igrališta</li> <li>- Završetak radova dječjeg vrtića u zgradi POS-a</li> <li>- Unapređenje sportske infrastrukture u Gradu Benkovcu</li> <li>- Posjetiteljski centar Bukovice</li> <li>- Srednja škola</li> <li>- Osnovna škola</li> <li>- <i>Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga neprofitnih organizacija</i></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Postojeći potencijal i tradicija u poduzetništvu i industriji ne koristi se u dovoljnoj mjeri</li> <li>- Nedovoljno poticajno okruženje za poduzetništvo</li> <li>- Nedostatni kapaciteti trenutne poduzetničke infrastrukture</li> <li>- Nedostatak specifičnih znanja za poduzetništvo i poljoprivredu;</li> <li>- Poljoprivredni proizvodi nisu prepoznati na tržištu</li> </ul>	<p>RC1: Iskoristiti potencijal prostornog značaja Grada Benkovca kroz očuvanje i održivo korištenje prostornih resursa</p> <p>RC3: Povećati kapacitete na području Grada Benkovca za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, s naglaskom na poljoprivrednu i ekološku proizvodnju, prerađivačke</p>	<p><b>2RP Os razvoja : Razvoj Benkovca kao centra poduzetništva Ravnih Kotara i Bukovice</b></p>	<p>Glavni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izgradnja komunalne infrastrukture Poslovne zone Benkovačko selo</li> <li>- Centar za razvoj poduzetništva i tehnologije - CRPT</li> </ul> <p>Komplementarni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga neprofitnih organizacija</i></li> <li>- <i>Projekt poticanja zapošljavanja (aktivne mjere)</i></li> </ul>

	djelatnosti, trgovinu i održivi turizam		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nedostatno razvijeno prostor i infrastruktura u kojoj se održava Benkovački sajam</li> <li>- Postojeći potencijal i tradicija u poduzetništvu i industriji ne koristi se u dovoljnoj mjeri</li> <li>- Poljoprivredni proizvodi nisu prepoznati na tržištu;</li> <li>- Benkovački sajam nije dovoljno prepozнат kao resurs za razvoj</li> </ul>	<p>RC1: Iskoristiti potencijal prostornog značaja Grada Benkovca kroz očuvanje i održivo korištenje prostornih resursa</p> <p>RC3: Povećati kapacitete na području Grada Benkovca za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, s naglaskom na poljoprivrednu i ekološku proizvodnju, prerađivačke djelatnosti, trgovinu i održivi turizam</p>	<p><b>2RP Os razvoja : Razvoj Benkovca kao centra poduzetništva Ravnih Kotara i Bukovice</b></p> <p><b>3RP Prioritetno područje intervencije: Valorizacija Benkovačkog sajma</b></p>	<p>Glavni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izgradnja komunalne infrastrukture Poslovne zone Benkovačko selo</li> <li>- Centar za razvoj poduzetništva i tehnologije - CRPT</li> <li>- Benkovački sajam – unapređenje infrastrukture i valorizacija</li> </ul> <p>Komplementarni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga neprofitnih organizacija</i></li> <li>- <i>Projekt poticanja zapošljavanja (aktivne mjere)</i></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nedostatna atraktivnost Grada za posjetioce i stanovnike</li> <li>- Nema dovoljno oblikovanih turističkih proizvoda</li> <li>- Prirodni i kulturni resursi ne koriste se za razvoj turizma</li> <li>- Ne iskorištava se velika potražnja za uslugama na obali</li> <li>- Nema dovoljno smještajnih kapaciteta</li> <li>- Nema promocije i marketinga turističke destinacije</li> </ul>	<p>RC1: Iskoristiti potencijal prostornog značaja Grada Benkovca kroz očuvanje i održivo korištenje prostornih resursa</p> <p>RC2: Ojačati ulogu Grada Benkovca kao središta društvenog života Ravnih Kotara i Bukovice te podići životni standard građana</p> <p>RC3: Povećati kapacitete na području Grada Benkovca za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, s naglaskom na poljoprivrednu i ekološku proizvodnju, prerađivačke djelatnosti, trgovinu i održivi turizam</p>	<p><b>2RP Os razvoja : Razvoj Benkovca kao centra poduzetništva Ravnih Kotara i Bukovice</b></p> <p><b>4RP Os razvoja: Razvoj turističke ponude temeljene na selektivnim oblicima turizma</b></p>	<p>Glavni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izgradnja komunalne infrastrukture Poslovne zone Benkovačko selo</li> <li>- Centar za razvoj poduzetništva i tehnologije - CRPT</li> <li>- Revitalizacija i uređenje Zavičajnog muzeja Benkovac</li> <li>- Razvoj tematskih ruta</li> <li>- Uređenje karinske plaže i pripadajuće infrastrukture</li> <li>- Veteranski vojni turizam</li> </ul> <p>Komplementarni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vodovodne mreže u službi razvoja</li> <li>- Rekonstrukcija i sanacija nerazvrstanih cesta</li> <li>- <i>Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga neprofitnih organizacija</i></li> <li>- <i>Projekt poticanja zapošljavanja (aktivne mjere)</i></li> </ul>

### 0.3 INFORMIRANJE I JAVNE KONZULTACIJE U PROCESU RAZVOJA IP-A

Ovaj IP izrađen je u participativnom procesu putem javnih konzultacija u kojemu je sudjelovanje javnosti osigurano uključivanjem Partnerstva za IP. Intervencijski plan nastao je zajedničkim radom Jedinice za IP, tima tehničke pomoći, Partnerstva za IP, MRRFEU i MRMS.

16. rujna 2016. u Benkovcu je održan **sastanak Jedinice za Intervencijski plan s predstavnicima tehničke pomoći MRRFEU** u pripremi Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima koja je pružala stručnu podršku Gradu Benkovcu u izradi Analize područja i odabiru planskih domena te *Tehničke pomoći za izradu intervencijskih planova gradovima Beli Manastir (uključujući općinu Darda), Benkovac, Petrinja i Vukovar* koja je pružala podršku Gradu na izradi Intervencijskoga plana. Sastanak je bio svojevrsna „primopredaja“ dužnosti i procesa izrade Intervencijskoga plana između dvaju timova tehničke pomoći. JIP-u su predstavljeni metodologija i hodogram za nastavak procesa planiranja i izradu intervencijskoga plana te su isplanirani daljnji koraci.

30. rujna 2016. godine održana je **prva radionica** s Jedinicom za Intervencijski plan na temu provjere intervencijske logike i osvrt na projektnu bazu. JIP-u su predstavljeni nalazi ex-ante evaluacije na ovu fazu planiranja, te nalazi provjere intervencijske logike. Na temelju predstavljanja prihvatljivih aktivnosti unutar IP-ova sukladno *Metodologiji izrade analize područja i intervencijskog plana*, napravljen je osvrt na projekte iz baze. Zaključeno je da je potrebno ponovno provjeriti sve projekte u bazi te vidjeti njihovu potencijalnu izvedivost u vremenskom okviru za IP, s resursima koji su na raspolaganju, i na taj način pročistiti samu bazu od projekata za koje se već u toj fazi može znati da su neizvedivi ili je njihova prihvatljivost po nekoj drugoj osnovi upitna.

19. listopada 2016. godine održana je **druga radionica** s Jedinicom za Intervencijski plan i Partnerstvom za Intervencijski plan na temu predstavljanja i odabira razvojnih scenarija te definiranja strateškog okvira Intervencijskoga plana. Sudionici radionice aktivno su sudjelovali u radu, te je odabran treći predloženi scenarij i razrađen strateški okvir (vizija, ciljevi, prioriteti,) koji su postali okosnica ovog Intervencijskoga plana.

30. studenog 2016. održana je **treća radionica** s Jedinicom za Intervencijski plan i Partnerstvom za Intervencijski plan. Na temelju ranije pripremljenih detaljnih projektnih obrazaca proveden je postupak bodovanja temeljem standardne liste kriterija (koje je lokalno Partnerstvo za IP zaprimilo zajedno s projektnim obrascima i pozivom na radionicu). Svi sudionici radionice podijeljeni su u 5 grupa. Svaka grupa radila je na srednjoj (zajedničkoj) ocjeni za svaki projekt. Nakon što je svaka grupa imala svoju bodovnu listu Partnerstvo za IP zajednički je donijelo finalni broj bodova temeljem izračuna aritmetičke sredine (zbroj bodova dijeljen sa 5) te se temeljem tog procesa definirala srednja ocjena projekata. Rezultati prioritizacije, kao i sam opis kriterija i procesa nalaze se u poglavljju III.

Metodologija izrade ovog dokumenta utemeljena je na dokumentu pripremljenom u MRRFEU, uz podršku projekta tehničke pomoći: „Metodologija izrade analize područja i intervencijskog plana“ (kolovoz, 2016.).

# I RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA

---

## I.1 RAZVOJNA VIZIJA GRADA

Vizija odražava nastojanje lokalne zajednice za sveobuhvatnom regeneracijom Grada Benkovca, a kako bi područje postalo ugodnijim za život i boravak uz kontinuiran i održiv rast gospodarske aktivnosti. Vizija Intervencijskog plana je sljedeća:

**Grad Benkovac ugodan je za življenje, poduzetnicima prilika za ulaganje, a turistima privlačan za posjećivanje.**

## I.2 RAZVOJNI CILJEVI

Kako bi radio prema postizanju definirane vizije Grad Benkovac radit će na ostvarenju 3 razvojna cilja koja predstavljaju 3 osnovna stupa održivog razvoja:

- Prostor


**RC1: Iskoristiti potencijal prostornog značaja Grada Benkovca kroz očuvanje i održivo korištenje prostornih resursa**

- Društvo

**RC2: Ojačati ulogu Grada Benkovca kao središta društvenog života Ravnih Kotara i Bukovice te podići životni standard građana**

- Gospodarstvo

**RC3: Povećati kapacitete na području Grada Benkovca za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, s naglaskom na poljoprivrednu i ekološku proizvodnju, prerađivačke djelatnosti, trgovinu i održivi turizam**



<b>Razvojni cilj 1: Iskoristiti potencijal prostornog značaja Grada Benkovca kroz očuvanje i održivo korištenje prostornih resursa</b>	
Relevantnost u odnosu na ključne probleme	<p>Grad Benkovac, slično kao i ostala 4 grada obuhvaćena ovim Programom, već godinama ima problem s devastiranom gradskom infrastrukturom, kako društvenom, tako i onom u službi gospodarstva. Problem ne predstavlja samo ratom uništena infrastruktura, nego i infrastruktura uništena uslijed propadanja zbog manjka razvojnih inicijativa i ulaganja te zbog slabog održavanja. Devastirani nisu samo javni prostori od opće i gospodarske namjene, nego i stambeni fond, kulturna baština i sl. Ovakva situacija naravno predstavlja jedan od ključnih problema društvenog i gospodarskog razvoja grada, ali i prepreku novom doseljavanju ili smanjenju depopulacije kroz povećanje atraktivnosti samog Grada za život.</p> <p>Prostorna regeneracija koja će biti popraćena gospodarskom i društvenom preduvjet je za daljnji razvoj i oporavak Grada Benkovca. Prostornu tj. urbanu regeneraciju Grad Benkovac postići će svojom afirmacijom u sjedište puteva društvenog života unutrašnjosti Dalmacije. Ovim ciljem potaknut će se revitalizacija gospodarskog i</p>

	društvenog razvoja Grada Benkovca koristeći povoljan geografski položaj, prirodne resurse i bogatu kulturnu baštinu.		
Način postizanja cilja	Ovaj cilj ostvarivat će se provedbom razvojnog prioriteta 1, tj. osi razvoja, pod nazivom „Razvoj Benkovca kao centra društvenog života Ravnih Kotara i Bukovice“. Taj razvojni prioritet obuhvaćat će intervencije u području izgradnje i unaprjeđenja komunalne i socijalne infrastrukture, unaprjeđenja društvenog života novim sadržajima te unaprjeđenja vizure grada i zaštite povijesne jezgre. Navedeni cilj postići će se i kroz provedbu razvojnog prioriteta 2, tj. osi razvoja pod nazivom „Razvoj Benkovca kao centra poduzetništva Ravnih Kotara i Bukovice“. Taj prioritet obuhvaća intervencije primarno usmjerene na razvoj poduzetničke infrastrukture.		
Strateška usklađenost	Razina	Strateški dokument	Ciljevi/mjere/prioriteti
	Lokalna	Strateški program ukupnog razvoja Grada Benkovca 2012.-2016.	Razvojni cilj 1 – uspješno gospodarstvo; Razvojni cilj 2 – očuvanje i održivo korištenje resursa; Razvojni cilj 3 – visoka kvaliteta usluga stanovništvu
	Regionalna	Županijska razvojna strategija Zadarske županije 2011.-2013.	Cilj 3 - prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine; Cilj 4 - unaprjeđenje zaštite okoliša i kvalitete života
	Nacionalna	Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH	Osiguravanje uvjeta za uspješnu borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te smanjenje nejednakosti u društvu; Osiguravanje uvjeta za sprječavanje nastanka novih kategorija siromašnih kao i

			smanjenja broja siromašnih i socijalno isključenih osoba
	OPKK 2014 – 2020	9b1 - Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva	
	OPULJP 2014 – 2020	Prioritetna os 2: Socijalno uključivanje 9.i.2 - Jačanje aktivnog uključivanja kroz implementaciju integriranih puteva prema regeneraciji 5 nerazvijenih pilot područja	

<b>Razvojni cilj 2: Ojačati ulogu Grada Benkovca kao središta društvenog života Ravnih Kotara i Bukovice te podići životni standard građana</b>	
Relevantnost u odnosu na ključne probleme	<p>Grad Benkovačko sjedište je puteva društvenog života unutrašnjosti Dalmacije i kroz ovaj IP želi se potaknuti revitalizaciju gospodarskog i društvenog razvoja Grada Benkovca koristeći povoljan geografski položaj, prirodne resurse i bogatu kulturnu baštinu.</p> <p>U gradu Benkovcu postoje razvijene osnovne temeljne usluge za građane uključujući postojanje obrazovnih institucija, organiziranu zdravstvenu skrb, sportske i kulturne sadržaje te aktivne organizacije civilnog društva koje svojim radom doprinose povećanju kvalitete života građana. No sve navedeno je i dalje nedovoljno za potrebe građana i zadovoljavajuću razinu kvalitete života.</p> <p>Analiza područja je pokazala ozbiljne nedostatke vezane uz tržište rada i mogućnosti zapošljavanja radno sposobnih stanovnika Benkovca (posebice mladih), nepostojanje kvalitetnih i dostahtnih programa cjeloživotnog učenja i novih kurikuluma, uključujući kompetencije za</p>

	poduzetništvo i samozapošljavanje. Uz to, značajan je nedostatak društvenih, obrazovnih i rekreativnih sadržaja za djecu, mlade, i ostale skupine građana kojima bi se uvođenjem novih sadržaja značajno podignula kvaliteta života.		
Način postizanja	<p>Navedeni cilj postići će se primarno kroz provedbu razvojnog prioriteta 1 koji predstavlja os razvoja pod nazivom <i>Razvoj Benkovca kao centra društvenog života Ravnih Kotara i Bukovice</i>. Ovaj razvojni prioritet obuhvaćat će u skladu s ovim ciljem intervencije u području izgradnje i unaprjeđenja komunalne i socijalne infrastrukture te unaprjeđenja društvenog života novim sadržajima.</p> <p>Također navedeni cilj postići će se kroz provedbu razvojnog prioriteta 2 koji također predstavlja os razvoja pod nazivom Razvoj Benkovca kao centra poduzetništva Ravnih Kotara i Bukovice.</p>		
Strateška usklađenost	Razina	Strateški dokument	Ciljevi/mjere/prioriteti
	Lokalna	Strateški program ukupnog razvoja Grada Benkovca 2012.-2016.	Razvojni cilj 1 – uspješno gospodarstvo; Razvojni cilj 2 – očuvanje i održivo korištenje resursa; Razvojni cilj 3 – visoka kvaliteta usluga stanovništvu;
	Regionalna	Županijska razvojna strategija Zadarske županije 2011.-2013.	Cilj 3 - prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine; Cilj 4 - unaprjeđenje zaštite okoliša i kvalitete života
	Nacionalna	Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH	Osiguravanje uvjeta za uspješnu borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te smanjenje nejednakosti u društvu;

			Osiguravanje uvjeta za sprječavanje nastanka novih kategorija siromašnih kao i smanjenja broja siromašnih i socijalno isključenih osoba
	OPKK 2014 – 2020	9b1 - Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva	
	OPULJP 2014 – 2020	Prioritetna os 2: Socijalno uključivanje 9.i.2 - Jačanje aktivnog uključivanja kroz implementaciju integriranih puteva prema regeneraciji 5 nerazvijenih pilot područja	

<b>Razvojni cilj 3: Povećati kapacitete na području Grada Benkovca za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, s naglaskom na poljoprivrednu i ekološku proizvodnju, prerađivačke djelatnosti, trgovinu i održivi turizam</b>	
Relevantnost u odnosu na ključne probleme	Izrazito raznolik stupanj demografskog i gospodarskog stupnja razvoja benkovačkog područja uvjetovan je razlikama u prirodnim i proizvodnim faktorima razvitka. Temeljne datosti ovog prostora su plodne poljoprivredne površine, nalazišta građevinskog kamena te vrlo povoljan geoprometni položaj. Takav geoprometni položaj, kao i položaj Grada Benkovca unutar Zadarske županije, utjecao je na odluku o lokaciji županijskog centra za gospodarenje otpadom u naselju Donje Biljane i time na područje Grada Benkovca smjestio infrastrukturnu investiciju od županijske važnosti.  Gospodarski razvoj Grada Benkovca baziran je prije svega na prerađivačkoj industriji i trgovini na veliko i malo, ali je uz to vrlo važan

	<p>faktor razvoja benkovačkog područja i tradicionalno rasprostranjena poljoprivredna djelatnost (ratarstvo i stočarstvo).</p> <p>Iako u Gradu Benkovcu postoje pozitivni pomaci kao što je porast broja poduzetnika i/ili zaposlenika u njihovim poduzećima, i dalje je prisutna činjenica da su pozitivni pomaci učinjeni ponajviše naporom samih poduzetnika te zahvaljujući pozitivnim trendovima na tržištu koji su se dogodili ulaskom Hrvatske u EU. U ovom trenutku na području Grada Benkovca ne postoje adekvatni uvjeti za razvoj poduzetništva – od opremljene infrastrukture poslovnih zona do kontinuirane savjetodavne i edukativne potpore postojećim i poduzetnicima početnicima. Ulaganjem napora kako bi se postojećim i potencijalnim poslovnim subjektima olakšalo daljnje poslovanje ili stvorili poticajni uvjeti za investicije zasigurno će se doprinijeti i produljenju pozitivnih kretanja, a samim time i cjelokupnom benkovačkom gospodarstvu.</p> <p>Benkovačko područje turistički je potencijalno vrlo značajno, obzirom da ima bogato kulturno-povijesno nasljeđe, koje datira još iz prapovijesnog razdoblja, antičkog razdoblja pa sve do za benkovačko područje najznačajnijeg srednjeg vijeka. Područje obiluje nalazištima iz raznih perioda, cijelinama graditeljskog nasleđa ruralnog obilježja, pojedinačnim objektima sakralnog i svjetovnog značenja te ostalim nepokretnim spomenicima kulturno-povijesne baštine koju je potrebno zaštititi adekvatnim mjerama. Kulturno-povijesni lokaliteti još uvijek nisu u dovoljnoj mjeri valorizirani kao resurs za razvoj turizma, iako postoje preduvjeti za tako nešto s obzirom na potražnju za turističkim uslugama na obali. Osim toga, nedostaje kvalitetan popratni sadržaj. Sufinanciranjem poduzetničkih projekata u turizmu, ojačat će se privatna inicijativa u obogaćivanju turističke ponude.</p> <p>Ovim ciljem kreirat će se nova radna mjesta kroz tradicionalne gospodarske djelatnosti i nove pristupe razvoju poduzetništva.</p>
Način postizanja	<p>Ovaj cilj ostvarivat će se provedbom razvojnog prioriteta 2, tj. osi razvoja, pod nazivom »Razvoj Benkovca kao centra poduzetništva Ravnih Kotara i Bukovice». Taj razvojni prioritet obuhvaćat će intervencije u području razvoja poduzetničke infrastrukture, poticanja osnivanja novih MSP i osnaživanja postojećih.</p> <p>Navedeni cilj postići će se i kroz provedbu razvojnog prioriteta 3 koji predstavlja područje intervencije «Valorizacija Benkovačkog sajma».</p> <p>Nadalje cilj će se postići i kroz provedbu razvojnog prioriteta 4 koji predstavlja os razvoja pod nazivom »Razvoj turističke ponude temeljene na selektivnim oblicima turizma». Taj razvojni prioritet obuhvaćat će intervencije u području unaprjeđenja i izgradnje</p>

	turističke infrastrukture, proširenja turističke ponude Benkovca te kroz poticanje novih inicijativa u turizmu.		
Strateška usklađenost	Razina	Strateški dokument	Ciljevi/mjere/prioriteti
	Lokalna	Strateški program ukupnog razvoja Grada Benkovca 2012.-2016.	Razvojni cilj 1 – uspješno gospodarstvo; Razvojni cilj 2 – očuvanje i održivo korištenje resursa; Razvojni cilj 3 – visoka kvaliteta usluga stanovništvu
	Plan razvoja turizma destinacije Benkovac		Cilj 1 - stvoriti organizacijske preduvjete za razvoj turizma;  Cilj 2 - formirati proizvode destinacije Benkovac;  Cilj 3 - uvesti destinaciju Benkovac na tržište;  Cilj 4 - sustavno razvijati komplementarne sadržaje/atracije poticanjem malog i srednjeg poduzetništva – biciklističke/pješačke staze, vinske ceste, boravak na seljačkom gospodarstvu, gastronomiju koji bi produljili boravak turista u ovom području te stimulirali ponovnu posjetu;  Cilj 5 - povezivati se u širi destinacijski

			sustav tematskim itinererom arheoloških nalazišta	
Regionalna	Županijska razvojna strategija Zadarske županije 2011.-2013.		Cilj 2 - razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva;  Cilj 3 - prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine;  Cilj 4 - unaprjeđenje zaštite okoliša i kvalitete života	
	Glavni plan razvoja turizma Zadarske županije 2013.-2023.		Cilj 1 - uspostava održivog učinkovitog sustava upravljanja resursima i potencijalima turizma;  Cilj 2 - smanjenje sezonalnosti kroz razvoj konkurentnog turističkog sektora;  Cilj 3 - unaprjeđenje turističke infrastrukture i usluga, te zaštita okoliša	
Nacionalna	Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH		Osiguravanje uvjeta za uspješnu borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te smanjenje nejednakosti u društvu;  Osiguravanje uvjeta za sprječavanje nastanka novih kategorija	

		siromašnih kao i smanjenja broja siromašnih i socijalno isključenih osoba	
	OPKK 2014 – 2020	Prioritetna os 3: Poslovna konkurentnost 9b1 - Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva	
	OPULJP 2014 – 2020	Prioritetna os 2: Socijalno uključivanje 9.i.2 - Jačanje aktivnog uključivanja kroz implementaciju integriranih puteva prema regeneraciji 5 nerazvijenih pilot područja	

## Pokazatelji

Grad Benkovac će putem Intervencijskog plana postići ciljeve gospodarske, socijalne i fizičke regeneracije. Dakle, ciljevi IP-a bit će mjerljivi a sam plan sadržava pokazatelje praćenja na nivou pojedinačnih projekata i IP-a u cjelini. Ovi pokazatelji moraju pokazati doprinos provedbi Programa u cjelini, uzimajući u obzir njegove očekivane rezultate i pokazatelje praćenja.

U tablici niže navedeni su svi ukupni pokazatelji IP-a dok se detalji o pojedinim pokazateljima po projektima mogu pronaći u Akcijskom planu, prilog 3 ovog dokumenta.

**Tablica: Pokazatelji IP-a**

Oznaka	Pokazatelji rezultata/učinka IP-a	Fond	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Početna godina	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2023.)
9b11 / SR202	Smanjenje gubitka stanovništva	EFRR i ESF	Vitalni indeks stanovništva	58	2016	61	65
CR04	Sudionici koji imaju posao, uključujući samozaposlene, po prestanku sudjelovanja	ESF	broj	0	2016	20	53
SR201	Broj nezaposlenih sudionika koji su završili program ospozobljavanja	ESF	broj	0	2016	15	32
	Ostali pokazatelji rezultata/učinka IP-a						
	Povećanje broja posjetitelja na području obuhvaćenom IP-om		broj	4683	2016	4800	5151
<hr/>							
Oznaka	Pokazatelji neposrednih rezultata/ostvarenja	Fond	Mjerna jedinica	muškarci	žene	Ciljana vrijednost ukupno	
CQ01	Proizvodno ulaganje: broj poduzeća koja primaju potporu	EFRR	Poduzeća	n/a	n/a	10	30
9b11	Broj pripremljenih i provedenih intervencijskih planova	EFRR	Broj	n/a	n/a	0	1
9b12	Obnovljene ili novosagrađene stambene jedinice	EFRR	m2 / broj jedinica	n/a	n/a	0	600/10
9b13	Izgrađena ili obnovljena infrastruktura	EFRR	Broj jedinica	n/a	n/a	4	42
C001	Nezaposleni, uključujući dugotrajno nezaposlene	ESF	Broj	20	20	20	40
C006	Mlađi od 25 godina	ESF	Broj	70	100	50	170
C007	Stariji od 54 godine	ESF	Broj	30	30	30	60
C016	Sudionici s invaliditetom	ESF	Broj	30	10	20	20
SO201	Broj aktivnosti podizanja svijesti/javne kampanje	ESF	Broj	n/a	n/a	2	2
SO202	Nezaposleni koji sudjeluju u programu ospozobljavanja	ESF	Broj	15	10	8	25
SO203	Stručnjaci koji sudjeluju u ospozobljavanju	ESF	Broj	15	10	10	25
SO207	Broj sudionika pripadnika romske i drugih nacionalnih manjina	ESF	Broj	7	3	2	10
	Ostali pokazatelji neposrednih rezultata/ostvarenja						

	Prikљučeni korisnici na vodoopskrbnu mrežu	Projektni pokazatelj	Broj	n/a	n/a	165	165
	Rekonstruirane postojeće ceste	Projektni pokazatelj	km	n/a	n/a	0	10
	Izgrađene nove ceste u Gradu Benkovcu	Projektni pokazatelj	km	n/a	n/a	0	9
	Broj novih kulturno – turističkih sadržaja	Projektni pokazatelj	broj	n/a	n/a	0	3
	Izrađeni programi obrazovanja	ESF	broj	n/a	n/a	5	10
	Polaznici obrazovnih programa	ESF	broj	20	30	20	50
	Novozaposlene osobe	ESF	broj	15	25	5	40
	Društveno korisne akcije	ESF	broj	n/a	n/a	10	25
	Osobe obuhvaćene mjerama socijalnog uključivanja	ESF	broj	10	15	10	25
	Broj izdanih potpora	ESF	broj	n/a	n/2	5	10
	Radnici koji su zadržali radno mjesto 12 mjeseci nakon završetka mjere	ESF	broj	6	4	5	10
	Poduzeća koje su poduzela mјere za unaprijeđenje poslovanja (Pokazatelj mjeri broj poduzeća koji je iskoristilo aktivne mјere zapošljavanja).	ESF	broj	n/a	n/a	10	20
	Radnici koji su stekli dodatno znanje i vještine (broj radnika koji je sudjelovao u programima ospozobljavanja )i usavršavanja te moguće prekvalifikacije	ESF	broj	20	10	20	30
	Stipendirani/subvencionirani učenici s deficitarnim zanimanjima (broj učenika koji su iskoristiti stipendije za deficitarna zanimanja na području Benkovca.)	ESF	broj	20	10	10	30

## **Horizontalne teme**

Cjelokupni dizajn i provedba IP-a vode računa o horizontalnim temama kao što su jednake mogućnosti, održivi razvoj i zaštita okoliša. Ove teme uključene su na svim razinama IP-a, od ciljeva do aktivnosti unutar projekata.

### **Jednake mogućnosti**

Ova tema odnosi se na omogućavanje jednakog pristupa svim vrijednostima, aktivnostima, rezultatima i pozitivnom utjecaju IP-a za sve društvene skupine, vodeći posebno računa o marginaliziranim skupinama te jednakim mogućnostima za žene i muškarce. Od nositelja IP-a i budućih korisnika bespovratnih sredstava očekuje se da dokažu kako njihov projekt promiče jednakе mogućnosti za marginalizirane skupine (npr. gdje god je to moguće ukloniti če se fizičke prepreke i prilagoditi prostor kako bi se osigurao nesmetan pristup osobama koje imaju ograničenu mobilnost) i/ili uzima u obzir rodno specifične potrebe (npr. kroz uključivanje rodnih informacija na lokalnom tržištu rada, kao i nastojanja projekta da se prevladaju prepreke jednakosti).

### **Održivi razvoj i zaštita okoliša**

Od nositelja IP-a i budućih korisnika bespovratnih sredstava očekuje se da dokažu kako njihov projekt i IP u cjelini neće imati nepovoljan utjecaj na okoliš, da potvrde da je neutralan u odnosu na okoliš i/ili da pokažu na koji će način projekt na pozitivan način doprinijeti održivom razvoju. Ti će se podaci uzeti u obzir u postupku ocjene projekta i kroz kriterije za odabir. Gdje je to potrebno, projekti moraju biti sukladni pravnoj stečevini EU o okolišu, što uključuje zakonsku regulativu i podzakonske akte o procjeni utjecaja na okoliš.

### **Načela dobrog upravljanja, uključujući i suradnju s civilnim društvom**

Od nositelja IP-a i budućih korisnika bespovratnih sredstava očekuje se da dokažu kako njihov projekt i IP u cjelini vodi računa o uključivanju svih dionika u proces razvoja i provedbe intervencija na temelju principa dobrog upravljanja. Cijela provedba IP-a počiva na participativnom pristupu rješavanja problema u lokalnoj zajednici. Potencijalni prijavitelji projekata bit će konzultirani tijekom pripreme natječajne dokumentacije kako bi se osigurala bolja prilagođenost lokalnim prilikama i kapacitetima dionika. Participativni pristup u provedbi IP-a podrazumijeva sudjelovanje dionika iz svih triju sektora u donošenju odluka i kontinuirano konzultiranje javnosti tijekom provedbe ključnih projekata, a kako bi se osigurala povratna informacija o stanju provedbe, potencijalnim rizicima i mogućim korektivnim akcijama za poboljšanje provedbe programa regeneracije.

## II RAZVOJNI PRIORITETI

Razvojni prioriteti opisuju metodu ostvarivanja razvojnih ciljeva intervencije. U metodološkim postavkama izrade intervencijskih planova razvrstani su na razvojne prioritete koji imaju uporište u prostornoj intervenciji ili oni koji predstavljaju primarno tematske intervencije, tako ih dijelimo na *područje intervencije* (prostorno definirano) ili *os razvoja* (tematski definirana). Razvojni prioriteti stoga posjeduju prostornu i/ili sektorsku dimenziju te obuhvaćaju skup konkretnih projekata koji vode prema ostvarenju ciljeva regeneracije. U kombinaciji, 4 razvojna prioriteta doprinose ostvarenju razvojnih ciljeva čijim se pak ostvarenjem dostiže vizija zadana ovim IPom.

**RC1: Iskoristiti potencijal prostornog značaja Grada Benkovca kroz očuvanje i održivo korištenje prostornih resursa**

**RC2: Ojačati ulogu Grada Benkovca kao središta društvenog života Ravnih Kotara i Bukovice te podići životni standard građana**

**RC3: Povećati kapacitete na području grada Benkovca za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, s naglaskom na poljoprivrednu i ekološku proizvodnju, prerađivačke djelatnosti, trgovinu i održivi turizam**

**1RP Os razvoja:** Razvoj Benkovca kao centra društvenog života Ravnih Kotara i Bukovice

**2RP Os razvoja :**  
Razvoj Benkovca kao centra poduzetništva  
Ravnih Kotara i  
Bukovice

**3RP Prioritetno područje intervencije:**  
Valorizacija Benkovačkog sajma

**4RP Os razvoja:**  
Razvoj turističke ponude temeljene na selektivnim oblicima turizma

**Logička podloga**

Os razvoja odnosi se na ulaganja u prostornu urbanu revitalizaciju u službi ostvarivanja svih triju ciljeva ovoga plana. Naglasak je kod ove osi ipak nešto snažnije stavljen na prostorni i društveni razvojni cilj, nego na onaj gospodarski. Uz revitalizaciju centra grada, kojom se rješavaju problemi prometa te unaprjeđuje vizualni identitet grada, dakle iskorištavaju se potencijali prostornog značaja, ovaj razvojni prioritet usmjeren je i na izgradnju i unapređenje komunalne i socijalne infrastrukture te unapređenjem sadržaja društvenog života u zajednici, kao i povećanje socijalnih usluga u zajednici.

Naselja Benkovac i Benkovačko selo čine urbano središte Grada s najvećom koncentracijom usluga i institucija za lokalno stanovništvo i posjetitelje. Iako je dostupnost različitih javnih usluga najveća i najraširenija upravo na ovom području Grada, ipak postoji značajni izazovi s kojima se potrebno suočiti kako bi se osigurali bolji uvjeti života za sve stanovnike. Prije svega, potrebno je uložiti sredstva u uređenje gospodarske i društvene infrastrukture u jezgri grada, odnosno pripremiti preduvjete za bolje funkcioniranje javnih usluga te veću protočnost i interakciju ljudi u dijelu Benkovca koji bi trebao predstavljati središte društvenog i gospodarskog života. Centar grada trenutno nije dovoljno prepoznat kao točka susreta i privlačenja stanovništva iz drugih, manjih razvojnih središta rasprostranjenih unutar vrlo široko postavljenih administrativnih granica Grada, a i potencijalni pozitivni efekti pojačanog priljeva ljudi tijekom Benkovačkog sajma minorni su ako se sagleda broj ljudi koji se zadržava u centru tijekom samog događanja. Nedostatak dnevнog protoka stanovnika i posjetitelja posljedica su loše prometne povezanosti, ali i nedovoljne ponude različitih usluga i sadržaja u gradskom središtu. Potražnja za socijalnim i obrazovnim uslugama kao i uslugama u zdravstvu je velika, ali je nedovoljno pokrivena ponudom kroz institucionalne, a naročito izvaninstitucionalne oblike podrške. Sadržaji za mlade i usluge u kulturi također nisu dovoljno razvijeni, ne provode se kontinuirano, te nemaju dovoljno veliku vidljivost na području Grada Benkovca i šire. Inicijative lokalne zajednice, iako postoje, još uvijek ne generiraju adekvatnu količinu sadržaja i usluga koji bi mogli privući stanovnike iz udaljenijih područja Grada i posjetitelje. Infrastruktura koja može doprinijeti pružanju kvalitetnijih društvenih usluga i obogaćivanju svakodnevnog života različitim sadržajima (kao npr. dnevni boravci za starije i osobe s invaliditetom, društveni domovi, domovi kulture itd.) gotovo u potpunosti nedostaje ili je neadekvatna.

	<p>Nedostatak usluga i infrastrukture za bolju kvalitetu života posebno pogađa središte grada zbog većeg broja stanovnika i veće frekvencije dolazaka iz drugih naselja te šireg područja županije, ali je problem izražen i u drugim mikro-središtima na širem području Grada kao što su Lisičić, Nadin, Pristeg, Smilčić i Vukšić.</p> <p>Urbana infrastruktura Grada u izrazito je lošem stanju uslijed ratnih razaranja te desetljeća deprivacije i zapuštenosti. Ovdje je primarno riječ o stambenim objektima u staroj jezgri grada koji su u privatnom vlasništvu, ali su zbog neriješenih vlasničkih odnosa ili iseljavanja vlasnika neiskorišteni ili nedostupni na tržištu nekretnina. Jedan dio javne infrastrukture u centru grada također nije dovoljno funkcionalan, a po svojoj namjeni bi trebao omogućiti bolju međusobnu interakciju stanovnika i posjetitelja kao što su trgovci, zelene površine i tržnica.</p> <p>Grad Benkovac se smatra urbanim središtem koji svojem lokalnom stanovništvu pruža cijeloviti sklop usluga te brine o infrastrukturi koja omogućava nesmetano odvijanje svakodnevnih aktivnosti. Analiziravši to područje, uviđaju se određeni problemi s kojima se susreću korisnici infrastrukture i usluga Grada Benkovca koji se unutar ove razvojne opcije moraju pokušati svesti na što nižu razinu kako bi se doprinijelo poboljšanju kvalitete života lokalnog stanovništva i posjetitelja.</p> <p>Kroz ovu os razvoja predviđene su intervencije koje se odnose na: Izgradnju i unapređenje komunalne i socijalne infrastrukture, unapređenje društvenog života novim sadržajima, unaprjeđenje vizure grada i zaštitu povijesne jezgre te osnaživanje neprofitnih organizacija za pružanje usluga u zajednici</p>
<i>Glavni projekti (flagship)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekonstrukcija i uređenje gradske jezgre</li> <li>• Dom kulture Benkovac</li> <li>• Centar za podršku i dodatne usluge u zajednici</li> </ul>
<i>Komplementarni projekti</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vodovodne mreže u službi razvoja</li> <li>• Rekonstrukcija i sanacija nerazvrstanih cesta</li> <li>• Mreža domova</li> <li>• Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih dječjih igrališta</li> <li>• Završetak radova dječjeg vrtića u zgradi POS-a</li> <li>• Unapređenje sportske infrastrukture u Gradu Benkovcu</li> <li>• Posjetiteljski centar Bukovice</li> <li>• Srednja škola</li> <li>• Osnovna škola</li> <li>• <i>Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga neprofitnih organizacija</i></li> </ul>
<i>Nositelj (flagship projekata)</i>	Grad Benkovac

### *Komplementarnost i sinergije*

RP 2: Razvoj Grada Benkovca kao centra društvenog života Ravnih Kotara i Bukovice direktno je povezan je i s razvojem Grada Benkovca kao centra poduzetništva jer će se kroz ostvarenje prvog prioriteta obnoviti zgrade u središtu grada koje će u budućnosti između ostalog biti namijenjene i gospodarstvu. Razvoj gospodarstva u centru grada, osobito turizma, nije moguć ako su zgrade zapuštene i u derutnom stanju. Lokalne ceste i vodovodna mreža koje će se izgraditi su preduvjeti razvoja gospodarstva – turizma i poljoprivrede. Dio sadržaja vezanih uz potrebe lokalnog stanovništva kao izgradnja sportske infrastrukture te izgradnja dječjih igrališta će se tijekom ljetnih mjeseci moći staviti u funkciju turizma te turistima osigurati dodatne sadržaje koji će biti preduvjet za dulji ostanak posjetitelja, a lokalnoj zajednici će donijeti dodatne prihode potrebne za održavanje novoizgrađene infrastrukture. Nadalje, u samom Domu kulture provoditi će se edukativni sadržaji u različitim sektorima uključujući teme iz potreba tržišta rada i kvalifikacija/vještina radne snage. Ovim edukacijama će se također utjecati na razvoj samog gospodarstva kroz osigurane programe obuke nezaposlenih ili onih u potrebi za prekvalifikacijom.

RP 3: Valorizacija Benkovačkog sajma povezana je s ovim razvojnim prioritetom kroz osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za njegovo ostvarenje. S obzirom da Benkovački sajam osim gospodarske komponente ima i turističke implikacije, razvojem društvene infrastrukture, osobito cesta i vodovodne mreže, osigurat će se posjetiteljima i gospodarstvenicima lakši prilaz samom sajmu te pratećim sadržajima i lokacijama.

RP 4: Razvoj turističke ponude temeljene na selektivnim oblicima turizma sinergijski se nadovezuje na ovaj prioritet jer će društvena infrastruktura olakšati razvoj turizma kroz kvalitetnije ceste koje osiguravaju siguran i udoban dolazak posjetitelja, kroz dobru opskrbljenošć vodom područja, i to dijela područja Grada. Sportska infrastruktura će se tijekom ljeta nuditi i turistima kao dio dodatne ponude, a time će se stvoriti preduvjeti za duži ostanak posjetitelja i turista, povećanje njihove potrošnje a time i dodatno zapošljavanje u turističkom sektoru.

### *Doprinos horizontalnim temama*

#### **Jednake mogućnosti**

- Podrškom djelovanju udruga, ustanova i ostalih neprofitnih organizacija ali i provedbom projekata pod vodstvom Grada Benkovca a u svrhu unapređenja društvene infrastrukture osigurat će se zastupljenost svih marginaliziranih skupina u aktivnostima provedbe svih projekata pod ovim prioritetom osobito kod projekata prijavljenih na otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga neprofitnih organizacija.

## Doprinos postizanju razvojnih ciljeva

- Pri zapošljavanjima koja će se odvijati unutar horizontalnog projekta „Jačanje ljudskih kapaciteta“ te pri stavljanju nove društvene infrastrukture u funkciju, natječaji će biti definirani u skladu s poštivanjem rodne ravnopravnosti. Za neka radna mjesa tražit će se prednost pri zapošljavanju posebno ranjivih skupinama društva (mladi, trajno nezaposleni, osobe s invaliditetom).

## Održiv razvoj i zaštita okoliša

- Proces identifikacije potreba društvenog sektora za definiranje okvira poziva na dostavu projektnih prijedloga za društveni sektor naznačio je i postojanje potencijalnih projekata na području zaštite prirode te održivog razvoja i zaštite okoliša kao takve osobito u području podizanja svijesti stanovništva o važnosti ovih pitanja. Stoga se očekivani doprinos ovoj horizontalnoj temi može identificirati kroz aktivnosti svih dionika (organizacija, institucija i udruga) u projektima koji će se provoditi kroz ovaj prioritet.
- Tijekom rekonstrukcije i obnove objekata ovog razvojnog prioriteta te izgradnje komunalne infrastrukture posebna pozornost će se pridati OIE i EE principima.

## Načela dobrog upravljanja, uključujući i suradnju s civilnim društvom

- Od nositelja projekata unutar ovog područja intervencije, tražit će se opis aktivnosti koji će ilustrirati na koji način projekti brinu o uključivanju svih dionika u proces razvoja i provedbe intervencija na temelju principa dobrog upravljanja

Projekti ovog razvojnog prioriteta direktno doprinose ostvarenju razvojnog cilja 1 (*Iskoristiti kapacitete prostornog značaja Grada Benkovca kroz očuvanje i održivo korištenje prostornih resursa provedbom razvojnih projekata*) i razvojnog cilja 2 (*Ojačati ulogu Grada Benkovca kao središta društvenog života Ravnih Kotara i Bukovice izgradnjom i povećanjem dostupnosti društvene infrastrukture kako bi se poboljšao život i standard građana*) Intervencijskog plana i to izgradnjom komunalne i društvene infrastrukture te očuvanjem i zaštitom okoliša i jezgre grada.

## Os razvoja : Razvoj Benkovca kao centra poduzetništva Ravnih Kotara i Bukovice

### **Logička podloga**

Iako se u poduzetništvu benkovačkog kraja mogu uvidjeti određeni pozitivni pomaci, kao što je povećanje broja poduzetnika, pozitivni poslovni rezultati ili povećanje broja radnih mesta, čime se utječe na smanjenje nezaposlenosti u benkovačkom kraju, još uvijek postoji prostor u kojem se planskim ulaganjem u razvoj poduzetničke infrastrukture mogu stvoriti preduvjeti za stvaranje novih radnih mesta i otvaranje poslovnih subjekata koji će generirati više razine prihoda i time pridonositi cjelovitom razvoju benkovačkog kraja.

Razvoj poduzetničkog okruženja, ali i malog i srednjeg poduzetništva provodit će kroz ovu os razvoja. Stavljanjem u funkciju poslovne zone očekuje se pozitivan utjecaj na rast MSP-a koji će biti u poslovnoj zoni, također pozitivan utjecaj na broj zaposlenih s područja Grada Benkovca. Osnivanjem Centra za razvoj poduzetništva i tehnologije očekuje se porast inovacija i jačanje iskustva poduzetnika radi podizanja konkurentnosti u poslovanju i proizvodu. Komplementarni projekti kroz programe edukacije i uključivanja marginaliziranih društvenih skupina, primarno nezaposlenih, pridonijet će drugačijem poimanju poduzetništva i društvene odgovornosti.

Kako je i naglašeno u Analizi područja, razvoj malog i srednjeg poduzetništva smatra se temeljem ekonomskog prosperiteta Grada Benkovca. Razvojem preduvjeta za promicanje poduzetništva i konkurenčnosti, i to ponajviše u industrijama koje su karakteristične za benkovački kraj – kamenarstvu i poljoprivredi – doprinijet će se generiranju novih radnih mesta i prihoda za lokalno stanovništvo i javni sektor. Grad Benkovac ima bogatu industrijsku i poljoprivrednu tradiciju kojoj se ne posvećuje dovoljna pažnja kroz sveobuhvatne programe poticanja poduzetništva i kontinuiranu podršku poduzetnicima početnicima. Nekada snažne gospodarske grane danas jesu značajne, ali u usporedbi s nekadašnjim kapacitetima i potencijalom koji imaju, nisu u dovoljnoj mjeri promovirane kao pokretač gospodarskog razvoja. Poseban potencijal predstavlja poljoprivredna proizvodnja. Rad na dalnjem poboljšanju proizvodnih procesa, razvoju novih proizvoda veće dodane vrijednosti i efikasnoj promociji nužan je sljedeći korak u povećanju konkurenčnosti poljoprivredne proizvodnje i lokalnih OPG-ova.

	<p>Kako bi se postiglo gore navedeno, unutar ove razvojne osi stvorit će se preduvjeti za pokretanje novih poslovnih subjekata te jačanje kapaciteta i konkurentnosti postojećih poslovnih subjekata.</p> <p>Kroz ovu os razvoja predviđene su intervencije koje se odnose na razvoj poduzetničke infrastrukture i poticanje osnivanja novih MSP-a te osnaživanje postojećih.</p>
<i>Glavni projekti (flagship)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izgradnja komunalne infrastrukture Poslovne zone Benkovačko selo</li> <li>• Centar za razvoj poduzetništva i tehnologije - CRPT</li> </ul>
<i>Komplementarni projekti</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga MSP-a</i></li> <li>• <i>Projekt poticanja zapošljavanja (aktivne mjere)</i></li> </ul>
<i>Nositelj (glavnih projekata)</i>	Grad Benkovac
<i>Komplementarnost i sinergije</i>	<p>Daljnjim ulaganjem i razvojem Poslovne zone Benkovačko Selo stvorit će se ključne pretpostavke za nova ulaganja i otvaranje novih poslovnih subjekata ili jačanje postojećih, a samim time će se potaknuti i otvaranje novih radnih mjeseta. Kroz navedena dva projekta, a u sinergiji s otvorenim pozivom za MSP te Projektom poticaja za zapošljavanje obuhvatit će se i ciljana podrška malom i srednjem poduzetništvu, kojima će se raznim edukacijama i ostalim savjetodavnim uslugama pokušati pomoći u razvoju njihovih poslovnih ideja ili ulaganja kako bi se na taj način stvorili sinergijski efekti i dodane vrijednosti koje bi pak izravno doprinisile razvoju gospodarstva u cjelini.</p> <p>RP 1: Razvoj Benkovca kao centra društvenog života Ravnih Kotara i Bukovice povezan je s ovom razvojnom osi kroz razvoj uvjeta za poslovanje poduzeća (društvene i poduzetničke infrastrukture) što će osigurati nova radna mjesta i privući stanovništvo da ostane u Gradu Benkovcu i koristi društvenu infrastrukturu, a poduzetnicima će se osigurati kvalificirana lokalna radna snaga kroz modernizaciju škola i uvjeta rada u njima.</p> <p>RP 3: Valorizacija Benkovačkog sajma je u direktnoj sinergiji s ovim prioritetom jer je sajam dio gospodarske aktivnosti u Benkovcu. Uvjeti za razvoj gospodarstva kroz izgradnju poslovne zone te poticaje za zapošljavanje će osigurati još veći broj poduzetnika koji će sudjelovati na Benkovačkom sajmu te tamo prezentirati i plasirati svoje proizvode.</p> <p>RP 4: Razvoj turističke ponude temeljene na selektivnim oblicima turizma povezana je s razvojem poduzetničke infrastrukture koja će osigurati razvoj svih grana gospodarstva koje su vezane uz turizam, a prvenstveno poljoprivrede i kamenarstva.</p>

*Doprinos horizontalnim temama*

**Jednake mogućnosti**

- U okviru ovog prioriteta treba uzeti u obzir i otvaranje novih poduzetničkih prilika tijekom provedbe projekata pod prioritetom RP2 - takvih koje će biti lakše ostvarive i dostupne ranjivim skupinama (žene, mlađi, dugotrajno nezaposleni) koristeći potpore i podršku
- Pri zapošljavanjima koja će se odvijati unutar horizontalnog projekta Jačanje ljudskih kapaciteta te pri stavljanju nove infrastrukture Centra i Poslovne zone u funkciju, natječaji će biti definirani u skladu s poštivanjem načela rodne ravnopravnosti. Za neka radna mjesta tražit će se prednost pri zapošljavanju posebno ranjivih skupina društva (mladi, trajno nezaposleni, osobe s invaliditetom).
- Horizontalni projekt Poticanja zapošljavanja (aktivne mjere) također će davati prednost ranjivim skupinama društva ukoliko zadovolje kriterije vezane uz kvalitetu poduzetničkih ideja kod samozapošljavanja ili imaju sve kvalifikacije za zapošljavanje.

**Održivi razvoj i zaštita okoliša**

- Tijekom rekonstrukcija i gradnje svih planiranih objekata posebna pozornost će se pridati OIE i EE principima gradnje.

**Načela dobrog upravljanja, uključujući i suradnju s civilnim društvom**

- Od nositelja projekata unutar ovog područja intervencije, tražit će se opis aktivnosti koji će ilustrirati na koji način projekti brinu o uključivanju svih dionika u proces razvoja i provedbe intervencija na temelju principa dobrog upravljanja

*Doprinos postizanju razvojnih ciljeva*

Projekti koji se nalaze unutar ovog razvojnog prioriteta direktno doprinose ostvarenju razvojnog cilja 3 (*Povećati kapacitete na području Grada Benkovca za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, s naglaskom na poljoprivrednu i ekološku proizvodnju, prerađivačke djelatnosti, trgovinu i održivi turizam*). Realizacijom ovih dvaju projekata stvorit će se preduvjeti za razvoj malog i srednjeg lokalnog poduzetništva na širem području Grada Benkovca, što će rezultirati otvaranjem novih radnih mesta te obnovljenom i novoizgrađenom infrastrukturom.

## Prioritetno područje intervencije: Valorizacija Benkovačkog sajma

### **Logička podloga**

Treći razvojni prioritet predstavlja prostorno definirano prioritetno područje intervencije i usmjeren je prema socio-ekonomskoj valorizaciji i povećanju konkurentnosti Benkovačkog sajma.

Benkovački sajam jedan je od elemenata koji se na benkovačkom području smatra istovremeno su-kreatorom gospodarskih aktivnosti i prepoznatljivim turističkim proizvodom. Povijest ovog sajma seže veoma daleko te se on danas ubraja u najveće sajmove tog tipa u Republici Hrvatskoj. Stoga je i logično da zbog svojeg velikog značaja Sajam bude jedan od budućih nositelja gospodarstva na kojem će se susretati potražnja i ponuda lokalnih proizvoda.

Kako je navedeno u analizi područja, s Benkovačkim sajmom se povezuje problem nedovoljno razvijene infrastrukture prostora na kojem se sajam održava, zbog čega je nemoguće povećati broj izlagača. Samim time ograničena je i mogućnost za povećanje prihoda, kako subjekata koji prodaju svoje proizvode na Sajmu, tako i komunalnog poduzeća Benković d.o.o. u vlasništvu Grada Benkovca kao organizatora Benkovačkog sajma. Benkovački sajam se, međutim, često ne prepoznaće kao jedan od potencijalnih nositelja gospodarstva benkovačkog kraja pa je potrebno djelovati i na području njegove vidljivosti.

Kako bi se riješili navedeni problemi vezani uz Benkovački sajam, potrebna su ulaganja u infrastrukturu izlagačkih prostora i gradnju popratnih sadržaja. Također je potrebno provesti određene marketinške aktivnosti kako bi se podigla svijest o važnosti Benkovačkog sajma kao jednog od nositelja gospodarskog razvoja Grada Benkovca te kao jednog od atraktivnih turističkih proizvoda koji će privlačiti dodatne posjetitelje u benkovački kraj. Ova rješenja bit će objedinjena u Strategiju razvoja Sajma kao gospodarske i turističke atrakcije.

### **Glavni projekti (flagship)**

- **Benkovački sajam – unapređenje infrastrukture i valorizacija**

### **Komplementarni projekti**

Iako spadaju primarno u RP 1 i RP 2, navedeni projekti također su komplementarni RP 3 odnosno glavnom projektu Benkovački sajam – unapređenje infrastrukture i valorizacija obzirom da će svojom provedbom doprinijeti ciljevima glavnog projekta ovog prioriteta:

- *Otvoren poziv na dostavu projektnih prijedloga MSP-a*

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga neprofitnih organizacija</li> <li>• Projekt poticanja zapošljavanja (aktivne mjere)</li> <li>• Vodovodne mreže u službi razvoja</li> <li>• Rekonstrukcija i sanacija nerazvrstanih cesta</li> </ul>
<i>Nositelj (glavnih projekata)</i>	Grad Benkovac
<i>Komplementarnost i sinergije</i>	<p>RP 1: Razvoj Benkovca kao centra društvenog života Ravnih Kotara i Bukovice vezan je i uz valorizaciju Benkovačkog sajma. Razvojem gospodarskog i turističkog aspekta sajma osigurati će se lokalnom stanovništvu kvalitetna društvena infrastruktura koja će se koristiti i tijekom cijele godine za potrebe stanovništva dok će se s druge strane izgrađene ceste i vodovodna mreža koristiti u funkciji Sajma i olakšati dolazak gospodarstvenika i posjetitelja.</p> <p>RP 2: Razvoj Benkovca kao centra poduzetništva Ravnih Kotara i Bukovice osigurava preduvjete za razvoj gospodarskih subjekata svih gospodarskih grana, a osobito poljoprivrede i kamenarstva, kojima će Sajam biti ključno mjesto za prezentaciju i prodaju proizvoda što će osigurati rast gospodarskih subjekata i njihovu bolju povezanost s drugim komplementarnim gospodarstvenicima koje će upoznati tijekom Sajma.</p> <p>RP 4: Razvoj turističke ponude temeljene na selektivnim oblicima turizma vezan je uz Benkovački sajam na način da će gospodarski subjekti koji se bave turizmom na sajmu moći steći nove poslovne kontakte i dobavljače te će na taj način unaprijediti svoju ponudu i poslovanje. S druge strane, Sajam privlači veliki broj izlagača i posjetitelja koji će konzumirati turističku ponudu Grada Benkovca te će se pojedini turisti duže zadržati zbog posjeta sajmu.</p>
<i>Doprinos horizontalnim temama</i>	<p><b>Jednake mogućnosti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Benkovački sajam tradicionalna je i popularna manifestacija a posjetitelji sajma su svi zainteresirani. Tijekom uređenja infrastrukture benkovačkog sajma te osobito prateće pješačke infrastrukture, ali i pri uređenju svih objekata i prateće signalizacije posebno će se обратити pažnja na što jednostavnije i pristupačnije korištenje istih u slučaju građana smanjenje pokretljivosti ili osoba s invaliditetom koje su značajno zastupljene u strukturi stanovništva Benkovca, ali i Zadarske županije u cijelini.</li> <li>➤ Pri zapošljavanju koje će se odvijati unutar horizontalnog projekta „Jačanje ljudskih kapaciteta“ te pri stavljanju novih društvenih infrastruktura u funkciju, natječaji će biti definirani poštujući rodnu ravnopravnost. Za neka radna mjesta tražit će</li> </ul>

se prednost pri zapošljavanju posebno ranjivih skupinama društva (mladi, trajno nezaposleni, osobe s invaliditetom).

#### Održivi razvoj i zaštita okoliša

- Razvojni prioritet usmjeren je među ostalim i na postizanje optimalnih uvjeta za razvoj sektora poljoprivrede (kroz ostvarivanje uvjeta za bolji plasman proizvoda) koji se temelje na održivom razvoju. Nastavno na razvoj poljoprivrede i pratećih usluga i ponude očekuje se i daljnji razvoj turizma. Kroz projekt, osobito kroz aktivnosti sufinancirane putem nematerijalnih aktivnosti kroz Europski socijalni fond (edukacije, informiranje, ospozobljavanje i sl.) poticat će se promocija organske i eko poljoprivrede. Nadalje turizam, kroz RP4 razvijati će se temeljem razvoja selektivnih oblika turizma poput eno-gastro turizma, turizma temeljenog na kulturnoj i prirodnoj baštini, cikloturizma i kraćih posjeta prirodnim ljepotama kraja što osobito naglašava doprinos održivom razvoju i zaštiti prirode.
- Izgradnja prateće infrastrukture osnovnim objektima sajma kao što su parking, javna rasvjeta i sl. temeljit će se na principima energetske učinkovitosti te će se pridonijeti smanjenju emisije CO<sub>2</sub> kao i uštedi energije.
- Projekt Benkovačkog sajma posebnu pažnju obratit će na sustav odvajanja otpada na samom sajmu za sve izlagače i posjetitelje gdje će se kroz navedenu investiciju sufinancirati i sam *zeleni otok* kao siguran i jasno određen prostor za odvajanje otpada.
- Tijekom rekonstrukcija navedenih objekata posebna pozornost će se pridati OIE i EE principima.

#### Načela dobrog upravljanja, uključujući i suradnju s civilnim društvom

- Od nositelja projekata unutar ovog područja intervencije, tražit će se opis aktivnosti koji će ilustrirati na koji način projekt vodi računa o uključivanju svih dionika u proces razvoja i provedbe intervencija na temelju principa dobrog upravljanja.

Doprinos postizanju  
razvojnih ciljeva

Realizacijom projekta Benkovačkog sajma unutar ovog razvojnog prioriteta se direktno doprinosi ostvarenju svih razvojnih ciljeva. Benkovački sajam povezuje poduzetništvo i trgovinu s društvenom infrastrukturom, što direktno doprinosi poticanju gospodarske aktivnosti te povećanju turističke ponude grada.

## Os razvoja: Razvoj turističke ponude temeljene na selektivnim oblicima turizma

### **Logička podloga**

Trendovi na turističkom tržištu ukazuju na rast turističke potražnje, ali i promjene u kvalitativnom smislu, odnosno zahtjevnije suvremene turističke potrošače. Takvi trendovi uvjetovani su različitim društvenim kretanjima koji utječu na promjene u sustavima vrijednosti, sve izraženiju potrebu za učenjem i upoznavanjem lokalnih i autohtonih vrijednosti, kao i na sve izraženiju ekološku svijest. Stoga raste potražnja za posjetom manje poznatim destinacijama i boravkom u ruralnim prostorima. Benkovačko područje raspolaže s brojnim kulturno-povijesnim resursima i atrakcijama te se nalazi u blizini mnogobrojnih prirodnih lokaliteta koji mogu odgovoriti na zahtjeve suvremenog turističkog tržišta. S jedne strane to su selektivni oblici turizma koji promoviraju aktivni odmor, a s druge strane bogata povijest Benkovca koja pruža mogućnosti za upoznavanje tradicije i povijesti određenih turističkih destinacija svim zainteresiranim.

Unatoč bogatoj resursnoj osnovi, turizam na području Grada Benkovca je u početnim fazama razvoja te su potrebna znatna ulaganja kako bi se potaknuto njegov daljnji razvoj. Kada bi se postojeći nedovoljno iskorišteni resursi stavili u funkciju, riješio bi se problem održivog korištenja i očuvanja prirodne i kulturne baštine te bi se ujedno generirala i nova radna mjesta, a samim time bi se doprinisalo poboljšanju kvalitete života na tom području. Posljednje tri godine na benkovačkom području nema znatnijeg povećanja ili smanjenja broja noćenja pa bi se ulaganjima trebalo potaknuti stvaranje novih smještajnih kapaciteta, ali i stvaranje turističkih proizvoda koji će uspješno privlačiti potencijalne turiste u benkovačko područje.

### **Glavni projekti (flagship)**

- Revitalizacija i uređenje Zavičajnog muzeja Benkovac
- Razvoj tematskih ruta
- Uređenje karinske plaže i pripadajuće infrastrukture
- Veteranski vojni turizam

### **Komplementarni projekti**

Iako spadaju primarno u RP 1 i RP 2, navedeni projekti također se smatraju komplementarnima RP 4 odnosno glavnim projektima u okviru ovog razvojnog prioriteta jer će svojom provedbom doprinijeti ostvarenju ciljeva glavnih projekata unutar ovog prioriteta:

- *Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga neprofitnih organizacija*
- *Projekt poticanja zapošljavanja (aktivne mjere)*

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vodovodne mreže u službi razvoja</li> <li>• Uređenje lokalnih cesta</li> </ul>
<i>Nositelj (flagship projekata)</i>	Zavičajni muzej Benkovac, Grad Benkovac
<i>Komplementarnost i synergije</i>	<p>RP 1: Razvoj Benkovca kao centra društvenog života Ravnih Kotara i Bukovice kroz razvoj infrastrukture koju će koristiti i stanovnici, ali i posjetitelji međusobno utjecat će na razvoj turizma u Benkovcu kroz osiguravanje boljih infrastrukturnih uvjeta za bavljenje turizmom. Razvijena vodovodna mreža osigurat će preduvjete za bavljenje turizmom. Sadržaje koji će se razviti za turiste poput muzeja i tematskih ruta koristit će i lokalno stanovništvo za rekreaciju i vanškolsku edukaciju.</p> <p>RP 2: Razvoj Benkovca kao centra poduzetništva osigurati će kvalitetne poduzetnike koji će sudjelovati u izgradnji turističke infrastrukture te će turistički sektor opskrbljivati svojim proizvodima.</p> <p>RP 3: Valorizacija Benkovačkog sajma usko je povezana s razvojem selektivnih oblika turizma jer je i sam Sajam osim gospodarskog i turistički proizvod te će privući određeni broj posjetitelja koji će konzumirati i drugu turističku infrastrukturu i time doprinijeti gospodarskom razvoju Benkovca.</p>
<i>Doprinos horizontalnim temama</i>	<p><b>Jednake mogućnosti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ U okviru ovog prioriteta treba uzeti u obzir i otvaranje novih poduzetničkih prilika tijekom provedbe projekata pod prioritetom RP4 - takvih koje će biti lakše ostvarive i dostupne ranjivim skupinama (žene, mladi, dugotrajno nezaposleni) koristeći potpore i podršku</li> <li>➤ Pri zapošljavanjima koja će se odvijati unutar horizontalnog projekta Jačanje ljudskih kapaciteta te pri stavljanju nove infrastrukture Centra i Poduzetničke zone u funkciju, natječaji će biti definirani u skladu s poštivanjem načela rodne ravnopravnosti. Za neka radna mjesta tražit će se prednost pri zapošljavanju posebno ranjivim skupinama društva (mladi, trajno nezaposleni, osobe s invaliditetom).</li> <li>➤ Horizontalni projekt Poticanja zapošljavanja (aktivne mjere) također će davati prednost ranjivim skupinama društva ukoliko zadovolje kriterije vezane uz kvalitetu poduzetničkih ideja kod samozapošljavanja ili imaju sve kvalifikacije za zapošljavanje.</li> </ul> <p><b>Održivi razvoj i zaštita okoliša</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Razvojni prioritet usmjeren je među ostalim i na postizanje optimalnih uvjeta za razvoj selektivnih oblika turizma. Kroz projekt, osobito kroz aktivnosti sufinancirane putem nematerijalnih aktivnosti kroz Europski socijalni fond</li> </ul>

### *Doprinos postizanju razvojnih ciljeva*

(edukacije, informiranje, ospozobljavanje i sl.) poticati će se promocija i koncepti održivog turizma. Održivi turizam vodi brigu o optimalnom broju posjetitelja u usporedbi s prirodnim ali i kulturnim kapacitetima pojedinog područja odnosno turističke atrakcije. Nadalje turizam, kroz RP4, razvijati će se temeljem razvoja selektivnih oblika turizma poput eno-gastro turizma, turizma temeljenog na kulturnoj i prirodnoj baštini, cikloturizma i kraćih posjeta prirodnim ljepotama kraja što osobito naglašava doprinos održivom razvoju i zaštiti prirode.

- Izgradnja prateće infrastrukture osnovnim objektima u okviru definiranih projekata u RP4, kao što su parking, javna rasvjeta i sl temeljiti će se na principima energetske učinkovitosti te će se pridonijeti smanjenju emisije CO<sub>2</sub> kao i uštedi energije.
- Projekti sufinancirani u okviru ovog prioriteta, a osobito projekt Razvoja tematskih ruta posebnu pažnju obratiti će na sustav odvajanja otpada na svim lokacijama zadržavanja posjetitelja gdje će biti jasno određen prostor za odvajanje otpada.
- Tijekom rekonstrukcija objekata u okviru pripadajućih projekata posebna pozornost će se pridati OIE i EE principima.

### **Načela dobrog upravljanja, uključujući i suradnju s civilnim društвом**

- Od nositelja projekata unutar ovog područja intervencije, tražiti će se opis aktivnosti koji će ilustrirati na koji način projekt vodi računa o uključivanju svih dionika u proces razvoja i provedbe intervencija na temelju principa dobrog upravljanja

Razvojni prioriteti unutar ove osi razvoja primarno doprinose ostvarenju razvojnog cilja 3 (*Povećati kapacitete na području Grada Benkovca za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, s naglaskom na poljoprivrednu i ekološku proizvodnju, prerađivačke djelatnosti, trgovinu i održivi turizam*). Projekti koji će biti realizirani će doprinijeti razvoju turističke infrastrukture i ponude te će direktno rezultirati otvaranjem novih radnih mesta te poboljšanjem uvjeta života lokalnog stanovništva.

Nastavno na navedeno, projekti će doprinijeti i ostvarenju razvojnog cilja 1 (Iskoristiti potencijale prostornog značaja Grada Benkovca kroz očuvanje i održivo korištenje prostornih resursa) obzirom da će se projekti unutar ovog prioriteta uvelike baviti prostornom dimenzijom područja te stavljanjem prirodnih resursa u gospodarsku ali i društvenu funkciju.

## III PLAN PROVEDBE

---

### III.1 PRIORITIZACIJA PROJEKATA

#### III.1.1 Kriterij i metodologija

Kako je vidljivo već iz Analize područja, projekti IP-a za Grad Benkovac različiti su u opsegu i intenzitetu utjecaja. Razvojni prioriteti su međusektorski, jer se od početka analize područja radi na tematskoj, vremenskoj i prostornoj integraciji projekata. Jedan prioritet ima više planskih domena i koncentriran je na područje ili os intervencije (npr. regeneracija povijesne jezgre grada; os transformacije industrijske zone i sl.).

Portfolio projekata IP-a za Grad Benkovac počeo se razvijati još u vrijeme izrade Analize područja te se tijekom mjeseci pojašnjavao i dorađivao da bi rezultirao sa bazom projektnih ideja (147) koja je bila predmetom analize intervencijske logike i detaljnih planiranja. Baza se dorađivala na način da su izdvojeni projekti koji će biti dio otvorenih poziva na dodjelu bespovratnih sredstava za neprofitne organizacije i ustanove (ESF) te za male i srednje poduzetnike (uključujući OPG-ove) kroz EFRR. Projektne ideje koje su ostale u bazi dodatno su analizirane i pročišćene obzirom na njihovu izvodljivost u parametrima provedbe IP-a (period od 6 godina i stanje pojedine projektne ideje). Za projekte koji su ostali u bazi te definirani kao oni koji idu u daljnju razradu i bodovanje pripremljeni su detaljni projektni obrasci. Nakon prikupljanja dodatnih informacija o projektu i njegove razrade definirani su parametri koji su omogućili objektivnu procjenu težine pojedinog projekta i njegovu prioritizaciju u odnosu na ostale.

Projekti su razvrstani u sljedeće kategorije:

- GLAVNI, KLJUČNI (FLAGSHIP) projekti su oni oko kojih postoji snažan konsenzus i obvezanost dionika na njihovu provedbu; ovo su projekti koji se smatraju neophodnim za postizanje ciljeva plana i Programa i regeneraciju područja i mogu imati 'soft' i 'hard' komponentu (ESF i EFRR vrste aktivnosti), ili biti isključivo orientirani na jednu vrstu aktivnosti ('soft' ili 'hard')
- KOMPLEMENTARNI projekti su bitni za ostvarenje ciljeva IP-a i logiku intervencije svakog prioriteta teritorijalnog razvoja, ali zbog svoje manje finansijske vrijednosti, širine i/ili jačine utjecaja, nisu od presudne važnosti.
- HORIZONTALNI projekti su nematerijalne aktivnosti (npr. obrazovanje, pružanje usluga, unaprjeđenje učinkovitosti uprave) koje su usmjerene na ljudske resurse i institucionalno jačanje. Horizontalni projekti dio su razvojnih projekata IP-a ili su pojedinačni.

Prioritizacija projekata provedena je na način da je svaki projekt ocijenjen prema definiranim kriterijima, od kojih je svaki imao različitu težinu:

Kriterij	Maksimalni broj bodova
K1 Doprinos ciljevima Programa	15
K2 Integriranost projekta (potencijal za aktiviranje sinergija)	15
K3 Izvori financiranja (integracija finansijskih izvora)	10
K4 Doprinos zapošljavanju i poticanje lokalnog gospodarstva	15
K5 Normativna zrelost projekta	15
K6 Logika intervencije	15
K7 Metodologija provedbe projekta	15
UKUPNO	100

### III.1.2 Ocjena projekata

Ocjenjivanje tj. bodovanje projekata provelo je Partnerstvo za IP uključujući Jedinicu za IP. Projekti koji su procesom bodovanja odabrani kao prioritetni jasno su naznačeni u akcijskom planu. Od 19 projekta koji su bili u sustavu bodovanja njih 13 imalo je između 60 i 100 bodova te bi se njih prema metodologiji trebalo razvijati dalje kroz IP. Budući da je okvirna alokacija za Intervencijski plan Grada Benkovca 28.000.000,00 EUR (od kojih je 85% sufinancirano iz EFRR i ESF, u prosjeku) dva zadnja projekta na listi od 13 također su stavljeni na rezervnu listu. Preostalih 11 projekata razvijati će se prioritetno dok će 2, za koja nema dovoljno sredstava a imaju više od 60 bodova te 6 projekata koji su ostvarili između 40 i 60 bodova ostati u samom IP kao potencijal bilo za provedbu ovog IP-a ukoliko se određeni uvjeti promjene bilo za buduće razvojne strategije i planove.

Tablica rezultata bodovanja/procesa prioritizacije projekata sa osnovnim pratećim informacijama nalazi se dalje u tekstu. Detalje o projektima, njihovim provedbenim elementima i fazama donosi Akcijski plan, Prilog 3 ovog dokumenta.

**Tablica: Rezultati bodovanja/procesa prioritizacije**

NAZIV PROJEKTA	BODOVI	VRSTA PROJEKTA	DOMINANTNA PLANSKA DOMENA	NOSITELJ PROJEKTA	UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA (HRK)
Vodovodne mreže u službi razvoja	84,87	Komplementarni	Više od jedne dominantne domene	Trgovačko društvo "Vodovod i odvodnja"	12.500.000,00
Benkovački sajam	78,70	Glavni	Više od jedne dominantne domene	Grad Benkovac	27.850.000,00
Rekonstrukcija i uređenje gradske jezgre	78,17	Glavni	Više od jedne dominantne domene	Grad Benkovac	17.100.000,00

Revitalizacija i uređenje zavičajnog muzeja Benkovac	77,60	Glavni	Više od jedne dominantne domene	Zavičajni muzej Benkovac	12.500.000,00
Dom kulture Benkovac	76,87	Glavni	Više od jedne dominantne domene	Grad Benkovac	35.450.000,00
Rekonstrukcija i sanacija nerazvrstanih cesta	73,25	Komplementarni	Više od jedne dominantne domene	Grad Benkovac	25.437.500,00
Razvoj tematskih ruta	72,80	Glavni	Kulturno naslijeđe i turizam	Grad Benkovac	12.500.000,00
Uređenje karinske plaže i pripadajuće infrastrukture	71,17	Glavni	Više od jedne dominantne domene	Grad Benkovac	10.000.000,00
Mreža domova	69,07	Komplementarni	Društvene djelatnosti	Grad Benkovac	10.000.000,00
Izgradnja komunalne infrastrukture poslovne zone Benkovačko Selo	66,75	Komplementarni	Više od jedne dominantne domene	Grad Benkovac	15.300.000,00
Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih dječjih igrališta	63,47	Komplementarni	Više od jedne dominantne domene	Grad Benkovac	300.000,00
<b>Iscrpljenje okvirne alokacije<sup>3</sup></b>					
Veteranski vojni turizam	63,45	Glavni	Kulturno naslijeđe i turizam	Braniteljska zadruga	31.000.000,00
Centar poduzetništva i tehnologije	63,05	Glavni	Industrija i poduzetništvo	Grad Benkovac	11.418.000,00
<b>Projekti s brojem bodova manjim od 60</b>					
Završetak radova dječjeg vrtića u zgradi POS-a	57,13	Komplementarni	Društvene djelatnosti	Grad Benkovac	3.187.500,00
Unapređenje sportske infrastrukture u Gradu Benkovcu	56,85	Komplementarni	Društvene djelatnosti	Grad Benkovac	15.543.750,00
Posjetiteljski centar Bukovice	50,92	Komplementarni	Kulturno naslijeđe i turizam	Zadarska županija	57.360.000,00
Srednja škola	50,65	Komplementarni	Društvene djelatnosti	Srednja škola ili Zadarska županija	40.912.500,00
Centar za podršku i dodatne usluge u zajednicama	48,27	Glavni	Društvene djelatnosti	Grad Benkovac	8.000.000,00
Osnovna škola	46,32	Komplementarni	Društvene djelatnosti	Osnovna škola ili Zadarska županija	6.000.000,00

<sup>3</sup> Projekti na listi nakon iscrpljenja okvirne alokacije zajedno s projektima koji su ostvarili manje od 60 bodova u procesu ocjenjivanja čine rezervnu listu projekata ovog IP-a i kao takvi su navedeni i u samom Prilogu 3 ovog dokumenta, tj. Akcijskom planu provedbe IP-a.

## III.2 PORTFOLIO PROJEKATA

### III.2.1 Projektni obrasci

NAZIV PROJEKTA	VODOVODNE MREŽE U SLUŽBI RAZVOJA
<b>Lokacija projekta</b>	<p><a href="https://www.google.hr/maps/place/23420,+Peru%C5%A1%C4%87+Benkova%C4%8Dki/@44.0011163,15.6147854,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4761da071a052898b0xe1379975b0ff82818m2!3d44.0075718!4d15.6368727?hl=en">https://www.google.hr/maps/place/23420,+Peru%C5%A1%C4%87+Benkova%C4%8Dki/@44.0011163,15.6147854,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4761da071a052898b0xe1379975b0ff82818m2!3d44.0075718!4d15.6368727?hl=en</a></p> <p><a href="https://www.google.hr/maps/place/23420,+Podgra%C4%91e@44.0121229,15.6465894,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4761d095b796dd87:0xaf464da22a66e83c!8m2!3d44.0206698!4d15.6680389">https://www.google.hr/maps/place/23420,+Podgra%C4%91e@44.0121229,15.6465894,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4761d095b796dd87:0xaf464da22a66e83c!8m2!3d44.0206698!4d15.6680389</a></p> <p><a href="https://www.google.hr/maps/place/Nadin/@44.073726,15.4527293,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4761dd422b8fb4fb:0x7201239be62ae777!8m2!3d44.0735732!4d15.4983757">https://www.google.hr/maps/place/Nadin/@44.073726,15.4527293,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4761dd422b8fb4fb:0x7201239be62ae777!8m2!3d44.0735732!4d15.4983757</a></p> <p>Naselja: Perušić Benkovački, Podgrađe i Nadin</p>
<b>Vrsta projekta:</b>	Komplementarni
<b>Razvojni prioritet:</b>	<b>1RP: Os razvoja: Razvoj Benkovca kao centra društvenog života Ravnih Kotara i Bukovice</b>
<b>Opći cilj:</b>	<p><b>1. Prostorni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Iskoristiti potencijale prostornog značaja Grada Benkovca kroz očuvanje i održivo korištenje prostornih resursa.</li> </ul> <p><b>2. Društveni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ojačati ulogu Grada Benkovca kao središta društvenog života Ravnih Kotara i Bukovice te povećati životni standard građana.</li> </ul> <p><b>3. Gospodarski:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Povećati kapacitete na području Grada Benkovca za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, s naglaskom na poljoprivrednu i ekološku proizvodnju, prerađivačke djelatnosti, trgovinu i održivi turizam.</li> </ul>
<b>Specifični cilj:</b>	<p>1. Dovođenje zdravstveno ispravne vode u prigradska naselja izgradnjom mjesne vodovodne mreže u naseljima Perušić Benkovački, Podgrađe i Nadin radi održivog razvoja područja i osiguranja adekvatnog standarda življenja na širem području Grada Benkovca.</p> <p>2. Izgradnja ovog sustava doprinijeti će smanjenju depopulacije lokalnog stanovništva, poboljšanju higijene i životnog standarda, poboljšanju životnih i radnih uvjeta.</p>
<b>Planska domena:</b>	<b>Mobilnost, promet i stanovanje;</b> poljoprivreda i ruralni razvoj, kulturno nasljeđe i turizam
<b>Vrijednost:</b>	<p>Trošak izrade studije izvedivosti: 250.000,00 kn uključujući PDV</p> <p>Trošak izgradnje vodovoda naselje Perušić Benkovački: 2.750.000 kn uključujući PDV</p> <p>Trošak izgradnje vodovoda naselje Podgrađe: 2.000.000,00 kn uključujući PDV</p> <p>Trošak izgradnje vodovoda naselje Nadin: 7.500.000,00 kn uključujući PDV</p> <p><b>Ukupna vrijednost projekta: 12.500.000,00 kn uključujući PDV</b></p>
<b>Financiranje:</b>	<p>EFRR 85%</p> <p>Javna (vlastita) sredstva 15%</p>

<b>Prijavitelj:</b>	Trgovačko društvo „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. u vlasništvu Grada koje gospodari sustavom vodoopskrbe i odvodnje na području Grada Benkovca.
<b>Iskustvo prijavitelja za provedbu projekata:</b>	<p>Poduzeće Vodovod i odvodnja d.o.o. ima dugogodišnje iskustvo u provođenju projekata vezanih uz vodoopskrbu i odvodnju. U posljednjih četiri godine u suradnji sa Hrvatskim vodama proveli su nekoliko projekata u ukupnoj vrijednosti od 45.000.000,00 kn (izgradnja mjesne vodovodne mreže Smilčić, rekonstrukcija vodovodne mreže Pristeg, Ceranje D., Polača, rekonstrukcija i dogradnja UPOV, rekonstrukcija nadzorno upravljačkog sustava vodoopskrbe).</p> <p>Grad Benkovac je od 2002. godine do danas sudjelovao, kao prijavitelj ili partner, u provedbi 10 projekata financiranih iz sredstava Europske unije, sa ukupnom vrijednosti većom od 3.500.000,00 eura. Dodatno, Grad Benkovac je od 1997. godine proveo 40 projekata financiranih iz nacionalnih sredstava sa ukupnom vrijednošću većom od 16.000.000,00 eura.</p>
<b>Partneri:</b>	Grad Benkovac
<b>Ciljane skupine / krajnji korisnici</b>	<p><b>Ciljane skupine:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>„ Stanovništvo naselja Perušić Benkovački, Podgrađe i Nadin</li> <li>„ Poslovni subjekti na području obuhvata.</li> </ul> <p><b>Krajnji korisnici:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>„ Stanovnici Grada Benkovca</li> <li>„ Turisti i posjetitelji</li> <li>„ Budući poslovni subjekti na području Grada Benkovca</li> </ul>
<b>Zrelost projekta</b>	Za naselja Perušić Benkovački (153 stanovnika), Podgrađe (87 stanovnika) te Nadin (406) postoje svi preduvjeti (vodospreme i magistralni vodovi) kao i projektna dokumentacija. Od tehničke dokumentacije nedostaje samo studija izvedivosti te je za njenu izradu potrebno do 6 mjeseci. <b>Za naselje Perušić Benkovački</b> ishođena je Potvrda glavnog projekta i izrađen Glavni projekt. <b>Za naselje Podgrađe</b> izrađena je projektna dokumentacija te je podnesen zahtjev za izdavanje Potvrde glavnog projekta u 2009. godini. Potrebno je od RH dobiti rješenje imovinsko pravnih odnosa za parcelu na kojoj će biti crpna stanica. Nakon što se ishodi dokaz pravnog interesa za parcelu crpne stanice izdati će se Potvrda glavnog projekta po prijašnjem Zakonu o prostornom uređenju i gradnji. <b>Za naselje Nadin</b> ishođena je Lokacijska dozvola, izrađen Glavni projekt a rješavanje imovinsko pravnih odnosa je u tijeku nakon čega će Vodovod i odvodnja podnijeti zahtjev za izdavanje građevinske dozvole.
<b>Investicijski ciklus projekta:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rješavanje imovinsko-pravnih pitanja</li> <li>2. Javna nabava za izradu Studija izvedivosti</li> <li>3. Izrada studije izvedivosti</li> <li>4. Išhođenje građevinske dozvole</li> <li>5. Izvedbeni projekt</li> <li>6. Izrada prijavnog obrasca za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava</li> <li>7. Javna nabava za izvođenje građevinskih radova</li> <li>8. Javna nabava za građevinski nadzor nad izvođenjem radova</li> <li>9. Izgradnja vodovodnih mreža</li> <li>10. Išhođenje uporabne dozvole</li> </ol>

	<p>11. Prikључenje stanovništva na vodovodnu mrežu</p>
<b>Provđbeni mehanizam:</b>	Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga EFRR
<b>Obrazloženje projekta</b>	<p>Specifični cilj projekta je dovođenje zdravstveno ispravne vode u prigradska naselja izgradnjom mjesne vodovodne mreže u naseljima Perušić Benkovački, Podgrađe i Nadin radi održivog razvoja područja i osiguranja adekvatnog standarda življjenja na širem području Grada Benkovca. Ovaj projekt je iznimno važan prvenstveno za 3 naselja ali za čitavo područje Grada Benkovca. Za projekt postoje svi preduvjeti (vodospreme i magistralni vodovi) kao i projektna dokumentacija.</p> <p>Izgradnja ovog sustava doprinijet će smanjenju depopulacije lokalnog stanovništva, poboljšanju higijene i životnog standarda, poboljšanju životnih i radnih uvjeta.</p> <p>Provđbom ovog projekta očekuje se znatan broj direktnih i indirektnih učinaka na ekonomskom, socijalnom i ekološkom planu.</p> <p><b>Direktни učinci:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“ <b>očuvanje i povećanje kvalitete prostora za život ljudi, odnosno poboljšanje životnih i radnih uvjeta na ruralnom području Grada Benkovca</b></li> <p>Izgradnjom vodoopskrbnog sustava stječu se uvjeti za poboljšanje životnih i radnih uvjeta svih budućih korisnika odnosno osiguravaju se temeljni životni standardi suvremenog društva.</p> <li>“ <b>razvoj osnovne infrastrukture Grada Benkovca</b></li> <p>Izgradnja vodoopskrbnog sustava Grada Benkovca dio je cijelovitog programa revitalizacije istoimenog ruralnog područja. Naime, moderna infrastruktura predstavlja osnovu za osiguranje primjerenih životnih uvjeta u ruralnim područjima Republike Hrvatske.</p> <li>“ <b>smanjenje depopulacije ruralnog prostora Grada Benkovca</b></li> <p>Realizacijom projekta osiguravaju se uvjeti za primjerene životne i radne uvjete svih korisnika te se stvaraju preduvjeti za povratak stanovništva iz gradskih u ruralna područja Grada Benkovca kao i za zadržavanje domicilnog stanovništva.</p> <p><b>Indirektni učinci:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“ <b>Doprinos povećanju atraktivnosti arheološkog lokaliteta Aserija</b></li> <p>Ovim projektom arheološki lokalitet Aserija te lokalno stanovništvo imaju mogućnost priključenja na vodoopskrbu, što će doprinijeti razvoju turističkih sadržaja i dodatne ponude kako bi se privukao veći broj posjetitelja i time potaknuo lokalni ekonomski razvoj i ruralni turizam</p> <li>“ <b>Razvoj vinarstva i vinogradarstva</b></li> <p>Ovim projektom omogućavamo da se gotovo svi značajniji proizvođači vina, maslinova ulja i drugih poljoprivrednih proizvoda priključe na vodoopskrbni sustav Grada Benkovca</p> <li>“ <b>Razvoj ekologije</b></li> <p>Ovim projektom omogućavamo da se ekološki poljoprivredni proizvođači priključe na sustav javne vodoopskrbe</p> </ul> </ul>

	<p>Realizacija projekta utjecat će na dodatno pokretanje gospodarskih i socijalnih aktivnosti što u konačnici dovodi do razvoja ruralnog područja Grada Benkovca u vidu dodatnog zapošljavanja, a samim time i stvaranja većih prihoda domicilnog stanovništva kroz razvijeniju ruralnu ekonomiju.</p> <p>Projekt je u skladu sa <b>Strateškim programom ukupnog razvoja Grada Benkovca 2012.-2016.</b> te doprinosi ostvarenju sva tri razvojna cilja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uspješno gospodarstvo</li> <li>2. Očuvanje i održivo korištenje resursa</li> <li>3. Visoka kvaliteta usluga stanovništvu</li> </ol> <p><b>Županijska razvojna strategija Zadarske županije 2011.-2013.</b> definira četiri strateška cilja od čega se niže navedeni može direktno povezati s ovim projektom:</p> <p>STRATEŠKI CILJ 4: Unaprjeđenje zaštite okoliša i kvalitete života      Prioritet 4.1. Razvoj komunalne infrastrukture i usluga      Mjera 4.1.1. Razvoj sustava vodoopskrbe</p> <p><b>Plan razvoja turizma destinacije Benkovac</b> navodi značajnom potrebom razvoj vodoopskrbnog sustava u svim naseljima Grada Benkovca.</p>
Aktivnosti grupirane po EP:	<p><b>EP 1 Priprema dokumentacije</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Ishodjenje potvrde glavnog projekta za Podgrađe i građevinske dozovle za Nadin</li> <li>1.2. Raspisivanje natječaja za izradu studije izvedivosti za cjelokupni projekt</li> <li>1.3. Izrada studije izvedivosti za cjelokupni projekt</li> </ol> <p><b>EP 2 Građevinski radovi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Raspisivanje javne nabave za izvođenje radova</li> <li>2.2. Raspisivanje javne nabave za građevinski nadzor nad radovima</li> <li>2.3. Provedba ugovora za izvođenje radova</li> <li>2.4. Provedba ugovora o građevinskom nadzoru nad izvođenjem radova</li> </ol> <p><b>EP 3 Promidžba i vidljivost</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Promocija projekta – početna i završna konferencija za tisk, letak, objava vijesti o projektu na postojećim mrežnim stranicama Grada Benkovca te izrada svi popratnih materijala definiranih Uputama za korisnike za razdoblje 2014.-2020.: Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata (Zagreb, svibanj 2015. MRRFEU)</li> </ol> <p><b>EP 4 Upravljanje i administracija</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1. Sastanci projektnog tima</li> <li>4.2. Izvještavanje</li> </ol>

	<p>4.3. Financijsko upravljanje projektom</p> <p>4.4. Upravljanje projektnim aktivnostima</p> <p>4.5. Upravljanje postupcima javne nabave</p> <p>4.5. Financijska revizija projekta</p>
<b>Ključni rezultati:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Podignuta razina kvalitete i dostupnost komunalne infrastrukture</li> <li>- Izgrađena i stavljena u funkciju nova komunalna infrastruktura</li> <li>- Potaknut razvoj postojećih i novih poljoprivrednih proizvođača</li> <li>- Potaknut razvoj dodatnih turističkih sadržaja ruralnog turizma</li> </ul>
<b>Pokazatelji:</b>	<p><b>Izgrađena ili obnovljena infrastruktura: 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“ Izgrađene tri vodoopskrbne mreže na području Grada Benkovca</li> <li>“ Izgrađeno 3,25 km u Perušiću Benkovačkom, 1,9 km u Podgrađu i 8,5 km Nadin nove mjesne vodovodne mreže</li> </ul> <p><b>Priključeni korisnici na vodoopskrbnu mrežu: 144</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“ 165 kućanstva priključeno na vodoopskrbnu mrežu, te 55 gospodarskih subjekata</li> </ul>
<b>Upravljanje projektom (opisati tim uključujući zaposlene i nova zapošljavanja):</b>	<p>Projektni tim:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Voditelj/ica projekta 12%</li> <li>2. Koordinator/ica radova 15%</li> <li>3. Administrativni referent/ica 5%</li> <li>4. Financijsko-računovodstveni referent/ica 5%</li> <li>5. Stručnjak/inja za javnu nabavu 2%</li> </ol>
<b>Trajanje:</b>	<p>Izgradnja: 12 mjeseci (ovisno o kilometraži)</p> <p>Priključenje stanovništva na vodovodnu mrežu: 12 mjeseci</p>
<b>Održivost:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Finacijska i upravljačka održivost:</b> održavanje infrastrukture financirat će se plaćanjem računa za vodu od strane korisnika te će se od toga u budućnosti održavati izgrađena infrastruktura i financirati plaće zaposlenika. Vodovod kao komunalna infrastruktura ostaje na upravljanju i održavanju u gradskom komunalnom poduzeću Vodovod i odvodnja d.o.o. koji je ujedno i nositelj projekta.</li> <li>2. <b>Okolišna održivost:</b> prilikom izrade tehničke dokumentacije, u projektnom zadatku će se jasno naglasiti da se treba voditi briga o utjecaju na okoliš te o svim relevantnim elementima vezanim uz utjecaj na okoliš. Tijekom radova zahvati će biti provedeni na način da su u potpunosti u suglasnosti sa, tada važećim, relevantnim zakonskim okvirom vezanim uz utjecaj na okoliš. Nadalje kroz ostale aktivnosti IP promovirati će se važnost zaštite prirodnih resursa uključujući i vodu osobito vezano uz uštede pitke vode.</li> <li>3. <b>Turistička održivost:</b> rekonstruirana i izgrađena vodoopskrbna infrastruktura primarno će služiti lokalnom stanovništvu 365 dana godišnje. Poboljšat će ponudu i uslugu u turizmu u navedenim naseljima što će ubrzati gospodarske tijekove i kvalitetu života stanovnika.</li> </ol>

Terminski plan provedbe projekta																			
		2017		2018				2019				2020				2021			
		3. k v	4. k v	1. k v	2. k v	3. k v	4. k v	1. k v	2. k v	3. k v	4. kv	1. k v	2. k v	3. k v	4. k v	1. k v	2. k v	3. k v	4. k v
Rješavanje imovinsko-pravnih pitanja																			
Studija izvedivosti																			
Javna nabava za tehničku dokumentaciju																			
Ishođenje građevinske dozvole																			
Izvedbeni projekt																			
Javna nabava																			
Izrada prijavnog obrasca za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava																			

	Izgradnja vodovodni h mreža																	
	Ishođenje uporabne dozvole																	
	Priključenje stanovništva na mrežu <sup>4</sup>																	
<b>Nazivi skica, fotografija i drugih grafičkih prikaza projektnih ideja</b>																		

<b>NAZIV PROJEKTA</b>	BENKOVAČKI SAJAM – UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE I VALORIZACIJA
<b>Lokacija projekta</b>	<a href="https://www.google.hr/maps/place/Benkova%C4%8Dko+Selo/@44.0558793,15.5727762,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4761dae01e874c59:0xfe311da87daf2277!8m2!3d44.0423142!4d15.6173853?hl=en">https://www.google.hr/maps/place/Benkova%C4%8Dko+Selo/@44.0558793,15.5727762,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4761dae01e874c59:0xfe311da87daf2277!8m2!3d44.0423142!4d15.6173853?hl=en</a> Naselje: Benkovačko Selo
<b>Vrsta projekta:</b>	Glavni
<b>Razvojni prioritet:</b>	<b>3RP: Prioritetno područje intervencije - Valorizacija Benkovačkog sajma</b>
<b>Opći cilj:</b>	<p><b>1. Prostorni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“ Iskoristiti potencijale prostornog značaja Grada Benkovca kroz očuvanje i održivo korištenje prostornih resursa.</li> </ul> <p><b>3. Gospodarski:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“ Povećati kapacitete na području Grada Benkovca za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, s naglaskom na poljoprivrednu i ekološku proizvodnju, prerađivačke djelatnosti, trgovinu i održivi turizam.</li> </ul>
<b>Specifični cilj:</b>	<p>1. Osigurati poljoprivrednicima siguran plasman roba i omogućiti im poticanje i stvaranje novih tržišta kroz proizvodnju i organizacija otkupa poljoprivrednih proizvoda na jednom mjestu – stočnom sajmu.</p>

<sup>4</sup> Aktivnost ne spada pod Ugovor o provedbi projekta u okviru dodjele bespovratnih sredstava

	<p>2. Osiguravanje okvira za razvoj tradicijskih proizvoda, tradicijskih zanata koje u konačnici vode i do zaštite takvih proizvoda i prepoznavanja u Europi (Proizvodnja hrane i preuzimanje skrbi za prostornu, društvenu i gospodarsku kvalitetu življenja stanovnika ruralnih područja)</p>
<b>Planska domena:</b>	<b>Poljoprivreda i ruralni razvoj;</b> Industrija i poduzetničko okruženje, kulturno nasljeđe i turizam
<b>Vrijednost:</b>	<p><b>Trošak pripreme projektne dokumentacije:</b> 2.250.000,00 kn uključujući PDV</p> <p>Trošak infrastrukturnih radova: 25.000.000,00 kn uključujući PDV</p> <p>Trošak nematerijalnih aktivnosti: 600.000,00 kn uključujući PDV</p> <p><b>Ukupna vrijednost projekta: 27.850.000,00 kn uključujući PDV</b></p>
<b>Financiranje:</b>	<p>Specifični cilj 1: EFRR 85%; javna (vlastita) sredstva 15%</p> <p>Specifični cilj 2: ESF 85%; javna (vlastita) sredstva 15%;</p>
<b>Prijavitelj:</b>	Grad Benkovac
<b>Iskustvo prijavitelja za provedbu projekata:</b>	<p>Grad Benkovac je od 2002. godine do danas sudjelovao, kao prijavitelj ili partner, u provedbi 10 projekata financiranih iz sredstava Europske unije, sa ukupnom vrijednosti većom od 3.500.000,00 eura.</p> <p>Dodatno, Grad Benkovac je od 1997. godine proveo 40 projekata financiranih iz nacionalnih sredstava sa ukupnom vrijednošću većom od 16.000.000,00 eura.</p>
<b>Partneri:</b>	Komunalno poduzeće Benković d.o.o., Turistička zajednica, Udruženje obrtnika Benkovac, Veterinarska stanica Benkovac, Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije, Zadarska županija
<b>Ciljane skupine / krajnji korisnici</b>	<p><b>Ciljane skupine:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“ Poljoprivredni proizvođači</li> <li>“ Vlasnici tradicijskih obrta</li> <li>“ Poduzetnici</li> <li>“ OPG</li> <li>“ Ostali trgovci i proizvođači</li> </ul> <p><b>Krajnji korisnici:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“ Stanovnici Grada Benkovca u cjelini</li> <li>“ Turisti različitih profila, ali osobito ljubitelji gastronomskih i kulturnih sadržaja te prirode</li> </ul>
<b>Zrelost projekta:</b>	<p>Projektna ideja;</p> <p>za izradu tehničke dokumentacije potrebno je više od 6 mjeseci</p> <p>Napomena: Izrađen UPU trgovачke zone Kukalj</p>
<b>Investicijski ciklus projekta:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Javna nabava za izradu tehničke dokumentacije (idejno rješenje, geodetski projekt, glavni projekt i izvedbeni projekt, elaborat o procjeni utjecaja na okoliš, studija izvedivosti)</li> <li>2. Pronalažak privremene lokacije za sajam</li> <li>3. Opremanje privremene lokacije u skladu s tehničkim normama i zahtjevima</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Idejni projekt<sup>5</sup></li> <li>5. Elaborat o procjeni utjecaja na okoliš</li> <li>6. Plan upravljanja Benkovačkim sajmom</li> <li>7. Geodetski projekt</li> <li>8. Studija izvedivosti</li> <li>9. Glavni projekt</li> <li>10. Ishođenje građevinske dozvole</li> <li>11. Izvedbeni projekt + projekt opremanja</li> <li>12. Izrada prijavnog obrasca za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava</li> <li>13. Javna nabava za izvođenje građevinskih radova</li> <li>14. Javna nabava za građevinski nadzor nad izvođenjem radova</li> <li>15. Javna nabava za opremanje</li> <li>16. Provedba ugovora o izvođenju građevinskih radova i opremanju</li> <li>17. Provedba ugovora o građevinskom nadzoru nad izvođenjem radova</li> <li>18. Tehnički pregled</li> <li>19. Uporabna dozvola</li> <li>20. Edukativne aktivnosti</li> </ol>
<b>Provedbeni mehanizam:</b>	<p>Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga EFRR</p> <p>Izravna dodjela bespovratnih sredstava ESF</p>
<b>Obrazloženje projekta</b>	<p>Benkovački sajam je tradicionalna manifestacija trgovacko-ugostiteljskog karaktera. Njegova visoka posjećenost (od 3.000 – 8.000 izlagača i posjetitelja) ukazala je na nedostatnu kvalitetu postojećeg prostora s obzirom na njegovu lošu infrastrukturnu opremljenost te mogućnosti dodavanja novih sadržaja u svrhu iskorištavanja potencijala sajma s obzirom na rastući interes za posjećivanje događaja.</p> <p>Slijedom navedenoga Grad Benkovac, na temelju donesenog Urbanističkog plana uređenja, ima namjeru pristupiti izgradnji komunalne infrastrukture i potrebnih građevinskih objekata i to:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. građevine kojoj će se u prizemlju nalaziti sanitarni čvorovi, manja skladišta i svlačionice u funkciji amfiteatra, a na katu uprava sajma</li> <li>2. autohtone dalmatinske kuće sa ugostiteljskim sadržajima</li> <li>3. aukcijske dvorane za izlaganje i prodaju životinja s poslovnim prostorima namijenjenima za ugostiteljstvo, pružanje informacija, prodaju i sl.</li> <li>4. građevine za kontrolu ulaza, sa spremištem opreme za čišćenje, veterinarskom stanicom i inspekcijskim nadzorom</li> <li>5. građevina za izolaciju bolesnih životinja sa prostorom za uginule životinje</li> <li>6. izgradnja pristupne ceste sa vezom na državnu cestu D27</li> </ol> <p>Uređenjem prostora i novim sadržajima omogućit će se kontinuirano odvijanje aktivnosti vezanih uz sajam i mimo 10. dana u mjesecu, samog datuma održavanja sajma. Benkovački bi se sajam još više popularizirao i dodatno obogatio poslovne aktivnosti, turističku ponudu i promociju benkovačkog kraja.</p>

<sup>5</sup> Ishođenje lokacijske dozvole ukoliko se ne riješe imovinsko pravni odnosi

	<p>U nacionalnom Programu ruralnog razvoja RH poticanje razvoja zanata, proizvoda sa sela kao i organiziranog plasmana na tržište čine glavnu pretpostavku i cilj razvoja poljoprivrednih područja.</p> <p>Izgradnjom stočnog sajma na kojem bi osim plasmana stoke bio zastupljen i plasman svih poljoprivrednih proizvoda uključujući i proizvode tradicijskih zanata pridonijelo bi stvaranju konkurentnosti benkovačkog kraja na domaćem tržištu odnosno razvitka ruralnog prostora.</p> <p>Osim organizirane poljoprivredne proizvodnje, okrupnjavanja poljoprivrednih proizvođača, zaštite zatečenih resursa i korištenje na način da se zaustavi njihovo propadanje, ovaj projekt ima za zadatak očuvati graditeljsko nasleđe, tradicijske zanate, promicati kvalitetne tradicijske proizvode, povećati kvalitetu života te u konačnici smanjiti negativna demografska kretanja.</p> <p>Projekt je u skladu sa <b>Strateškim programom ukupnog razvoja Grada Benkovca</b> 2012.-2016. te doprinosi ostvarenju sva tri razvojna cilja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uspješno gospodarstvo</li> <li>2. Očuvanje i održivo korištenje resursa</li> <li>3. Visoka kvaliteta usluga stanovništvu</li> </ol> <p>Ovaj projekt direktno i indirektno doprinosi ostvarenju sljedećih Mjera definiranih Strateškim programom:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poticati razvoj srednjeg i malog poduzetništva temeljenog na resursnim mogućnostima i potrebama tržišta</li> <li>2. <b>Potaći proširenje kapaciteta i ponude Benkovačkog sajma</b></li> <li>3. Umrežiti benkovačke čimbenike razvoja ruralnog turizma</li> <li>4. Poticati obnovu i razvoj tradicijskih obrta te oblikovanje, proizvodnju i prodaju izvornih suvenira</li> <li>5. Poticati razvoj konkurentne poljoprivrede temeljene na novim tehnologijama, marketingu i tržišno prihvatljivom asortimanu</li> <li>6. Podići kvalitetu usluga poduzetnicima</li> </ol> <p><b>Plan razvoja turizma destinacije Benkovac</b> na više mesta spominje važnost Benkovačkog sajma ne samo kao pokretača gospodarstva već i kao turističku atrakciju. Benkovački sajam izdvojen je kao zaseban projekt (Projekt 6) te su detaljno razrađene odrednice njegovog razvoja (duže trajanje, osmišljavanje zanimljivih manifestacija i događanja, zoniranje, sustavna promocija...)</p>
Aktivnosti grupirane po EP:	<p><b>EP 1 Priprema dokumentacije</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Raspisivanje natječaja za izradu projektne dokumentacije</li> <li>1.2. Izrada projektne dokumentacije uključujući i studiju izvedivosti i ukoliko je potrebno izrada studije utjecaja na okoliš</li> <li>1.3. Išođenje građevinske dozvole</li> <li>1.4. Izrada elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja za okoliš</li> </ol>

	<p><b>EP 2 Građevinski radovi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1. Raspisivanje javne nabave za izvođenje građevinskih radova</li> <li>2.2. Raspisivanje Javne nabave za građevinski nadzor nad izvođenjem radova</li> <li>2.3. Provedba ugovora za izvođenje radova</li> <li>2.4. Provedba ugovora za izvođenje nadzor nad izvođenjem radova</li> </ul> <p><b>EP 3 Edukativne aktivnosti valorizacije Benkovačkog sajma i povećanja njegove konkurentnosti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1. Izrada programa obrazovanja u području razvoja kulturnog turizma, razvoja tradicijskih obrta te oblikovanje, proizvodnju i prodaju izvornih suvenira</li> <li>3.2. Selekcija polaznika obrazovanja</li> <li>3.3. Izvedba programa obrazovanja</li> <li>3.4. Mentorstvo polaznicima u konkretnom razvoju proizvoda</li> </ul> <p><b>EP 4 Promidžba i vidljivost</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>4.1. Promocija projekta – početna i završna konferencija za tisak, letak, objava vijesti o projektu na postojećim mrežnim stranicama Grada Benkovca te izrada svi popratnih materijala definiranih Uputama za korisnike za razdoblje 2014.-2020.: Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata (Zagreb, svibanj 2015. MRRFEU)</li> <li>4.2. Izrada marketinške strategije Benkovačkog sajma</li> <li>4.3. Edukativne radionice u okviru promotivne kampanje (upoznavanje sa tradicijskim zanatima, poljoprivrednom i stočarskom proizvodnjom i sl.)</li> </ul> <p><b>EP 5 Upravljanje i administracija</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5.1. Sastanci projektnog tima</li> <li>5.2. Izvještavanje</li> <li>5.3. Financijsko upravljanje projektom</li> <li>5.4. Upravljanje projektnim aktivnostima</li> <li>5.5. Upravljanje postupcima javne nabave</li> <li>5.6. Financijska revizija projekta</li> </ul>
--	--

<b>Ključni rezultati:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Izgrađena i u funkciji građevina sa sanitarnim čvorovima, manjim skladištima i svlačionicama u funkciji amfiteatra u prizemlju, a na katu uredske prostorije</li> <li>- Izgrađena i u funkciji autohtona dalmatinska kuća sa ugostiteljskim sadržajima</li> <li>- Izgrađene i u funkciji aukcijske dvorane za izlaganje i prodaju životinja s poslovnim prostorima namijenjenima za ugostiteljstvo, pružanje informacija, prodaju i sl.</li> <li>- Izgrađene i u funkciji građevine za kontrolu ulaza, sa spremištem za opremu za čišćenje, veterinarskom stanicom i inspekcijskim nadzorom</li> <li>- Izgrađena i u funkciji građevina za izolaciju bolesnih životinja sa prostorom za uginule životinje</li> <li>- Izgrađena i u funkciji pristupna cesta sa vezom na državnu cestu D27</li> <li>- Podignuti kapaciteti za upravljanje i promociju sajmom</li> <li>- Podignuti kapaciteti lokalnog stanovništva na području razvoja kulturnog turizma, razvoja tradicijskih obrta te oblikovanje, proizvodnju i prodaju izvornih suvenira</li> <li>- Povećana vidljivost sajma i njegova turistička atraktivnost i baštinsko-tradicionalna vrijednost</li> </ul>
<b>Pokazatelji:</b>	<p><b>Izgrađena ili obnovljena infrastruktura: 6</b></p> <p>komunalna infrastruktura: 1 elektroopskrbna mreža s javnom rasvjetom, vodoopskrbna mreža, fekalna odvodnja, oborinska odvodnja, kolno-pješačke površine, zelene površine, pristupna cesta</p> <p>izgrađene građevine u funkciji sajma: 5</p> <p><b>Stručnjaci koji sudjeluju u osposobljavanju: 2</b></p> <p><b>Nezaposleni koji sudjeluju u programu osposobljavanja: 10</b></p>
<b>Upravljanje projektom (opisati tim uključujući zaposlene i nova zapošljavanja):</b>	<p>Projektni tim:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Voditelj/ica projekta 12%</li> <li>2. Koordinator/ica radova 15%</li> <li>3. Administrativni referent/ica 5%</li> <li>4. Finansijsko-računovodstveni referent/ica 5%</li> <li>5. Stručnjak/inja za javnu nabavu 2%</li> </ol>
<b>Trajanje:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rješavanje imovinsko-pravnih pitanja 12 mjeseci</li> <li>2. Izrada dokumentacije – paralelno s 1., 12 mjeseci</li> <li>3. Gradnja/opremanje – 24 mjeseca</li> </ol>
<b>Održivost:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Finansijska i upravljačka održivost:</b> infrastruktura koja će se davati u zakup ciljanim skupinama generirati će prihode te će se od toga u budućnosti održavati novo obnovljena/izgrađena infrastruktura i plaće zaposlenika. Komunalna infrastruktura se daje na upravljanje i održavanje gradskim komunalnim tvrtkama. Za telekomunikacijsku mrežu se sklapa ugovor o najmu. Objekti (zatvoreni, štandovi, boksevi za životinje) daju se u najam. Objekte u sklopu sajma koristit će bez naknade komunalno poduzeće Benković d.o.o. u vlasništvu Grada Benkovca. Izlagači koriste turističku infrastrukturu (smještaj, ugostiteljske usluge) kao i komunalnu infrastrukturu te se i tako pokreće lokalno gospodarstvo i osiguravaju stalni prihodi kao i zadržavanje radnih mjesta uz potencijalno otvaranje novih ukoliko sajam poprimi veći opseg.</li> </ol>

	2. <b>Turistička održivost:</b> Mnogi turisti žele osim kulturnih i prirodnih znamenitosti vidjeti i sajmove – mesta na kojima se odvija svakodnevni život jedne zajednice. Stoga će osim turista-izlagača iz cijele Hrvatske, posjetitelji biti i turisti zainteresirani za posjećivanje sajmova.																																																																																																																																																							
	3. <b>Okolišna održivost:</b> prilikom izrade tehničke dokumentacije, u projektnom zadatku će se jasno naglasiti da se treba voditi briga o energetskoj učinkovitosti, a po mogućnosti i uvođenju obnovljivih izvora energije (solarni paneli i sl.)																																																																																																																																																							
<b>Terminski plan provedbe projekta</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">3. kv</th> <th colspan="2">2017</th> <th colspan="2">2018</th> <th colspan="2">2019</th> <th colspan="2">2020</th> <th colspan="2">2021</th> </tr> <tr> <th>4. kv</th> <th>1. kv</th> <th>2. kv</th> <th>3. kv</th> <th>4. kv</th> <th>1. kv</th> <th>2. kv</th> <th>3. kv</th> <th>4. kv</th> <th>1. kv</th> <th>2. kv</th> <th>3. kv</th> <th>4. kv</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Opremanje zamjenske lokacije u skladu s tehničkim normama i zahtjevima</td><td></td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td></tr> <tr> <td>Idejno rješenje</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Elaborat o procjeni utjecaja na okoliš</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Plan upravljanja Benkovačkim sajmom</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Geodetski projekt</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Studija izvedivosti</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Glavni projekt</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Ishođenje građevinske dozvole</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Izvedbeni projekt + projekt opremanja</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		3. kv	2017		2018		2019		2020		2021		4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	Opremanje zamjenske lokacije u skladu s tehničkim normama i zahtjevima		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Idejno rješenje														Elaborat o procjeni utjecaja na okoliš														Plan upravljanja Benkovačkim sajmom														Geodetski projekt														Studija izvedivosti														Glavni projekt														Ishođenje građevinske dozvole														Izvedbeni projekt + projekt opremanja													
	3. kv			2017		2018		2019		2020		2021																																																																																																																																												
		4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv																																																																																																																																										
Opremanje zamjenske lokacije u skladu s tehničkim normama i zahtjevima		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.																																																																																																																																											
Idejno rješenje																																																																																																																																																								
Elaborat o procjeni utjecaja na okoliš																																																																																																																																																								
Plan upravljanja Benkovačkim sajmom																																																																																																																																																								
Geodetski projekt																																																																																																																																																								
Studija izvedivosti																																																																																																																																																								
Glavni projekt																																																																																																																																																								
Ishođenje građevinske dozvole																																																																																																																																																								
Izvedbeni projekt + projekt opremanja																																																																																																																																																								

	Izrada prijavnog obrasca za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava																									
	Javna nabava za izvođenje građevinskih radova																									
	Javna nabava za građevinski nadzor nad izvođenjem radova																									
	Javna nabava za opremanje																									
	Provredba ugovora o izvođenju građevinskih radova i opremanju																									
	Provredba ugovora o građevinskom nadzoru nad izvođenjem radova																									
	Tehnički pregled																									
	Uporabna dozvola																									
	Provredba edukacija (EP3)																									
<b>Nazivi skica, fotografija i drugi grafičkih prikaza projektnih ideja</b>																										

<b>NAZIV PROJEKTA</b>	<b>REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE STARE GRADSKE JEZGRE</b>
<b>Lokacija projekta</b>	<p><a href="https://www.google.hr/maps/place/%C5%A0etali%C5%A1te+kneza+Branimira,+23420,+Benkovac/@44.0337269,15.610819,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4761da56456a45ff:0xac32a3e3eda4f0ec!8m2!3d44.0337269!4d15.6130077?hl=hr">https://www.google.hr/maps/place/%C5%A0etali%C5%A1te+kneza+Branimira,+23420,+Benkovac/@44.0337269,15.610819,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4761da56456a45ff:0xac32a3e3eda4f0ec!8m2!3d44.0337269!4d15.6130077?hl=hr</a></p> <p>Grad Benkovac – naselje / centar grada</p>
<b>Vrsta projekta:</b>	Glavni
<b>Razvojni prioritet:</b>	<b>1RP: Os razvoja: Razvoj Benkovca kao centra društvenog života Ravnih Kotara i Bukovice</b>
<b>Opći cilj:</b>	<p><b>1. Prostorni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“ Iskoristiti potencijale prostornog značaja Grada Benkovca kroz očuvanje i održivo korištenje prostornih resursa.</li> </ul> <p><b>2. Društveni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“ Ojačati ulogu Grada Benkovca kao središta društvenog života Ravnih Kotara i Bukovice te povećati životni standard građana.</li> </ul> <p><b>3. Gospodarski:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“ Povećati kapacitete na području Grada Benkovca za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, s naglaskom na poljoprivrednu i ekološku proizvodnju, prerađivačke djelatnosti, trgovinu i održivi turizam.</li> </ul>
<b>Specifični cilj:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revitalizacijom stare gradske jezgre obnoviti će se stambeno-poslovna infrastruktura s ciljem podizanja kvalitete života stanara, osigurati kvalitetno i sigurno stanovanje za one najugroženije ali i stručni kadar koji je potreban u Benkovcu.</li> <li>2. Doprinijet će se porastu broja posjetitelja i gospodarskih sadržaja.</li> <li>3. Osigurat će se pristupačan i učinkovit rad javne uprave te energetske obnove koja će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje obnovljenih zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije uz učinkovitu javnu rasvjetu.</li> </ol>
<b>Planska domena:</b>	<b>Mobilnost, promet i stanovanje;</b> Okoliš, krajolik i upravljanje prirodnim resursima ; Društvene djelatnosti, usluge u zajednici, odgoj i obrazovanje.
<b>Vrijednost:</b>	<p><b>Trošak pripreme projektne dokumentacije:</b> 657.000,00 kn uključujući PDV</p> <p>Trošak infrastrukturnih radova: 16.443.000,00 kn uključujući PDV</p> <p><b>Ukupna vrijednost projekta: 17.100.000,00 kn uključujući PDV</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekonstrukcija i opremanje buduće zgrade gradske uprave <b>2.625.000,00 kn</b> (projektna dokumentacija 67.000,00 kn uključujući PDV)</li> <li>2. Rekonstrukcija i opremanje postojeće zgrade gradske uprave <b>1.875.000,00 kn</b> (projektna dokumentacija 40.000,00 kn uključujući PDV)</li> </ol>

	<p>3. Uređenje okoliša i trga oko zgrade gradske uprave: <b>2.475.000,00 kn</b> uključujući PDV</p> <p>4. Kupnja i rekonstrukcija zgrada za socijalno stanovanje <b>5.250.000,00 kn</b> (projektna dokumentacija 50.000,00 uključujući PDV)</p> <p>5. Završetak popločavanja šetnice: <b>375.000,00 kn</b> uključujući PDV</p> <p>6. Izgradnja i uređenje vanjske pozornice i prostora iza knjižnice i Doma kulture <b>1.125.000,00 kn</b> (projektna dokumentacija 25.000,00 uključujući PDV)</p> <p>7. Energetska obnova privatnih stambeno-poslovnih prostora <b>2.250.000,00 kn</b> (projektna dokumentacija <b>405.000,00 kn</b> uključujući PDV)</p> <p>8. Rekonstrukcija i opremanje stare crkvene kuće te prenamjena dijela kuće u Srpski kulturni centar: <b>1.125.000,00 kn</b> (projektna dokumentacija 70.000,00 uključujući PDV)</p>
<b>Financiranje:</b>	<p>EFRR 85%</p> <p>Javna (vlastita) sredstva 15%</p> <p><b>Potencijalni elementi državnih potpora ukoliko se isti utvrde nakon raspisivanja projekta i studije izvedivosti</b> Aktivnosti pod rednim brojevima 1., 2., 3., 5. i 6. ne sadržavaju državne potpore jer iz postojećeg opisa može se smatrati da se radi o nekomercijalnim aktivnostima ili o ulaganju koje ima lokalni karakter.</p> <p>Pod rednim brojem 4. radilo bi se o potporama koje imaju socijalni karakter i koje su namijenjene individualnim korisnicima što znači da bi se trebale definirati direktno po članku 107. stavak 2. Ugovora o financiranju EU. U studiji izvedivosti, između ostalog, bit će potrebno iskazati buduće prihode od stanara zgrade (obično za buduće razdoblje 10-15 godina) i to odbiti od iznosa ulaganja kako bi se dobio iznos dozvoljene potpore iz EU sredstava.</p> <p>Pod rednim brojem 7. treba razdvojiti prostore koji se odnose na stanovanje (nema potpore) od prostora koje koriste poduzetnici. Ako poduzetnici plaćaju energetsku obnovu prostora kojeg koriste tada nema potpore, a može im se isto tako odobriti, osim <i>de minimis</i> potpore, i državne potpore sukladno članku 39. Potpore za ulaganje u projekte energetske učinkovitosti zgrada, iz Uredbe o općim skupnim izuzećima. Potpore se mogu dodijeliti samo u obliku zajma ili jamstva koje pokriva najviše 80% zajma.</p>
<b>Prijavitelj:</b>	Grad Benkovac
<b>Iskustvo prijavitelja za provedbu projekata:</b>	<p>Grad Benkovac je od 2002. godine do danas sudjelovao, kao prijavitelj ili partner, u provedbi 10 projekata financiranih iz sredstava Europske unije, sa ukupnom vrijednosti većom od 3.500.000,00 eura.</p> <p>Dodatno, Grad Benkovac je od 1997. godine proveo 40 projekata financiranih iz nacionalnih sredstava sa ukupnom vrijednošću većom od 16.000.000,00 eura.</p>
<b>Partneri:</b>	<p>Vlasnici/suvlasnici zgrada</p> <p>Upravitelji zgrada</p>
<b>Ciljane skupine / krajnji korisnici</b>	<p><b>Ciljane skupine:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>~ Vlasnici zgrada koje će se obnavljati</li> <li>~ Zaposlenici gradske uprave Grada Benkovca</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>“ Zaposlenici Gradske knjižnice Grada Benkovca</li> <li>“ Gospodarstvenici u gradskoj jezgri</li> <li>“ Posjetitelji/turisti</li> <li>“ Građani</li> </ul> <p><b>Krajnji korisnici:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“ Najmoprimci/stanari zgrada koje će se obnavljati</li> <li>“ Stanovnici Grada Benkovca</li> <li>“ Poduzetnici</li> <li>“ Posjetitelji i turisti</li> </ul>
<b>Zrelost projekta:</b>	<p>Za objekte u vlasništvu grada tehnička dokumentacija je spremna</p> <p>Za objekte koji nisu u vlasništvu grada potrebno je više od 6 mjeseci za izradu tehničke dokumentacije</p>
<b>Investicijski ciklus projekta:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Javna nabava za izradu dokumentacije gdje je potrebno</li> <li>2. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa gdje je potrebno</li> <li>3. Elaborat o procjeni utjecaja na okoliš</li> <li>4. Geodetski projekt (socijalno stanovanje)</li> <li>5. Idejni projekt<sup>6</sup></li> <li>6. Studija izvedivosti</li> <li>7. Glavni projekt</li> <li>8. Ishođenje građevinske dozvole gdje je potrebno</li> <li>9. Izrada prijavnog obrasca za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava</li> <li>10. Izvedbeni projekt + projekt opremanja</li> <li>11. Javna nabava za izvođenje građevinskih radova</li> <li>12. Javna nabava za građevinski nadzor nad izvođenjem radova</li> <li>13. Javna nabava za opremanje</li> <li>14. Izrada projektne dokumentacije: projektni obrasci EFRR</li> <li>15. Provedba ugovora za izvođenje radova i opremanje</li> <li>16. Izrada plana urbane regeneracije stare gradske jezgre</li> </ol>
<b>Provđenbeni mehanizam:</b>	Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga EFRR

<sup>6</sup> Ishođenje lokacijske dozvole ukoliko se ne riješe imovinsko pravni odnosi

<b>Obrazloženje projekta</b>	<p>Projekt revitalizacije stare gradske jezgre kompleksan je projekt koji obuhvaća nekoliko komponenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 59 je kućnih brojeva na Šetalištu kneza Branimira od kojih su neki već obnovili pročelja i krovove od kojih će se njih 10 obnoviti kroz projekt i to tamo gdje se bude moglo dobiti odobrenje od vlasnika (Energetska obnova privatnih stambeno-poslovnih prostora)</li> <li>- obnova i opremanje tri zgrade vlasništvu Grada Benkovca (trenutna zgrada gradske uprave koja u budućnosti postaje vijećnica, gradska knjižnica, buduća zgrada gradske uprave),</li> <li>- obnova potencijalno dvije zgrade koje bi Grad Benkovac kupio za socijalno stanovanje,</li> <li>- završetak popločavanja šetnice</li> <li>- izgradnja i uređenje vanjske pozornice i prostora iza knjižnice i Doma kulture</li> <li>- obnova crkvene zgrade i u kojoj će se nalaziti Srpski kulturni centar, prostorije Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Benkovca, knjižnica; edukativni centar za djecu i prostorije za Kulturno umjetničko društvo Prosvjeta.</li> </ul> <p><b>Projekt je moguće podijeliti u 2 faze.</b> U prvoj fazi bi se provele aktivnosti pripreme i izvedbe infrastrukturnih radova za one objekte koji imaju potrebnu projektnu dokumentaciju a to su: rekonstrukcija buduće zgrade gradske uprave; rekonstrukcija postojeće zgrade gradske uprave; uređenje okoliša i trga oko zgrade gradske uprave; završetak popločavanja šetnice;</p> <p><b>U drugoj fazi projekta</b> uz izradu potrebne projektne dokumentacije radilo bi se na: kupnji i rekonstrukciji zgrada za socijalno stanovanje gdje je osim samog određivanja lokacije potrebno izraditi geodetski projekt te idejno rješenje kako bi se osigurali posebni uvjeti. Nadalje ova faza obuhvatila bi izgradnju i uređenje vanjske pozornice i prostora iza knjižnice i Doma kulture gdje je potrebno izraditi idejno rješenje kako bi se osigurali posebni uvjeti. U okviru 2 faze pripremila bi se i provela energetska obnova privatnih stambeno-poslovnih prostora nakon utvrđivanja točnih objekata i izrade potrebne dokumentacije. I zaključno u okviru ove faze izradila bi se potrebna dokumentacija tj. idejno rješenje kako bi se osigurali posebni uvjeti te provela rekonstrukcija i opremanje stare crkvene kuće te prenamjena objekta u Srpski kulturni centar.</p>
------------------------------	---

Poslovno-stambene zgrade koje se nalaze u staroj gradskoj jezgri grada Benkovca, bez obzira jesu li prema status vlasništva javne ili privatne, nisu planski i sustavno održavane desetljećima te je većina zgrada u staroj gradskoj jezgri u vrlo lošem/derutnom stanju.

Većinom su te zgrade jednokatnice ili dvokatnice s kraja 19. i početka 20. stoljeća. U staroj gradskoj jezgri identificirano je 59 zgrada (3 javne i 56 privatnih).

Razlozi i uzroci neodržavanja zgrada u staroj gradskoj jezgri su dvojaki: nedostatak finansijskih resursa vlasnika zgrada ili neriješeni imovinsko-pravni odnosi. Neke zgrade su oštećene ratom te nisu do danas u potpunosti obnovljene.

Rekonstrukcija stambeno-poslovnih zgrada u staroj jezgri podrazumijeva **uređenje i izradu ovojnica svih zgrada (fasada, kroviste, vanjska stolarija)** u staroj povjesnoj jezgri bez obzira na status vlasništva. Također iza gradske knjižnice nalazi se mali „amfiteatar“ i ispod njega neuređena javna površina. Na tom prostoru su se do sada održavala događanja kulturno-umjetničkog tipa, ali je prostor neadekvatan te iznimno potreban gradu kao prostor za kulturna događanja i manifestacije.

U postojećoj zgradi gradske uprave ostat će dio upravnih odjela, a jedan dio zgrade će se **preurediti u gradsku vijećnicu** (koja se trenutno nalazi u drugom objektu te je nefunkcionalna i nedostupna slabije pokretljivim osobama – 3. kat). Oko postojeće zgrade gradske uprave nalaze se **neuređene javne površine i tržnica** koje će se ovim projektom uređiti. S istočne strane zgrade će se **urediti gradski trg sa fontanom**, klupama za sjedenje, zelenim površinama, nekoliko kamenih banaka za tržnicu i jednim djelomično ukopanim objektom u kojem će se smjestiti jedan poslovni prostor s izrazito turističkom namjenom (suvenirnica, vinoteka i sl.) i javni WC. S južne strane zgrade će se uređiti **parkiralište** za potrebe zgrade gradske uprave. Sa zapadne strane bi se uredile **pješačke staze** sa zelenim površinama u kojem bi se ukomponirala kamera postolja za postavu skulptura, organizaciju kamenoklesarskih i drugih umjetničkih izložbi i radionica čemu bi se pridodata reminiscencija na staru ribarnicu u obliku kamenog banka.

Još jedan element ovog projekta bit će i projekt socijalnog stanovanja u samoj gradskoj jezgri obzirom da bez vlastitog doma nije moguće zasnivanje obitelji a time nema ni osnovnih preduvjeta za zdrav život pojedinca ili obitelji, te time i cijele zajednice. Ovo je pitanje pak usko povezano s razvitkom gospodarstva koje će potaknuti prosperitet u društvu a time i smanjiti pritisak na socijalna davanja. Razvit će se neke nove djelatnosti i potrebe u društvu koje treba zadovoljiti u trenutku kad gospodarstvo dostigne razinu u kojoj potrebe sve više rastu. Sigurnost u stanovanju će doprinijeti većem uključivanju ciljanih skupina u društveni život. Realizacijom stambenog prostora stvorit će se i uvjeti za stanovanje potrebnih stručnih kadrova te na taj način stvoriti uvjeti za zaustavljanje odljeva visokoobrazovanih kadrova. Stanovanje je jedna od osnovnih životnih potreba i Država, a samim tim im JLS imaju odgovornost za stambeno zbrinjavanje stanovništva. Na području Grada Benkovca je uočena potreba za stambeni prostor za stručne osobe koje bi radile ili već rade na području Grada Benkovca (Osnovna i Srednja škola, Ljekarna, javne ustanove, ostala poduzeća i obrti). Isto tako je uočena potreba za stambeno zbrinjavanje osoba slabijeg imovinskog statusa.

Zbog neodržavanja predmetnih zgrada mnogi primjećuju da Benkovac danas izgleda kao da je Domovinski

	<p>rat završio jučer, a ne prije 20 godina. Ukoliko se grad Benkovac želi razvijati kao grad ugodan za život svojih sadašnjih i budućih stanovnika te nastaviti s pozitivnim migracijskim kretanjima stanovništva, a uz to postati privlačan turistima koji u njega dolaze ciljano ili tranzitno na putu ka drugim atraktivnim turističkim destinacijama na Jadranskoj obali, nužno je obnoviti zgrade u staroj gradskoj jezgri grada Benkovca.</p> <p>Podsetimo da je u <i>Programu ukupnog razvoja Grada Benkovca 2012. – 2016.</i>, razvojna vizija grada definirana kao:</p> <p><i>„Benkovac, grad ekonomskog prosperiteta temeljenog na suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji, malom i srednjem poduzetništvu, te posebnoj turističkoj ponudi. Grad žiteljima ugodan za življenje, poduzetnicima prilika za ulaganje, a turistima privlačan za posjećivanje.“</i></p> <p>Bez obnove najuže gradske jezgre, gospodarski razvoj grada kao i ostvarivanje razvojne vizije grada biti će znatno otežano i usporeno.</p> <p>K tome, derutne zgrade u centru grada Benkovca nisu samo estetski neprihvatljive već su i energetski neučinkovite te osim što svojim postojećim korisnicima poslovnih prostora u prizemlju povećava troškove zbog skupih energenata (grijanje ljeti, hlađenje zimi), doprinose zagađenju okoliša zbog upotrebe znatne količine neobnovljivih izvora energije. Većina kuća nije naseljena.</p> <p>Kulturno-povijesna cjelina grada Benkovca u kojoj se stara gradska jezgra nalazi zaštićena je u Registru kulturnih dobara Ministarstva kulture kao Kulturno-povijesna cjelina grada Benkovca (oznaka dobra: Z-4430). Stoga je prilikom promišljanja o obnovi zgrada u staroj gradskoj jezgri potrebno konzultirati konzervatore te ih pravovremeno uključiti u proces izrade dokumentacije i same obnove zgrada kako bi svojim znanjem osigurali kvalitetnu obnovu te kako bi se izbjeglo odgovlačenje u samoj obnovi zbog nesuglasica konzervatora s dokumentacijom ili metodama i načinima obnove. Svakako pri izradi dokumentacije, a kasnije i obnovi, treba promišljati važnost energetske učinkovitosti te planirati korištenje obnovljivih izvora energije i energetski učinkovitih građevinskih materijala pri obnovi zgrada u staroj gradskoj jezgri grada Benkovca.</p> <p>U centru Benkovca na adresi Ulica Kralja Dmitra Zvonimira 2 nalazi se stara crkvena kamera kuća koja je u potpunosti devastirana te se kroz ovaj projekt želi staviti u višestruku funkciju. Planira se u kući napraviti knjižnica, edukativni centar za djecu, prostor za Vijeće srpske nacionalne manjine kao i prostor u kojem će djelovati KUD Prosvjeta.</p> <p>S obzirom da je Planom razvoja turizma destinacije Benkovac iz 2005., turističko središte Grada Benkovca definirano kao jedna od deset turistima atraktivnih cjelina u Gradu, svakako obnovu samog središta grada treba gledati i u tom svjetlu – svjetlu osiguravanja osnovne turističke infrastrukture.</p> <p>Županijska razvojna strategija Zadarske županije 2011.-2013. definira četiri strateška cilja od čega se dva mogu direktno povezati s ovim projektom:</p> <p><b>STRATEŠKI CILJ 3</b></p> <p><i>Prepoznavljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine</i></p> <p><b>STRATEŠKI CILJ 4</b></p>
--	---

	<p><i>Unaprjeđenje zaštite okoliša i kvalitete života</i></p> <p>Prilikom obnove gradske jezgre svih zgrada bit će relevantno provoditi projekte temeljene na energetskoj učinkovitosti što je tema svih strateških dokumenata na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini. Operativni programi, osobito OPKK prepoznaje ju kao iznimno važnu te su osigurana sredstva za energetsku obnovu prvenstveno javnih, ali i privatnih zgrada u RH (Prioritetne osi 4. „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Specifičnog cilja 4c2 „Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama (u više-stambenim zgradama i obiteljskim kućama)).</p> <p>Projekt je i u skladu s Dugoročnom strategijom za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske, s Trećim nacionalnim akcijskim planom energetske učinkovitosti za razdoblje 2014.-2016. i s Programom energetske obnove više-stambenih zgrada za razdoblje 2014.-2010.</p> <p>Projekt je u skladu sa <b>Strateškim programom ukupnog razvoja Grada Benkovca 2012.-2016.</b> te doprinosi ostvarenju sva tri razvojna cilja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uspješno gospodarstvo</li> <li>2. Očuvanje i održivo korištenje resursa</li> <li>3. Visoka kvaliteta usluga stanovništvu</li> </ol> <p>Strateškim planom identificirane su mjere koje treba ostvariti kako bi se doprinijelo ostvarenju strateških ciljeva Plana, a ovaj projekt doprinosi njihovom ostvarenju:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Razvijati vizualni identitet Benkovca i turistički ga promicati na domaćem i stranim emitivnim tržištima</li> <li>2. Podići kvalitetu usluga poduzetnicima</li> <li>3. Ojačati koordinaciju svih službi u lokalnoj zajednici i poboljšati suradnju s građanima</li> <li>4. Čuvati i održivo koristiti kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu</li> <li>5. Poticati korištenje obnovljivih izvora energije i povećati energetsku učinkovitost na području Grada Benkovca</li> <li>6. Osigurati uvjete za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s poteškoćama u razvoju i ranjivih skupina u Gradu Benkovcu (manjina)</li> </ol> <p>Od pet strateških ciljeva koje navodi <b>Plan razvoja turizma destinacije Benkovac</b>, naš projekt doprinosi ostvarenju sljedećeg cilja: stvoriti organizacijske preduvjete za razvoj turizma.</p>
<b>Aktivnosti grupirane po EP:</b>	<p><b>EP 1 Priprema dokumentacije</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Identificirati zgrade koje ulaze u opseg ovog projekta te stvoriti bazu zgrada središnje gradske jezgre s podacima o vlasnicima, kvadraturi, namjeni i stanju zgrade</li> <li>1.2. Identificirati zgrade za socijalno stanovanje i izraditi projektnu dokumentaciju</li> <li>1.3. Definirati dokumentaciju koja se treba izraditi za sve zgrade</li> <li>1.4. Raspisati javne nabave za izradu projektne dokumentacije</li> <li>1.5. Izrada projektne dokumentacije</li> </ol>


	<p>1.6. Izrada elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja za okoliš</p> <p><b>EP 2 Socijalno stanovanje</b></p> <p>2.1. Donošenje Strategije stanovanja na području Grada Benkovca</p> <p>2.2. Definiranje lokacije stanova u gradskoj jezgri u Benkovcu</p> <p>2.3. Izrada natječaja i procesa dodjele stanova</p> <p>2.4. Dodjela stanova</p> <p><b>EP 3 Građevinski radovi</b></p> <p>1.1. Raspisati javnu nabavu za izvođenje građevinskih radova obnove zgrada</p> <p>1.2. Raspisati javne nabave za građevinski nadzor nad radovima obnove zgrada i javne rasvjete</p> <p>1.3. Raspisati javnu nabavu za energetski pregled i certificiranje</p> <p>1.4. Provesti ugovore za izvođenje radova</p> <p>1.5. Provesti građevinskog nadzora nad izvođenjem radova</p> <p>1.6. Provesti energetskog pregleda i certificiranja</p> <p>1.7. Raspisivanje javnog natječaja za opremanje svih obnovljenih zgrada u javnom vlasništvu uključujući socijalne stanove</p> <p>1.8. Provesti ugovore za opremanje objekata</p> <p><b>EP 4 Promidžba i vidljivost</b></p> <p>4.1. Promocija projekta – početna i završna konferencija za tisak, letak, objava vijesti o projektu na postojećim mrežnim stranicama Grada Benkovca te izrada svi popratnih materijala definiranih Uputama za korisnike za razdoblje 2014.-2020.: Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata (Zagreb, svibanj 2015. MRRFEU)</p> <p>4.2. Promotivna kampanja o zaštiti okoliša i energetske učinkovitosti za građane Grada Benkovca</p> <p>4.3. Promotivna kampanja o važnosti kulturne baštine</p> <p><b>EP 5 Upravljanje i administracija</b></p> <p>5.1. Sastanci projektnog tima</p> <p>5.2. Izvještavanje</p> <p>5.3. Financijsko upravljanje projektom</p> <p>5.4. Upravljanje projektnim aktivnostima</p> <p>5.5. Upravljanje postupcima javne nabave</p> <p>5.6. Financijska revizija projekta</p> <p>5.7. Osigurati sustav mjerjenja energetske učinkovitosti kako bi se mogli mjeriti indikatori uspješnosti</p>
<b>Ključni rezultati:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4-5 pročelja/krovova zgrada u staroj gradskoj jezgri uz šetnicu je obnovljeno</li> <li>- Uređene 3 zgrade u vlasništvu Grada</li> <li>- Uređene 2 zgrade sa socijalno stanovanje</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uređen i urbanistički opremljen prostor oko zgrade gradske uprave (trg, parkiralište, tržnica, pješačka staza)</li> <li>- Uređena vanjska pozornica i trg iza knjižnice i Doma kulture</li> <li>- Uređena i opremljena zgrada SKC</li> <li>- Manja potrošnja energenata zbog visoke energetske učinkovitosti zgrada nakon obnove.</li> </ul>
<b>Pokazatelji:</b>	<p><b>Obnovljene ili novo sagradene stambene jedinice: 2</b></p> <p><b>Izgrađena ili obnovljena infrastruktura: 10</b></p>
<b>Upravljanje projektom (opisati tim uključujući zaposlene i nova zapošljavanja):</b>	<p>Projektni tim:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Voditelj/ica projekta – 12 % postojeći</li> <li>2. Koordinator/ica radova – 12% postojeći (dipl. ing. građ.)</li> <li>3. Administrativni referent/ica – 5% postojeći</li> <li>4. Financijsko-računovodstveni referent/ica – 5% postojeći</li> <li>5. Stručnjak/inja za javnu nabavu – 2% postojeći</li> </ol>
<b>Trajanje:</b>	<p>Definiranje lokacije te kupnja novih odnosno prenamjena postojećih zgrada (uključujući socijalno stanovanje) : 3 mjeseca</p> <p>Izrada tehničke dokumentacije za sve zgrade i javni prostor: 1 godina</p> <p>Rekonstrukcija/opremanje: 2 godine</p>
<b>Održivost:</b>	<p>Održivost se očituje u više segmenata:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Socijalno/demografska održivost:</b> zadržavanje postojećeg stanovništva i privlačenje novog u Benkovac</li> <li>2. <b>Financijska i upravljačka održivost:</b> zbog bolje toplinske izolacije trošit će se manje energenata što će smanjiti rashode za energente vlasnicima zgrada (privatnim i javnim). Valja napomenuti da će za upravljanje infrastrukturom i njezino održavanje svake od obnovljenih zgrada dalje brinuti njihovi vlasnici. Za zgrade u vlasništvu Grada Benkovca brinuti će se sam Grad a potrebni izdaci financirati će se proračunskim sredstvima.</li> <li>3. <b>Okolišna održivost:</b> zbog bolje toplinske izolacije trošit će se manje energenata što će smanjiti potrošnju neobnovljivih izvora energije, a time i emisije stakleničkih plinova. Prilikom izrade dokumentacije i planiranja obnove, uzet će se u obzir uvođenje obnovljivih izvora energije što će dodatno osigurati smanjenja potrošnje energenata, a time osigurati okolišnu održivost</li> <li>4. <b>Turistička održivost:</b> obnovom zgrada u centru grada Benkovca osigurati će se privlačan prostor u kojem će se turistima i lokalnom stanovništvu moći pružiti ugostiteljske usluge. Čak i ako u tom dijelu ne budu korištene zgrade za ugostiteljske usluge, moći će se interpretirati obnovljena i turistima privlačna kulturna baština grada Benkovca. Obnovom će se očuvati kulturna baština jer je taj dio grada zaštićen kao kulturno-povijesna cjelina. Crkvena zgrada će se dijelom prenamijeniti u Srpski kulturni centar. Ovisno o programu Centra, dio kulturnog programa može biti zanimljiv i posjetiteljima</li> </ol>

	5. <b>Horizontalna održivost:</b> objekti će biti prilagođeni pristupu osobama sa invaliditetom. Srpska nacionalna manjina će dobiti adekvatan prostor za sastanke Vijeća kao i edukaciju pomlatka i mjesto čuvanja vlastitog kulturnog identiteta																									
<b>Terminski plan provedbe projekta</b>																										
			2017		2018				2019				2020				2021				2022					
	3. kv	4	1	2	3	1	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	
	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
Javna nabava za izradu dokumentacije (faza 2)																										
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (faza 2)																										
Elaborat o procjeni utjecaja na okoliš (faza 1 i 2)																										
Geodetski projekt (faza 2 - socijalno stanovanje)																										
Idejno rješenje (faza 2)																										
Studija izvedivosti (fazno 1 i 2)																										
Glavni projekt (faza 2)																										
Ishođenje građevinske dozvole (faza 2)																										

	Izvedbeni projekt + projekt opremanja (faza 1 i 2)																		
	Izrada projektne dokumentacije: projektni obrasci																		
	Javna nabava za izvođenje građevinske radove (faza 1 i 2)																		
	Javna nabava za građevinski nadzor nad radovima (faza 1 i 2)																		
	Javna nabava za opremanje (faza 1 i 2)																		
	Izrada prijavnog obrasca za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava (faza 1 i 2)																		
	Provjedba ugovora za izvođenje radova i opremanje (faza 1 i 2)																		

	Izrada plana urbane regeneracije stare gradske jezgre (faze 1 i 2)																					
<b>Nazivi skica, fotografija i drugih grafičkih prikaza projektnih ideja</b>																						
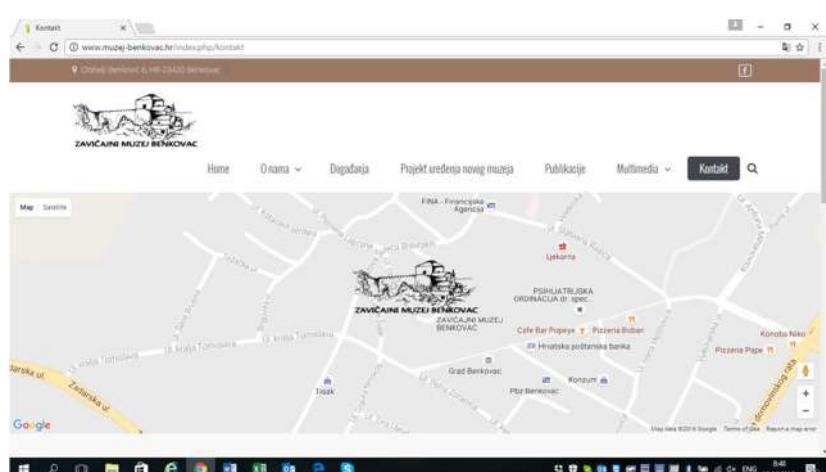
<b>NAZIV PROJEKTA</b>	REVITALIZACIJA I UREĐENJE ZAVIČAJNOG MUZEJA BENKOVAC
<b>Lokacija projekta</b>	<p><a href="https://www.google.hr/maps/place/Ul.+Obitelji+Benkovi%C4%87+6/@44.0338593,15.6082471,17z/data=!4m6!3m5!1s0x4761da5677debe23:0xc37e8fe04ac6c6b!4b1!8m2!3d44.0338593!4d15.6104358?hl=hr">https://www.google.hr/maps/place/Ul.+Obitelji+Benkovi%C4%87+6/@44.0338593,15.6082471,17z/data=!4m6!3m5!1s0x4761da5677debe23:0xc37e8fe04ac6c6b!4b1!8m2!3d44.0338593!4d15.6104358?hl=hr</a></p> 
<b>Vrsta projekta:</b>	Glavni
<b>Razvojni prioritet:</b>	4RP: Os razvoja: Razvoj turističke ponude temeljene na selektivnim oblicima turizma
<b>Opći cilj:</b>	<p><b>1. Prostorni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“ Iskoristiti potencijale prostornog značaja Grada Benkovca kroz očuvanje i održivo korištenje prostornih resursa.</li> </ul> <p><b>2. Društveni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“ Ojačati ulogu Grada Benkovca kao središta društvenog života Ravnih Kotara i Bukovice te povećati životni standard građana.</li> </ul>

	<p><b>3. Gospodarski:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>~ Povećati kapacitete na području Grada Benkovca za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, s naglaskom na poljoprivrednu i ekološku proizvodnju, prerađivačke djelatnosti, trgovinu i održivi turizam.</li> </ul>
<b>Specifični cilj:</b>	<p>Specifični cilj 1: Proširenje Zavičajnog muzeja Grada Benkovca s ciljem zaštite kulturne baštine (zgrade u kojoj se muzej nalazi)</p> <p>Specifični cilj 2: Unapređenje kulturne i turističke ponude u Gradu Benkovcu tijekom cijele godine osiguravanjem ponude (infrastrukturni i sadržajni zahvati) za daljnji razvoj turizma u kontinentalnom dijelu Zadarske županije.</p>
<b>Planska domena:</b>	<b>Kulturno nasljeđe i turizam;</b> društvene djelatnosti, usluge u zajednici, odgoj i obrazovanje
<b>Vrijednost:</b>	<p><b>Trošak pripreme projektne dokumentacije:</b> 500.000,00 kn uključujući PDV</p> <p>Trošak građevinskih radova: 10.500.000,00 kn uključujući PDV</p> <p>Trošak nematerijalnih aktivnosti: 1.500.000,00 kn uključujući PDV</p> <p><b>Ukupna vrijednost projekta: 12.500.000,00 kn uključujući PDV</b></p>
<b>Financiranje:</b>	<p>Specifični cilj 1: EFRR 85%; javna (vlastita) sredstva 15%</p> <p>Specifični cilj 2: ESF 85%; javna (vlastita) sredstva 15%;</p>
<b>Prijavitelj:</b>	Zavičajni muzej Benkovac
<b>Iskustvo prijavitelja za provedbu projekata:</b>	<p>Zavičajni muzej Benkovac do sada je realizirao 10 projekata sufinanciranih iz nacionalnih izvora u vrijednosti od oko 3.000.000,00 kn.</p> <p>Grad Benkovac, koji će na projektu sudjelovati u svojstvu partnera je od 2002. godine do danas sudjelovao, kao prijavitelj ili partner, u provedbi 10 projekata financiranih iz sredstava Europske unije, sa ukupnom vrijednošću većom od 3.500.000,00 eura.</p> <p>Dodatno, Grad Benkovac je od 1997. godine proveo 40 projekata financiranih iz nacionalnih sredstava sa ukupnom vrijednošću većom od 16.000.000,00 eura.</p>
<b>Partneri:</b>	<p>Grad Benkovac</p> <p>TZ Grada Benkovca</p> <p>KUD "Branimir" Benkovac</p>
<b>Ciljane skupine / krajnji korisnici</b>	<p><b>Ciljane skupine:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>~ Zaposlenici muzeja</li> <li>~ Uprava muzeja</li> <li>~ Izlagači</li> </ul> <p><b>Krajnji korisnici:</b></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>“ Turisti i posjetitelji (domaći i strani)</li> <li>“ Lokalno stanovništvo</li> <li>“ Učenici</li> <li>“ Znanstvenici</li> <li>“ Poduzetnici – ugostitelji, hotelijeri, izrađivači suvenira, turističke agencije</li> </ul>
<b>Zrelost projekta:</b>	<p>Tehnička dokumentacija je <b>spremna</b>: idejni, glavni i izvedbeni projekt muzeja.</p> <p><b>U izradi</b> je izvedbeni projekt uređenja Zavičajnog muzeja Benkovac kojim se planira napraviti novi prostorni raspored te građevinski urediti radni prostor. Paralelno se izrađuje muzeološka konцепција i sukladno njoj urediti će se sklop kaštela Benković kao ishodišna točka za upoznavanje prošlosti benkovačkog kraja i mjesto gdje bi se dobile sve informacije za samostalno istraživanje bogatih spomenika kulturno-povijesne baštine.</p>
<b>Investicijski ciklus projekta:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dovršenje projektne dokumentacije – izvedbeni projekt uređenja</li> <li>2. Studija izvedivosti</li> <li>3. Izrada prijavnog obrasca za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava</li> <li>4. Javna nabava za izvođenje građevinskih radova</li> <li>5. Javna nabava za opremanje</li> <li>6. Javna nabava za građevinski nadzor nad izvođenjem radova</li> <li>7. Provedba ugovora za izvođenje radova i opremanje</li> <li>8. Provedba ugovora o građevinskom nadzoru nad izvođenjem radova</li> <li>9. Provedba ugovora o opremanju</li> <li>10. Izrada Plana upravljanja Zavičajnim muzejom</li> <li>11. Izrada komunikacijske strategije</li> <li>12. Izrada vizualnog identiteta Grada Benkovca</li> <li>13. Stavljanje u funkciju: zapošljavanje, edukacija</li> </ol>
<b>Provedbeni mehanizam:</b>	<p>Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga EFRR</p> <p>Izravna dodjela bespovratnih sredstava ESF</p>

<b>Obrazloženje projekta</b>	<p>Na prostoru Grada Benkovca djeluje ustanova Zavičajni muzej Benkovac koji se nalazi u Kaštelu Benković, u zgradu koja je zaštićena pri Ministarstvu kulture kao pojedinačno nepokretno kulturno dobru od nacionalne važnosti iz 15.st. (oznaka dobra: N-27). Srednjovjekovna tvrđava obitelji Benković u kojoj se nalazi muzej smještena je na uzvisini nad gradom. Kaštel je kvadratnog tlocrta s visokom četvrtastom kulom "donžonom" i dvjema manjim kružnim kulama na uglovima. Ravne kortine završavaju na vrhu ophoda zupcima. Uz zid kaštela je s vanjske jugoistočne strane crkva Sv. Ante sa zadnjom pregradnjom iz 1743. godine u baroknom slogu sa zvonikom na preslicu. Na glavnoj kuli iz XV. st. sačuvano je više strelnica.</p> <p>Obnovom Kaštela Benković <b>1977.</b> g. pri Narodnom sveučilištu Benkovac u prostorima samog kaštela započela je s djelovanjem mala zavičajna zbirka koja je nastala zahvaljujući nekolicini entuzijasta koji su svoje kolekcije predali kao temelj za osnivanje Zavičajnog muzeja benkovačkog kraja, što je prvi zapis postojanja muzejske djelatnosti u Benkovcu.</p> <p>Zavičajni muzej Benkovac <b>osnovan je 1983.</b> godine, tada u sastavu Narodnog sveučilišta Benkovac. Muzej se bavio prikupljanjem arheološke, etnološke te kulturno povjesne građe sa šireg benkovačkog područja. Prema podacima koji su sačuvani prije Domovinskog rata muzej je imao bogatu arheološku zbirku sa preko 15.000 predmeta, etnološku zbirku sa oko 150 predmeta, kulturno-povjesnu zbirku, kao i zbirku fotografija, razglednica, te bogatu knjižnicu. Bio je uređen arheološki postav muzeja, djelomično etno postav te se dalje radilo na obradi i prikupljanju građe s brojnih lokaliteta benkovačkog kraja. Djelovanje muzeja, prekinuto Domovinskim ratom 1991.-1995. (kad je nestao dio muzejske građe, a inventarne knjige i dio dokumentacije o građi je potpuno nestao) nastavljeno je 1996. godine u sklopu Arheološkog muzeja iz Zadra. Dio etnografske građe sklonjen je nakon "Oluje" u Zavičajni muzej u Biogradu na Moru, a arheološke građe u Arheološki muzej Zadar. U prosincu 2010. g. nakon dugih 15 godina veliki dio arheološke građe skupa s dokumentacijom vraćen je iz Arheološkog muzeja Zadar, kao i cjelokupna etnografska zbirka koja je vraćena iz Zavičajnog muzeja Biograd.</p> <p><b>Od 2007.</b> godine Zavičajni muzej Benkovac djeluje kao samostalna ustanova čiji je osnivač Grad Benkovac. Sredstva za rad Muzeja osigurava Grad Benkovac u svom proračunu. Djelokrug djelovanja Zavičajnog muzeja Benkovac odnosi se na prostor bivše Općine Benkovac.</p> <p>Kako su ratna stradanja i Zub vremena učinila štetu na građi i djelomično na samom objektu uz potporu Grada Benkovca i Ministarstva kulture Republike Hrvatske, a u suradnji s konzervatorima i Muzejskim dokumentacijskim centrom (MDC), u izradi je izvedbeni projekt uređenja Zavičajnog muzeja Benkovac kojim se planira napraviti novi prostorni raspored, te građevinski urediti radni prostor. Paralelno se izrađuje muzeološka koncepcija i sukladno njoj urediti će se sklop kaštela Benković kao ishodišna točka za upoznavanje prošlosti benkovačkog kraja i mjesto gdje bi se dobile sve informacije za samostalno istraživanje bogatih spomenika kulturno-povjesne baštine.</p> <p>Kako je prostor današnjeg muzeja malen i neadekvatan za obavljanje muzejske djelatnosti krenulo se s projektom <b>revitalizacije i uređenja novog muzeja</b>. Temeljem toga pripremljena je tehnička dokumentacija: idejni, glavni i izvedbeni projekt muzeja. Započeta je I. faza uređenja muzeja vrijedna 1.000.000 kn te kroz ovaj projekt planiramo prijaviti nastavak radova. Ovim projektom dobila bi se ishodišna točka za upoznavanje bogate kulturno povjesne baštine benkovačkog kraja putem <b>11</b></p>
------------------------------	--

	<p><b>izložbenih dvorana, lapidarija, recepcije, unutrašnjeg dvorišta, vanjskog dvorišta za predstave, filmove te multimedijalne dvorane za predavanja, radionice i izložbe.</b></p> <p><b>Muzej u svom sastavu sadrži:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- muzejske zbirke</li> <li>- arheološka zbirka</li> <li>- etnološka zbirka</li> <li>- kulturno – povijesna zbirka</li> <li>- zbirka Domovinskog rata</li> <li>- zbirka kamenih spomenika</li> <li>- dokumentacijsku zbirku</li> <li>- fototeka</li> <li>- muzejsku knjižnicu (dostupna stručnjacima)</li> </ul> <p>Projekt omogućuje turističke posjete muzeju i benkovačkom kraju, edukacija školske djece putem radionica, tečajeva i ljetnih škola. Realizacija projekta pridonijet će <b>razvoju turizma</b> kao važne gospodarske djelatnosti koja će doprinijeti <b>smanjenju broja nezaposlenih, povećanju broja posjetitelja</b> Gradu Benkovcu a time i <b>povećanje prihoda i potrošnje</b> na prostoru Grada. Također, turizam kao gospodarska djelatnost ima multiplikativan učinak te će se kroz povećanje broja posjetitelja osigurati uvjeti za <b>razvoj poduzetništva</b> (hoteljerstvo, ugostiteljstvo, izrada i prodaja suvenira, prodaja hrane od lokalnih OPG-ovaca i sl.). S obzirom da je zgrada u kojoj je smješten muzej zaštićeno kulturno dobro, obnovom ćemo također i očuvati kulturnu baštinu benkovačkog kraja.</p> <p>Realizacijom ovog projekta otvaraju se velike mogućnosti za što bolju prezentaciju kulturno-povijesne baštine benkovačkog kraja.</p> <p>Ovaj projekt se uklapa u <b>Strateški program ukupnog razvoja Grada Benkovca 2012.-2016.</b> kroz 2 mjere:  <b>Čuvati i održivo koristiti kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu</b>  <b>Urediti i dograditi Zavičajni muzej Benkovca</b></p> <p>S obzirom da je Planom razvoja turizma destinacije Benkovac iz 2005., Zavičajni muzej Grada Benkovca definiran kao ishodište itinerera i kao jedan od ključnih projekata, jasno je da je njegova obnova i proširenje ključno u razvoju turizma Grada Benkovca.</p> <p>Plan razvoja navodi da „Svaki itinerer mora imati svoje ishodište te je, u ovom slučaju Kaštel, svojom lokacijom u samom gradu Benkovcu na uzvisini s koje se pruža izvanredan pogled na okolini prostor, idealna lokacija, tim više što je u prošlosti u njemu već funkcionirao zavičajni muzej. Iako danas sama unutrašnjost kaštela, zbog vlage, ograničava funkcioniranje ovog prostora kao zavičajnog muzeja, on se stavlja ovdje u turističku funkciju time što postaje ishodište itinerera. Tu će posjetitelji dobiti informacije o itinereru, a izložbeni dio se može rotirati tako da se ilustriraju određeni dijelovi itinerera i time potaknu posjetitelji na otkrivanje ovog njima gotovo nepoznatog dijela zaleđa sjeverne i srednje Dalmacije. Dakle, ključ je da postavi u izložbenom dijelu budu integrirani s prostorima obuhvaćenim itinererima. Da bi</p>
--	---

	<p>Kaštel funkcionirao kao ishodište obilaska područja destinacije Benkovac potrebno ga je:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“ urediti za muzejsku i turističku funkciju</li> <li>“ osigurati dostupnost Kaštelu – regulirati pješački i automobilski promet</li> <li>“ osigurati parkiralište u gradu te simboličku portu grada</li> <li>“ putokazima usmjeravati posjetitelje prema Kaštelu</li> <li>“ izraditi sustav razgledanja Benkovca s odgovarajućom signalizacijom, interpretacijom te popratnim tiskanim materijalom za samostalno razgledanje</li> </ul> <p><b>Županijska razvojna strategija Zadarske županije 2011.-2013.</b> definira četiri strateška cilja od čega se jedan može direktno povezati s ovim projektom:</p> <p><b>STRATEŠKI CILJ 3: Prepozнатljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine</b></p> <p>Prioritet 3.1. Očuvanje, zaštita i održiva uporaba prirodne i kulturne baštine</p> <p>Mjera 3.1.2. Očuvanje i održivo korištenje kulturno-povijesne baštine</p> <p>Projekt je u skladu sa <b>Strateškim programom ukupnog razvoja Grada Benkovca 2012.-2016.</b> te doprinosi ostvarenju sva tri razvojna cilja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uspješno gospodarstvo</li> <li>2. Očuvanje i održivo korištenje resursa</li> <li>3. Visoka kvaliteta usluga stanovništvu</li> </ol> <p>Ovdje navodimo mjere Strateškog programa čijem rješavanju će dijelom doprinijeti i provedba ovog projekta:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umrežiti benkovačke čimbenike razvoja ruralnog turizma</li> <li>2. Poticati obnovu i razvoj tradicijskih obrta te oblikovanje, proizvodnju i prodaju izvornih suvenira</li> <li>3. Čuvati i održivo koristiti kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu</li> <li>4. Urediti i dograditi Zavičajni muzej Grada Benkovca</li> </ol>
<b>Aktivnosti grupirane po EP:</b>	<p><b>EP 1 Priprema dokumentacije</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Raspisivanje javne nabave za izradu projektne dokumentacije</li> <li>1.2. Izrada projektne dokumentacije za opremanje muzeja</li> <li>1.3. Izrada projektne dokumentacije za uređenje okoliša</li> <li>1.4. Izrada projektne dokumentacije za stalni postav</li> <li>1.5. Izrada studije izvedivosti i ostale potrebne natječajne dokumentacije</li> <li>1.6. Izrada elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš</li> <li>1.7. Izrada plana upravljanja muzejom</li> <li>1.8. Izrada plana upravljanja kulturnom baštinom Grada Benkovca</li> </ol> <p><b>EP 2 Građevinski radovi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Provedba ugovora o izgradnji upravne zgrade (završetak)</li> </ol>


	<p>2.2. Provedba ugovora o izgradnji popratnog objekta</p> <p>2.3. Provedba ugovora o uređenju hortikulture</p> <p>2.4. Provedba ugovora o izgradnji pristupnog puta</p> <p>2.5. Provedba ugovora o građevinskom nadzoru nad izvođenjem radova</p> <p>2.6. Energetski pregled i energetsko certificiranje</p> <p><b>EP 3 Opremanje Zavičajnog muzeja Grada Benkovca</b></p> <p>3.1. Provedba ugovora o opremanje upravne zgrade</p> <p>3.2. Provedba ugovora o uređenju 11 postojećih izložbenih dvorana</p> <p>3.3. Provedba ugovora o opremanju i izradi postava putem multimedijalnih sadržaja i originalnih muzejskih predmeta te interaktivnih panoa, prema izrađenom troškovniku.</p> <p><b>EP 4 Razvoj kulturno turističkih sadržaja i proizvoda</b></p> <p>4.1. Osmišljavanje prototipa autohtonih suvenira</p> <p>4.2. Izrada autohtonih suvenira</p> <p>4.3. Osmišljavanje slikovnica i drugih proizvoda za djecu inspiriranu kulturnom baštinom Grada Benkovca</p> <p>4.4. Izrada dvojezičnog audio vodiča po muzeju te on-line aplikaciju za audio vodič</p> <p>4.5. Izrada interaktivne računalne igre za djecu inspiriranu nekom povjesnom ličnošću</p> <p>4.6. Osmišljavanje manifestacije i kulturnih sadržaja poput tematskih radionica za djecu i odrasle tijekom cijele godine.</p> <p><b>EP 5 Edukacije</b></p> <p>5.1. Edukacija kustosa i ostalih muzejskih zaposlenika/upravitelja</p> <p>5.2. Edukacija lokalnog stanovništva o promociji kulturne baštine i njenoj upotrebi u turističke svrhe</p> <p>5.3. Edukacija turističkih vodiča</p> <p>5.4. Edukacija prijavljivača/ice</p> <p>5.5. Kampanja podizanja svijesti o važnosti kulturne baštine i njenog značaja za razvoj turizma</p> <p><b>EP 6 Promidžba i vidljivost</b></p> <p>6.1. Promocija projekta – početna i završna konferencija za tisk, letak, objava vijesti o projektu na postojećim mrežnim stranicama Grada Benkovca te izrada svi popratnih materijala definiranih Uputama za korisnike za razdoblje 2014.-2020.: Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata (Zagreb, svibanj 2015. MRRFEU)</p> <p>6.2. Izrada i održavanje mrežne stranica muzeja</p> <p>6.3. Promotivna kampanja (radio i TV oglasi, objave u medijima, billboardi i sl.)</p>
--	--

	<p>6.4. Uvezivanje s ostali atrakcijama u Benkovcu i Zadarskoj županiji (leci, ture koje organiziraju turističke agencije, ....)</p> <p><b>EP 7 Upravljanje i administracija</b></p> <p>7.1. Sastanci projektnog tima</p> <p>7.2. Izvještavanje – finansijsko i narativno</p> <p>7.3. Finansijsko upravljanje projektom</p> <p>7.4. Upravljanje javnom nabavom</p> <p>7.4. Finansijska revizija projekta</p> <p>7.5. Osmisliti i izraditi sustav upravljanja posjetiteljima</p>
<b>Ključni rezultati:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obnovljen, funkcionalan i na tržištu kvalitetno pozicioniran Zavičajni muzej Grada Benkovca</li> <li>- Educirano lokalno stanovništvo i sektorski stručnjaci o integriranju kulturne baštine benkovačkog kraja u turističku ponudu</li> </ul>
<b>Pokazatelji:</b>	<p>Izgrađena ili obnovljena infrastruktura: 1</p> <p>Broj aktivnosti podizanja svijesti / javne kampanje: 1</p> <p>Broj sudionika koji imaju posao, uključujući samozaposlene, po prestanku sudjelovanja: 1</p> <p>Stručnjaci koji sudjeluju u osposobljavanju: 3</p> <p>Nezaposleni koji sudjeluju u osposobljavanju: 10</p> <p>Broj novih kulturno-turističkih sadržaja: 3</p>
<b>Upravljanje projektom (opisati tim uključujući zaposlene i nova zapošljavanja):</b>	<p>Projektni tim:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Voditelj/ica projekta: 30%</li> <li>2. Koordinator/ica radova: 30%</li> <li>3. Administrativni referent/ica: 10%</li> <li>4. Finansijsko-računovodstveni referent/ica: 10%</li> <li>5. Stručnjak/inja za javnu nabavu: 5%</li> <li>6. Stručnjak za razvoj kulturno turističkih sadržaja i proizvoda u muzeju: 100%, novozaposleni</li> <li>7. Imenovani tim stručnjaka za izradu mujejske koncepcije</li> </ol>
<b>Trajanje:</b>	<p>Dovršetak izrade dokumentacije: 12 mjeseci</p> <p>Obnova, opremanje i stavljanje u funkciju: 24 mjeseca</p> <p>Edukacija i nematerijalne aktivnosti: 36 mjeseci</p>
<b>Održivost:</b>	<p>Održivost se očituje u više segmenata:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Socijalno/demografska održivost:</b> proširenjem Zavičajnog muzeja, osigurat će se dodatna radna mjesta u samom muzeju, ali i u organizacijama koje će surađivati s muzejom i osmišljavati raznovrsne programe. To će doprinijeti zadržavanju postojećeg stanovništva i privlačenje novog u Grad Benkovac</li> <li>2. <b>Finansijska i upravljačka održivost:</b> novi sadržaji u Zavičajnom muzeju koji će biti ekstenzivno promovirani svim marketinškim alatima (Internet, socijalne mreže, časopisi, sajmovi, leci,</li> </ol>

	<p>bilboardi i sl.) osobito tijekom turističke sezone kada područje Zadarske županije vrvi turistima (MINT, 2015: 10 milijuna i 720 tisuća noćenja) privući će raznovrsne posjetitelje zainteresirane za kulturno-zabavne sadržaje koji će se u njemu nuditi. Dio potrebnih rashoda biti će financiran u budućnosti od povećanih prihoda ali i kroz redovito financiranje Zavičajnog muzeja kroz lokalni, regionalni i nacionalni proračun. Upravljačka struktura muzeja ostati će ista kao i do sada te u okvirima važećeg zakonodavnog okvira.</p> <p>3. <b>Okolišna održivost:</b> element okolišne održivosti biti će uzet u obzir prilikom izrade dokumentacije, ali i poslije tijekom izgradnje/obnove. Primjer: LED rasvjeta, senzorske slavine koje štede vodu, uvođenje OIE poput solarnih panela, kvalitetna stolarija, sustav pametne sobe koji regulira toplinu i sl.</p> <p>4. <b>Turistička održivost:</b> obnovom i proširenjem Zavičajnog muzeja Grada Benkovca osigurat će se veći priljev posjetitelja osobito stranih turista tijekom sezone te školske djece tijekom ostatka godine. Posjetitelji muzeja koristiti će i ostalu turističku infrastrukturu i ponudu (kafiće, smještaj, restorane, suvenirnice, dućane) što će doprinijeti cjelokupnom razvoju. Valja voditi računa da lokalni ugostitelji prezentiraju hranu kupljenu od lokalnih proizvođača kako bi i oni imali direktnu korist od povećanog broja turista, a ne uvoznu hranu.</p>																																																																																																																																				
Terminski plan provedbe projekta	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">2017</th> <th colspan="3">2018</th> <th colspan="4">2019</th> <th colspan="4">2020</th> <th colspan="4">2021</th> <th colspan="4">2022</th> </tr> <tr> <th>3. kv</th> <th>4</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> <tr> <td>Dovršenje projektne dokumentacije – izvedbeni projekt uređenja</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Studija izvedivosti</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Izrada prijavnog obrasca za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Javna nabava za izvođenje</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>		2017		2018			2019				2020				2021				2022				3. kv	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Dovršenje projektne dokumentacije – izvedbeni projekt uređenja																						Studija izvedivosti																						Izrada prijavnog obrasca za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava																						Javna nabava za izvođenje																					
	2017		2018			2019				2020				2021				2022																																																																																																																			
	3. kv	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																																																																																																															
Dovršenje projektne dokumentacije – izvedbeni projekt uređenja																																																																																																																																					
Studija izvedivosti																																																																																																																																					
Izrada prijavnog obrasca za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava																																																																																																																																					
Javna nabava za izvođenje																																																																																																																																					

	građevinskih radova																							
	Javna nabava za opremanje																							
	Javna nabava za izvođenje građevinskog nadzor																							
	Provđenja ugovora za izvođenje radova																							
	Provđenja ugovora o opremanje																							
	Provđenja ugovora o građevinskom nadzoru nad izvođenjem radova																							
	Izrada Plana upravljanja Zavičajnim muzejom																							
	Izrada komunikacijske strategije																							
	Izrada vizualnog identiteta Grada Benkovca																							
	Stavljanje u funkciju: zapošljavanje, ekdukacija																							

Nazivi skica, fotografija i drugih grafičkih prikaza projektnih ideja	
---	--

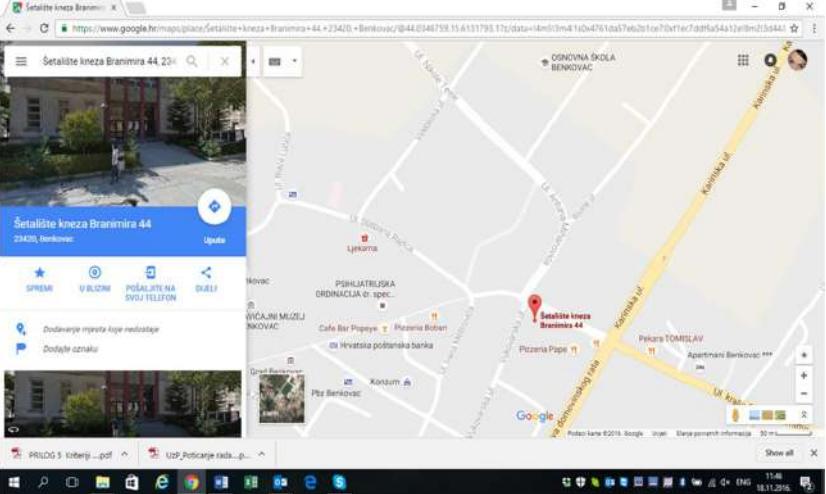NAZIV PROJEKTA	DOM KULTURE BENKOVAC
Lokacija projekta	Šetalište kneza Branimira 44, Benkovac  
Vrsta projekta:	Komplementarni
Razvojni prioritet:	1RP: Os razvoja: Razvoj Benkovca kao centra društvenog života Ravnih Kotara i Bukovice
Opći cilj:	<p>1. Prostorni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“ Iskoristiti potencijale prostornog značaja Grada Benkovca kroz očuvanje i održivo korištenje prostornih resursa.</li> </ul> <p>2. Društveni:</p>

	“ Ojačati ulogu Grada Benkovca kao središta društvenog života Ravnih Kotara i Bukovice te povećati životni standard građana.
<b>Specifični cilj:</b>	Osiguravanje kvalitetnog društvenog života svih stanovnika kroz obnovu i stavljanje u funkciju Doma kulture Benkovac te osmišljavanje raznovrsnih programa i sadržaja koji će se u njemu odvijati.
<b>Planska domena:</b>	<b>Društvene djelatnosti, usluge u zajednici, odgoj i obrazovanje;</b> kulturno nasljeđe i turizam
<b>Vrijednost:</b>	<p><b>Trošak pripreme projektne dokumentacije:</b> 200.000,00 kn uključujući PDV</p> <p>Trošak građevinskih radova: 33.750.000,00 uključujući PDV</p> <p>Trošak nematerijalnih aktivnosti: 1.500.000, 00 kn uključujući PDV</p> <p><b>Ukupna vrijednost projekta: 35.450.000,00 kn uključujući PDV</b></p>
<b>Financiranje:</b>	EFRR 85%, Javna vlastita sredstva 15%
	ESF 85%, Javna vlastita sredstva 15%
<b>Prijavitelj:</b>	Grad Benkovac
<b>Iskustvo prijavitelja za provedbu projekata:</b>	Grad Benkovac je od 2002. godine do danas sudjelovao, kao prijavitelj ili partner, u provedbi 10 projekata financiranih iz sredstava Europske unije, sa ukupnom vrijednosti većom od 3.500.000,00 eura. Dodatno, Grad Benkovac je od 1997. Godine proveo 40 projekata financiranih iz nacionalnih sredstava sa ukupnom vrijednošću većom od 16.000.000,00 eura.
<b>Partneri:</b>	<p><b>Partneri:</b></p> <p>Radio Benkovac</p> <p>Savjet mlađih Grada Benkovca</p> <p>Udruge koje djeluju u području kulture i edukacije (KUD-ovi, klape, dramske skupine )</p> <p><b>Suradnici:</b> Gradska knjižnica Benkovac, OŠ i SŠ u Benkovcu, TZ Grada Benkovca</p>
<b>Ciljane skupine / krajnji korisnici</b>	<p><b>Ciljane skupine:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“ Budući „stanari“ Doma kulture (korisnici prostora kao što su udruge, radio, itd.)</li> <li>“ Udruge van Doma kulture</li> </ul> <p><b>Krajnji korisnici:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“ Stanovnici Grada Benkovca</li> <li>“ Učenici OŠ i SŠ</li> <li>“ Stanovnici-posjetitelji sa područja susjednih JLS-a</li> <li>“ Posjetitelji i turisti</li> </ul>
<b>Zrelost projekta:</b>	Tehnička dokumentacija je izrađena.

	<p>Od trenutka kada RH prenese vlasništvo nad zgradom doma, biti će ispunjeni uvjeti za izdavanje Potvrde glavnog projekta nakon čega će se moći pokrenuti aktivnosti na provedbi projekta.</p>
<b>Investicijski ciklus projekta:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rješavanje imovinsko-pravnih pitanja (prijenos vlasništva)</li> <li>2. Studija izvedivosti</li> <li>3. Elaborat o procjeni utjecaja na okoliš</li> <li>4. Potvrda glavnog projekta</li> <li>5. Izrada prijavnog obrasca za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava</li> <li>6. Javna nabava za izvođenje građevinskih radova i opremanje</li> <li>7. Javna nabava za građevinski nadzor nad izvođenjem radova</li> <li>8. Provedba ugovora o izvođenju radova obnova zgrade i uređenja okoliša</li> <li>9. Provedba ugovora o opremanju zgrade</li> <li>10. Sadržajna komponenta: osmišljavanje programa i sadržaja koji će se odvijati u Domu kulture uz promotivne aktivnosti</li> <li>11. Izrada Plana upravljanja Domom kulture</li> <li>12. Osnivanje Pučkog otvorenog učilišta kao budućeg Upravitelja Domom kulture</li> <li>13. Edukacija i zapošljavanje</li> </ol>
<b>Provedbeni mehanizam:</b>	<p>Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga EFRR</p> <p>Izravna dodjela bespovratnih sredstava ESF</p>
<b>Obrazloženje projekta</b>	<p>Dom kulture Benkovac u lošem je stanju te je nužna kompletna obnova zgrade. Osim infrastrukturne komponente, ovaj projekt sadrži i komponentu koja se tiče ponovnog stavljanja u funkciju Doma kulture odnosno osmišljavanja programa i sadržaja edukativno-zabavnog karaktera koji će biti zanimljivi svim generacijama. Programe će provoditi partneri na projektu od kojih će dio biti smješten u prostorijama Doma kulture.</p> <p>Projekt je u skladu sa <b>Strateškim programom ukupnog razvoja Grada Benkovca 2012.-2016.</b> te doprinosi ostvarenju sva tri razvojna cilja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uspješno gospodarstvo</li> <li>2. Očuvanje i održivo korištenje resursa</li> <li>3. Visoka kvaliteta usluga stanovništvu</li> </ol> <p>Strateški program kao zasebnu razvojnu mjeru definira rekonstrukciju i opremanje Dom kulture u Benkovcu.</p>
<b>Aktivnosti grupirane po EP:</b>	<p><b>EP 0 Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa</b></p> <p><b>EP 1 Infrastrukturna komponenta</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Raspisivanje javne nabave za izvođenje građevinskih radova i opremanje</li> <li>1.2. Raspisivanje javne nabave za građevinski nadzor nad izvođenjem radova</li> <li>1.3. Provedba ugovora za izvođenje radova (zgrada i okoliš)</li> </ol>

	<p>1.4. Provedba ugovora o nadzoru nad izvođenjem radova</p> <p>1.5. Provedba ugovora o opremanju objekta</p> <p><b>EP 2 Sadržaji i programi</b></p> <p>2.1. Osnivanje Pučkog otvorenog učilišta</p> <p>2.2. Osmišljavanje novih programa i kupnja potrebne opreme za programe</p> <p>2.3. Provedba novih i starih (unaprijeđenih) programa</p> <p>2.4. Umrežavanje s europskim kulturnim inicijativama/kultурне razmjene</p> <p><b>EP 3 Promidžba i vidljivost</b></p> <p>3.1.Promocija Promocija projekta – početna i završna konferencija za tisak, letak, objava vijesti o projektu na postojećim mrežnim stranicama Grada Benkovca te izrada svi popratnih materijala definiranih Uputama za korisnike za razdoblje 2014.-2020.: Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata (Zagreb, svibanj 2015. MRRFEU)</p> <p>3.2.Promocija Doma kulture i novih sadržaja – izrada komunikacijske strategije</p> <p><b>EP 4 Upravljanje i administracija</b></p> <p>4.1.Sastanci projektnog tima</p> <p>4.2.Izvještavanje</p> <p>4.3.Finansijsko upravljanje projektom</p> <p>4.4. Upravljanje aktivnostima</p> <p>4.5. Upravljanje procesima javne nabave</p> <p>4.6.Finansijska revizija projekta</p> <p>4.7.Vanjska evaluacija projekta</p>
<b>Ključni rezultati:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dom kulture Benkovac je obnovljen i opremljen te stavljen u funkciju</li> <li>- Domom kulture upravlja novoosnovano Pučko otvoreno učilište</li> <li>- Manja potrošnja energije zbog obnovljene zgrade Doma kulture</li> <li>- Osigurani infrastrukturni uvjeti za bavljenje društvenim i kulturnim sadržajima lokalnog stanovništva te prostor za organizacije civilnog društva i slične aktivnosti ustanova</li> <li>- Osmišljeni novi programi Doma kulture u funkciji</li> </ul>
<b>Pokazatelji:</b>	<p><b>Izgrađena ili obnovljena infrastruktura : 1</b></p> <p><b>Sudionici koji imaju posao, uključujući samozaposlene, po prestanku sudjelovanja: 3</b></p> <p><b>Stručnjaci koji sudjeluju u osposobljavanju: 1</b></p> <p><b>Nezaposleni koji sudjeluju u programima osposobljavanja: 10</b></p>

<b>Upravljanje projektom (opisati tim uključujući zaposlene i nova zapošljavanja):</b>	<p>Projektni tim:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Voditelj/ica projekta: 13%</li> <li>2. Koordinator/ica radova: 25%</li> <li>3. Administrativni referent/ica: 10%</li> <li>4. Financijsko-računovodstveni referent/ica: 10%</li> <li>5. Stručnjak/inja za javnu nabavu: 1,5%</li> </ol> <p>Novo zapošljavanje od kraja 2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upravitelj/ravnatelj Doma kulture (ravnatelj POU): 100%</li> <li>2. Stručnjak za marketing i operativno poslovanje Doma kulture: 100%</li> <li>3. Stručnjak za kulturno turističke sadržaje i proizvode 40% novozaposleni (ostatak od 60% raspoređeno je po drugim projektima sa relevantnim sadržajem)</li> </ol>
<b>Trajanje:</b>	<p><b>Izgradnje/rekonstrukcija/opremanje:</b> 15 mjeseci</p> <p><b>Osmišljavanje sadržaja:</b> 3 – 6 mjeseci (može se odvijati paralelno s obnovom i opremanjem)</p> <p>Edukacije u okviru razvoja novih programa</p>
<b>Održivost:</b>	<p>Održivost se očituje u više segmenata:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Socijalno/demografska održivost:</b> zadržavanje postojećeg stanovništva i privlačenje novog u Benkovac zbog boljih uvjeta kulturno-zabavnih sadržaja za sve generacije i života općenito. S druge strane, Dom kulture moći će u budućnosti zapošljavati mlade kreativne ljudi te će njima i njihovim obiteljima osigurati egzistenciju u Benkovcu.</li> <li>2. <b>Finacijska i upravljačka održivost:</b> projekt obnove Doma kulture će biti samoodrživ. U večernjim satima će se odvijati kulturno-zabavni programi koji će naplaćivati (primjerice kino) te će zaposliti određeni broj mladih kreativaca kojima će se osigurati plaća/egzistencija. Nadalje osnivanjem Pučkog otvorenog učilišta koje će upravljati domom u ime Grada Benkovca, kaoosnivača i vlasnika, te kreirati dodatne sadržaje i razvojne planove osigurati će se unapređenje osnovnih programa utemeljenim ovim IP-om ali i otvaranje novih radnih mesta.</li> <li>3. <b>Okolišna održivost:</b> zbog bolje toplinske izolacije trošit će se manje energenata što će smanjiti potrošnju neobnovljivih izvora energije, a time i emisije stakleničkih plinova.</li> <li>4. <b>Turistička održivost:</b> kulturno-zabavne sadržaje će moći konzumirati i posjetitelji. Ljeti, kada je veći dotok turista, će se organizirati komercijalni sadržaji u dvorištu Doma kulture koji će biti namijenjeni posjetiteljima kroz koje će se prezentirati benkovački običaji, gastro i eno scena kao i muzički izričaj dalmatinskog kraja.</li> </ol>

		k v																	
Studija izvedivosti																			
Elaborat o procjeni utjecaja na okoliš																			
Ishodovanje građevinske dozvole (tehnička dokumentacija je spremna)																			
Izrada prijavnog obrasca za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava																			
Javna nabava za izvođenje građevinskih radova i opremanje																			
Javna nabava za građevinski nadzor nad izvođenjem radova																			
Provjeda ugovora o obnova zgrade i uređenje okoliša																			
Provjeda ugovora o opremanju zgrade																			

	Sadržajna komponenta: osmišljavanje programa i sadržaja koji će se odvijati u Domu kulture uz promocija																												
	Izrada Plana upravljanja Domom kulture																												
	Zapošljavanje i edukacija																												
<b>Nazivi skica, fotografija i drugih grafičkih prikaza projektnih ideja</b>																													

NAZIV PROJEKTA	REKONSTRUKCIJA I SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA
Lokacija projekta	<p><b>Identificirane ceste za koje je potrebna rekonstrukcija:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekonstrukcija ulice Antuna Mihanovića – nerazvrstana cesta</li> <li>2. Rekonstrukcija ul. Don Mate Klarica, Knezova Šubića Bribirskih, S. Radića i dijela Šetališta kneza Branimira - županijska cesta L 63125</li> <li>3. Rekonstrukcija Ulice kralja Dmitra Zvonimira -županijska cesta L 63125</li> <li>4. Rekonstrukcija ulice Tina Ujevića i dijela Grgura Ninskog - nerazvrstane ceste</li> <li>5. Cesta Miranje – kamenolom Somar u dužini od 3000 m – nerazvrstana cesta</li> <li>6. Rekonstrukcija Velebitske ulice – trenutno je bijeli put – nerazvrstana cesta</li> </ol> <p><b>Identificirane nove ceste:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cesta do Vukšićke gradine u dužini od 750 metara</li> <li>2. Cesta koja će povezivati naselje Korlat do Korlatskih vinograda i spoja na državnu cestu D 27 u približnoj dužini 4.000 metara – trenutno poljski put</li> <li>3. Cesta kroz Korlat koja će povezivati sve dijelove Korlata u dužini od 4. 100 metara</li> <li>4. Cesta do Nadinske gradine u dužini od 500 m</li> </ol>
Vrsta projekta:	Komplementarni

<b>Razvojni prioritet:</b>	<b>1RP: Os razvoja: Razvoj Benkovca kao centra društvenog života Ravnih Kotara i Bukovice</b>
<b>Opći cilj:</b>	<p><b>1. Prostorni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“ Iskoristiti potencijale prostornog značaja Grada Benkovca kroz očuvanje i održivo korištenje prostornih resursa.</li> </ul> <p><b>2. Društveni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“ Ojačati ulogu Grada Benkovca kao središta društvenog života Ravnih Kotara i Bukovice te povećati životni standard građana.</li> </ul> <p><b>3. Gospodarski:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Povećati kapacitete na području Grada Benkovca za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, s naglaskom na poljoprivrednu i ekološku proizvodnju, prerađivačke djelatnosti, trgovinu i održivi turizam.</li> </ul>
<b>Specifični cilj:</b>	Izgradnja lokalnih cesta u Gradu Benkovcu u svrhu podizanja kvalitete života, stvaranja preduvjeta za gospodarski razvoj i razvoj turizma.
<b>Planska domena:</b>	<b>Mobilnost, promet i stanovanje;</b> okoliš krajolik i upravljanje prirodnim resursima, poljoprivreda i ruralni razvoj
<b>Vrijednost:</b>	<p><b>Trošak pripreme projektne dokumentacije:</b> 437.500,00 kn uključujući PDV</p> <p>Trošak građevinskih radova: 25.000.000,00 uključujući PDV</p> <p><b>Ukupna vrijednost projekta: 25.437.500,00 kn uključujući PDV</b></p>
<b>Financiranje:</b>	<p>EFRR 85%</p> <p>Javna (vlastita) sredstva 15%</p>
<b>Prijavitelj:</b>	Grad Benkovac
<b>Iskustvo prijavitelja za provedbu projekata:</b>	<p>Grad Benkovac je od 2002. godine do danas sudjelovao, kao prijavitelj ili partner, u provedbi 10 projekata financiranih iz sredstava Europske unije, sa ukupnom vrijednosti većom od 3.500.000,00 eura.</p> <p>Dodatno, Grad Benkovac je od 1997. godine proveo 40 projekata financiranih iz nacionalnih sredstava sa ukupnom vrijednošću većom od 16.000.000,00 eura.</p>
<b>Partneri:</b>	<p>TZ (za označavanje turističke infrastrukture putokazima uz cestu)</p> <p>Komunalno poduzeće Benković d.o.o.</p>
<b>Ciljane skupine / krajnji korisnici</b>	<p><b>Ciljane skupine:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“ Stanovnici naselja Benkovac, Miranje, Korlat, Nadin i Vukšić</li> </ul> <p><b>Krajnji korisnici:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“ Stanovnici Grada Benkovca</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>“ Turisti i posjetitelji</li> <li>“ Lokalni poduzetnici</li> <li>“ Obrtnici</li> <li>“ OPG</li> <li>“ Poljoprivrednici</li> </ul>
<b>Zrelost projekta:</b>	<p>Projektna ideja;</p> <p>za izradu tehničke dokumentacije potrebno je više od 6 mjeseci</p> <p><b>Faza 1 (naselja Benkovac i Miranje)</b></p> <p><b>Rekonstrukcija ulice Antuna Mihanovića - nerazvrstana cesta</b></p> <p>Završiti postupak upisa nerazvrstane ceste,</p> <p>Završiti izradu glavnog projekta - skupiti potvrde glavnog projekta</p> <p>Ishoditi građevinsku dozvolu</p> <p><b>Rekonstrukcija ul. Don Mate Klarića, Knezova Šubića Bribirskih, S. Radića i dijela Šetališta kneza Branimira - županijska cesta L 63125</b></p> <p>Završiti izradu glavnog projekta – ishoditi potvrde glavnog projekta</p> <p>Završiti postupak upisa cesta</p> <p>Ishoditi suglasnost vlasnika Županijske uprave za ceste</p> <p>Ishoditi građevinsku dozvolu</p> <p><b>Rekonstrukcija Ulice kralja Zvonimira -županijska cesta L 63125</b></p> <p>Završiti izradu glavnog projekta – ishoditi potvrde glavnog projekta</p> <p>Završiti postupak upisa cesta</p> <p>Ishoditi suglasnost vlasnika Županijske uprave za ceste</p> <p>Ishoditi građevinsku dozvolu</p> <p><b>Rekonstrukcija ulice Tina Ujevića i dijela Grgura Ninskog - nerazvrstane ceste</b></p> <p><b>Rekonstrukcija Velebitske ulice – trenutno je bijeli put – nerazvrstana cesta</b></p> <p>Završiti postupak provedbe parcelacijskog elaborata,</p> <p>izrađen glavni projekta-skupiti potvrde glavnog projekta</p> <p>Ishoditi građevinsku dozvolu</p> <p><b>Cesta Miranje – kamenolom Somar u dužini od 3000 m – nerazvrstana cesta</b></p>

	<p>Naručiti izradu projektne dokumentacije i geodetskog projekta radi rekonstrukcije postojeće nerazvrstane ceste</p> <p>Izvršiti upis ceste u skladu sa Zakonom o cestama</p> <p>Ishoditi posebne uvjete javnopravnih tijela</p> <p>Ishoditi potvrde glavnih projekta</p> <p>Ishoditi građevinsku dozvolu</p> <p><b>Faza 2 (naselja Korlat, Nadin i Vukšić)</b></p> <p><b>Cesta koja će povezivati naselje Korlat do Korlatskih vinograda i spoja na državnu cestu D 27 u približnoj dužini 4.000 metara – trenutno poljski put</b></p> <p>Naručiti izradu projektne dokumentacije i geodetskog projekta radi formiranja nove građevinske parcele za cestu</p> <p>Riješiti imovinskopravne odnosa sa RH</p> <p>Ishoditi posebne uvjete javnopravnih tijela</p> <p>Ishoditi potvrde glavnih projekta</p> <p>Ishoditi građevinsku dozvolu</p> <p><b>Cesta kroz Korlat koja će povezivati sve dijelove Korlata u dužini od 4 100 metara</b></p> <p>Naručiti izradu projektne dokumentacije i geodetskog projekta radi formiranja nove građevinske parcele za cestu</p> <p>Riješiti imovinskopravne odnosa sa RH i privatnim vlasnicima</p> <p>Ishoditi posebne uvjete javnopravnih tijela</p> <p>Ishoditi potvrde glavnih projekta</p> <p>Ishoditi građevinsku dozvolu</p> <p><b>Cesta do Nadinske gradine u dužini od 500 m</b></p> <p>Naručiti izradu projektne dokumentacije i geodetskog projekta radi formiranja nove građevinske parcele za cestu</p> <p>Riješiti imovinskopravne odnosa sa RH</p> <p>Ishoditi posebne uvjete javnopravnih tijela</p> <p>Ishoditi potvrde glavnih projekta</p> <p>Ishoditi građevinsku dozvolu</p>
--	--

	<p><b>Cesta do Vukšićke gradine u dužini od 750 m</b></p> <p>Naručiti izradu projektne dokumentacije i geodetskog projekta radi formiranja nove građevinske parcele za cestu</p> <p>Riješiti imovinskopravne odnosa sa RH</p> <p>Ishoditi posebne uvjete javnopravnih tijela</p> <p>Ishoditi potvrde glavnih projekta</p> <p>Ishoditi građevinsku dozvolu</p>
<b>Investicijski ciklus projekta:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Idejno rješenje</li> <li>2. Rješavanje imovinsko pravnih odnosa</li> <li>3. Elaborat o procjeni utjecaja na okoliš</li> <li>4. Geodetski projekt</li> <li>5. Idejni projekt<sup>7</sup></li> <li>6. Ishođenje lokacijske dozvole</li> <li>7. Studija izvedivosti</li> <li>8. Glavni projekt</li> <li>9. Ishođenje građevinske dozvole</li> <li>10. Izrada prijavnog obrasca za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava</li> <li>11. Izvedbeni projekt</li> <li>12. Javna nabava za građevinske radove</li> <li>13. Javna nabava za građevinski nadzor nad građevinskim radovima</li> <li>14. Provedba ugovora o izvođenju radova</li> <li>15. Tehnički pregled</li> <li>16. Uporabna dozvola</li> </ol>
<b>Provedbeni mehanizam:</b>	Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga EFRR
<b>Obrazloženje projekta</b>	<p>Lokalne ceste Grada Benkovca su u lošem stanju, a dio potrebnih prometnih poveznica niti ne postoji u obliku ceste. Za kvalitetan život lokalnog stanovništva i poljoprivrednika te razvoj turizma, nužno je rekonstruirati dio postojećih i izgraditi nove ceste na identificiranim lokacijama.</p> <p>Opseg ovog projekta obuhvaća:</p> <p><b>Rekonstrukciju:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ulice Antuna Mihanovića – nerazvrstana cesta</li> <li>2. Ulice Don Mate Klarića, Knezova Šubića Bibirskih, S. Radića i dijela Šetališta kneza Branimira - županijska cesta L 63125</li> </ol>

<sup>7</sup> Ishođenje lokacijske dozvole ukoliko se ne riješe imovinsko pravni odnosi.

	<p>3. Ulice kralja Dmitra Zvonimira -županijska cesta L 63125</p> <p>4. Ulice Tina Ujevića i dijela Grgura Ninskog - nerazvrstane ceste</p> <p>5. Velebitske ulice – trenutno je bijeli put – nerazvrstana cesta</p> <p>6. Ceste Miranje – kamenolom Somar u dužini od 3000 m – nerazvrstana cesta</p> <p><b>Izgradnju nove ceste:</b></p> <p>1. Ceste koja će povezivati naselje Korlat do Korlatskih vinograda i spoja na državnu cestu D 27 u približnoj dužini 4.000 metara – trenutno poljski put</p> <p>2. Ceste kroz Korlat koja će povezivati sve dijelove Korlata u dužini od 4 100 metara</p> <p>3. Ceste do Nadinske gradine u dužini od 500 m</p> <p>4. Cesta do Vučićke gradine u dužini od 750 metara</p> <p>Projekt je u skladu sa <b>Strateškim programom ukupnog razvoja Grada Benkovca 2012.-2016.</b> te doprinosi ostvarenju sva tri razvojna cilja:</p> <p>1. Uspješno gospodarstvo</p> <p>2. Očuvanje i održivo korištenje resursa</p> <p>3. Visoka kvaliteta usluga stanovništvu</p> <p>Kroz citirani strateški dokument kreirane su mjere koje će doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva. Sljedeća mjere odnosi se na ovaj projekt:</p> <p>1. Poticati razvoj cestovne infrastrukture na području Grada Benkovca</p>
<b>Aktivnosti grupirane po EP:</b>	<p><b>EP 1 Priprema dokumentacije</b></p> <p>1.1. Raspisivanje javne nabave za izradu projektne dokumentacije</p> <p>1.2. Izrada projektnu dokumentaciju uključujući studiju izvedivosti</p> <p>1.3. Izrada elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja za okoliš</p> <p><b>EP 2 Građevinski radovi</b></p> <p>2.1. Raspisivanje javne nabave za izvođenje radova</p> <p>2.2. Raspisivanje javne nabave za građevinski nadzor nad građevinskim radovima</p> <p>2.3. Provedba ugovora za izvođenje radova</p> <p>2.4. Provedba ugovora o građevinskom nadzoru nad izvođenjem radova</p> <p>2.5. Označavanje putokazima i smeđa/turistička signalizacija</p> <p><b>EP 3 Promidžba i vidljivost</b></p>

	<p>3.1. Promocija projekta – početna i završna konferencija za tisak, letak, objava vijesti o projektu na postojećim mrežnim stranicama Grada Benkovca te izrada svi popratnih materijala definiranih Uputama za korisnike za razdoblje 2014.-2020.: Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata (Zagreb, svibanj 2015. MRRFEU)</p> <p><b>EP 4 Upravljanje i administracija</b></p> <p>4.1. Sastanci projektnog tima 4.2. Izvještavanje 4.3. Financijsko upravljanje projektom 4.4. Upravljanje aktivnostima 4.5. Upravljanje procesom javne nabave 4.5. Financijska revizija projekta</p>
<b>Ključni rezultati:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Podignuta razina kvalitete i dostupnost komunalne infrastrukture</li> <li>- Izgrađena, rekonstruirana i stavljena u funkciju komunalna infrastruktura</li> <li>- Potaknut razvoj postojećih i novih poljoprivrednih proizvođača</li> <li>- Potaknut razvoj dodatnih turističkih sadržaja ruralnog turizma</li> </ul>
<b>Pokazatelji:</b>	<p><b>Rekonstruirano 10 km postojećih cesta</b></p> <p><b>izgrađeno 9 km novih cesta u Gradu Benkovcu</b></p>
<b>Upravljanje projektom (opisati tim uključujući zaposlene i nova zapošljavanja):</b>	<p>Projektni tim:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Voditelj/ica projekta: 12%</li> <li>2. Koordinator/ica radova: 25%</li> <li>3. Administrativni referent/ica: 6%</li> <li>4. Financijsko-računovodstveni referent/ica: 6%</li> <li>5. Stručnjak/inja za javnu nabavu: 2%</li> </ol>
<b>Trajanje:</b>	<p>Izrada potrebne tehničke dokumentacije: 12 mjeseci</p> <p>Obnova: 24 mjeseca (ovisno o kilometraži)</p>
<b>Održivost:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Socijalno/demografska održivost:</b> zadržavanje postojećeg stanovništva i privlačenje novog u Benkovac zbog boljih prometnih i infrastrukturnih uvjeta uvjeta.</li> <li>2. <b>Financijska i upravljačka održivost:</b> obnovljena i novoizgrađena infrastruktura ostaje na upravljanju i održavanju Gradu Benkovcu.</li> <li>3. <b>Okolišna održivost:</b> prilikom izrade tehničke dokumentacije, u projektnom zadatku će se jasno naglasiti da se treba voditi briga o utjecaju na okoliš te o svim relevantnim elementima vezanim uz utjecaj na okoliš. Tijekom radova zahvati će biti provedeni na način da su u potpunosti u suglasnosti sa, tada važećim, relevantnim zakonskim okvirom vezanim uz utjecaj na okoliš.</li> <li>4. <b>Turistička održivost:</b> rekonstruirana i izgrađena prometna infrastruktura primarno će služiti lokalnom stanovništvu 365 dana godišnje. Ubrzat će se promet ljudi i dobara što će ubrzati</li> </ol>

	gospodarske tijekove i kvalitetu života stanovnika. Dok će tijekom ljetnih mjeseci pojačani promet uzrokovat dolaskom turista biti neometan zbog kvalitetne prometne infrastrukture koja će omogućiti dolazak do svih turističkih atrakcija uz dobru turističku signalizaciju (putokaze).																			
Terminski plan provedbe projekta		2017		2018				2019				2020				2021				
		3. k v	4. k v	1. k v	2. k v	3. k v	4. k v													
	Idejno rješenje																			
	Rješavanje imovinskog pravnih odnosa																			
	Elaborato procjeni utjecaja na okoliš																			
	Geodetski projekt																			
	Idejni projekt																			
	Studija izvedivosti																			
	Glavni projekt																			
	Izvedbeni projekt																			
	Ishođenje građevinskih																			

	dozvola za fazu 2																			
	Izrada prijavnog obrasca za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava																			
	JN za izvođenje građevinskih radova																			
	JN za građ. nadzor nad izvođenjem radova																			
	Provjeda ugovora za izvođenje radova																			
	Tehnički pregled																			
	Uporabna dozvola																			
Nazivi skica, fotografija i drugih grafičkih prikaza projektnih ideja																				

<b>NAZIV PROJEKTA</b>	<b>RAZVOJ TEMATSKIH RUTA STARIH ANTIČKIH I SREDNJOVJEKOVNIH GRADOVA NA PROSTORU GRADA BENKOVCA – OD MORA DO VELEBITA PREKO RAVNIH KOTARA I BUKOVICE</b>
<b>Lokacija projekta</b>	<p>Grad Benkovac</p> <p>Preduvjet projekta je izrada <b>koncepciskog rješenja točno utvrđenih lokaliteta, rasporeda, dužine, izgleda i svrhe tematskih ruta</b> namijenjenih međusobnom povezivanju važnih lokaliteta te priklučivanje ruta rutama Zadarske županije.</p> <p>Tematske ture će svojim dijelom biti i dodatno ili iznova uređene staze (biciklističke i pješačke) do određenih detektiranih lokaliteta i onih koji će tek to biti tijekom izrade ove studije. Projekt će kroz ovo dodatno urediti 4 postojeće biciklističke staze: <i>Via Magna, U potrazi za srednjovjekovnim utvrdama, Kanjonom rijeke Karišnice i Tragom benkovačkih miljokaza</i>. Kroz pripremu projektne dokumentacije na karti će se ucrtati <b>sve biciklističke/trekking staze te sva pojedina odredišta poput vidikovaca, bunara, muzeja i slično</b> koja će postati sastavni dio turističke ponude Grada Benkovca kako bi se dobila jedinstvena mreža tematskih ruta/staza.</p> <p>Bunari kao izrazito važno graditeljsko naslijeđe bit će dio odabranih lokaliteta za uređenje i ucrtavanje na mapi tematskih tura a kroz pripremu konceptualne studije (idejnog rješenja) odabrat će se oni bunari koji su najpovoljniji za pristup.</p>
<b>Vrsta projekta:</b>	Glavni
<b>Razvojni prioritet:</b>	<b>4RP: Os razvoja - Razvoj turističke ponude temeljene na selektivnim oblicima turizma</b>
<b>Opći cilj:</b>	<p><b>1. Prostorni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“ Iskoristiti potencijale prostornog značaja Grada Benkovca kroz očuvanje i održivo korištenje prostornih resursa.</li> </ul> <p><b>2. Društveni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“ Ojačati ulogu Grada Benkovca kao središta društvenog života Ravnih Kotara i Bukovice te povećati životni standard građana.</li> </ul> <p><b>3. Gospodarski:</b></p> <p>Povećati kapacitete na području Grada Benkovca za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, s naglaskom na poljoprivrednu i ekološku proizvodnju, prerađivačke djelatnosti, trgovinu i održivi turizam.</p>
<b>Specifični cilj:</b>	Potaknuti razvoj turizma kroz obnovu, valorizaciju, prezentaciju i interpretaciju kulturne baštine na putu od mora do Velebita kroz Ravne Kotare i Bukovicu te razvoj mreže biciklističkih i pješačkih staza u službi te interpretacije.

	Izgraditi i obnoviti kulturnu i turističko-rekreativnu infrastrukturu (bunare, biciklističke i trekking staze, vidikovce, značajne kuće-muzeje, crkvice, špilju/jamu) na području Grada Benkovca te uvezati prirodne i kulturne znamenitosti benkovačkog kraja mrežom tematskih ruta/puteva doprinoseći stvaranju novih sadržaja za posjetitelje, a time i proširenju turističke ponude, produženju sezone i povećanju prihoda od turizma. Osim valorizacije baštine benkovačkog kraja, potaknuti će se lokalni MSP-i i OPG-i na gospodarsku aktivnost (hrana, ugostiteljski sadržaji, suveniri i sl.) te osigurati uvjeti za ostanak mladih obitelju u Benkovcu.
<b>Planska domena:</b>	<b>Društvene djelatnosti, usluge u zajednici, odgoj i obrazovanje, Kulturno nasljeđe i turizam, Mobilnost, promet i stanovanje</b>
<b>Vrijednost:</b>	<p><b>Trošak pripreme projektne dokumentacije:</b> 1.000.000,00 kn uključujući PDV</p> <p>Trošak građevinskih radova i opremanja: 10.000.000,00 uključujući PDV</p> <p>Trošak nematerijalnih aktivnosti: 1.500.000,00 uključujući PDV</p> <p><b>Ukupna vrijednost projekta: 12.500.000,00 kn uključujući PDV</b></p>
<b>Financiranje:</b>	<p>EFRR: 85% Javna (vlastita) sredstva 15%</p> <p>ESF 85% Javna (vlastita) sredstva 15%</p>
<b>Prijavitelj:</b>	Grad Benkovac
<b>Iskustvo prijavitelja za provedbu projekata:</b>	<p>Grad Benkovac je od 2002. godine do danas sudjelovao, kao prijavitelj ili partner, u provedbi 10 projekata financiranih iz sredstava Europske unije, sa ukupnom vrijednosti većom od 3.500.000,00 eura.</p> <p>Dodatno, Grad Benkovac je od 1997. godine proveo 40 projekata financiranih iz nacionalnih sredstava sa ukupnom vrijednošću većom od 16.000.000,00 eura.</p> <p>Grad Benkovac i TZGB su od 6-11/2010. proveli projekt obilježavanja 124 km biciklističkih ruta te su iskusni u provođenju projekata ove tematike</p> <p><a href="http://www.tz-benkovac.hr/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=166&amp;Itemid=87">http://www.tz-benkovac.hr/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=166&amp;Itemid=87</a></p>
<b>Partneri:</b>	<p>Udruge koje se bave obnovom i očuvanjem dalmatinske graditeljske baštine te ekološke udruge poput:</p> <p>Udruga Eko Ravni Kotari</p> <p>Srednja škola Kneza Branimira (stipendiranje programa obrazovanja za kamenoklesare i uključivanje stipendista u izvođenje radova na obnovi lokaliteta uz tematske rute)</p> <p>TZ Grada Benkovca</p> <p>Komunalno poduzeće Benković d.o.o.</p> <p>Zavičajni Muzej Benkovac</p>

	<p>Udruga vinogradara i vinara Nadin</p> <p>KUD-ovi</p>
<b>Ciljane skupine / krajnji korisnici</b>	<p><b>Ciljane skupine:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“ Učenici Srednje škole kneza Branimira</li> <li>“ Seoska gospodarstva na trasi gdje prolazi biciklistička ruta</li> <li>“ Poduzetnici koji se bave obradom kamena (11)</li> </ul> <p><b>Krajnji korisnici:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“ Vlasnici/Korisnici bunara – poljoprivrednici, kućanstva</li> <li>“ Posjetitelji i turisti – ljubitelji sporta i avanturizma, razgledavanja kulturnih znamenitosti, ljubitelji vina te lokalne gastronomске ponude</li> <li>“ Stanovnici Grada Benkovca i okolice: djeca, mladež, odrasli – ljubitelja šetnje i vožnje biciklom, rolama i sl., izletnici, speleolozi, vinari i podrumari</li> </ul>
<b>Zrelost projekta:</b>	Za izradu tehničke dokumentacije potrebno je više od 6 mjeseci
<b>Investicijski ciklus projekta:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Programsko rješenje tematskih ruta (definiranje svih parametara buduće tematske cjeline i pripadajućih ruta)</li> <li>2. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa</li> <li>3. Elaborat o procjeni utjecaja na okoliš</li> <li>4. Idejno rješenje</li> <li>5. Geodetski projekt</li> <li>6. Idejni projekt</li> <li>7. Ishođenje lokacijske dozvole</li> <li>8. Studija izvedivosti</li> <li>9. Glavni projekt</li> <li>10. Ishođenje građevinske dozvole (tehnika dokumentacija je spremna)</li> <li>11. Izvedbeni projekt + projekt opremanja</li> <li>12. Izrada prijavnog obrasca za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava</li> <li>13. Javna nabava za izvođenje građevinskih radova</li> <li>14. Javna nabava za izvođenje građevinskog nadzora nad građevinskim radovima</li> <li>15. Javna nabava za opremanje</li> <li>16. Provedba ugovora za obnovu – uređenje bunara/suhozida i gusterne i izgradnja mreže tematskih ruta (uređenje i dorada) uz biciklističke sadržaje seoskih putova, vidikovaca, špilja, muzeja....</li> <li>17. Izrada Plana upravljanja turističkom infrastrukturom</li> <li>18. Promocija</li> </ol>
<b>Provjedbeni mehanizam:</b>	<p>Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga EFRR</p> <p>Izravna dodjela bespovratnih sredstava ESF</p>

<b>Obrazloženje projekta</b>	<p>Grad Benkovac ima mnogo potencijala za postati atraktivno i dobro posjećeno turističko odredište. Njegov položaj u blizini velikih turističkih središta kao i blizina mora i postojanje turističkih atrakcija (većinom prirodnih, ali i kulturnih) ga svrstavaju u gradove koji izgradnjom turističke infrastrukture i valorizacijom postojećih znamenitosti koje trenutno nisu stavljenе u turističku funkciju imaju mogućnost repozicioniranja u turističke destinacije. Plodno tlo koje je pogodno za uzgoj vinove loze te sve veći broj nasada vinograda mogu se iskoristiti u svrhu prezentacije vinskih sorti i vina, komplementarno će se dodatno razviti te će se osigurati i razvoj eno-gastro segmenta turističke ponude.</p> <p>Grad Benkovac nema dovoljan broj adekvatnih staza ili nogostupa koji se ne nalaze na ili uz prometnice na kojoj se biciklisti i šetači nesmetano i bezbrižno mogu šetati ili voziti biciklom iako su se uredile neke od staza i dalje se uređuju od 2010. godine. Također, mnoge zanimljivosti u neposrednoj blizini centra Benkovca nisu ni na koji način uvezane, a idealne su za obilazak bilo pješice ili biciklom zbog slabog nagiba terena i dobrih vremenskih uvjeta gotovo čitave godine. Mnoge prirodne ljepote se trenutno mogu identificirati samo kao turistički potencijal. S obzirom na sve veći globalni trend rasta posjetitelja na ovaj način tj. putem tematskih ruta želi se osigurati obilazak destinacije kroz turističke točke uvezane na području cijelog Grada Benkovca.</p> <p>Širi prostor grada idealan je za obilazak biciklom zbog ravničarskog terena i umjerenih udaljenosti. Cijelo područje Grada obiluje <b>bunarima</b> koji su u različitom stupnju očuvanosti. Za sve bunare je identificirano ima li u njima vode i što je potrebno učiniti kako bi ih se očuvalo od propadanja i privelo svrsi (sanacija, uređenje pristupnog puta, uređenje okoliša). Potrebno je zaštитiti područje oko bunara od daljnje onečišćenja naftom i uljem koje se izlijeva iz traktora u zemlju te sanirati odlagališta otpada koji osim negativnog vizualnog doživljaja imaju i ekološki i zdravstveno opasan učinak. Također je potrebno promijeniti i način odvodnje otpadnih voda kako bi se spriječilo daljnje onečišćenje, narušavanje flore i faune te neugodni mirisi.</p> <p>Svi bunari imaju foto dokumentaciju. Potrebno je za svaki bunar utvrditi katastarsku česticu i status vlasništva.</p> <p>Na području benkovačkog naselja Lisičić nalazi se <b>gusterne</b> sa guvnom izgrađena prije II svjetskog rata koja se tematski uklapa u ovaj projekt te bi se njezina obnova mogla provoditi zajedno s obnovom bunara. Procijenjeno je da bi obnova gusterne stajala oko 100.000 kn.</p> <p>Osim bunara i gusterne, Benkovac obiluje <b>suhozidima</b> koji su dijelom očuvani, ali većina zahtijeva obnovu zbog urušavanja. U prošlosti se za ogradijanja dvorišta, vrtova i poljoprivrednih zemljišta u ovom kraju koristilo suhozidanje. Radi se o umijeću ogradijanja terena pomoću samog kamenja bez vezivnog materijala (cementa, ljeplja ili sličnih materijala za građenje), a kameni zid nastaje isključivo umijećem čovjeka koji gradi zid na osnovu tradicijskog vezanja različitog, nepravilnog kamenja kombiniranjem i razumijevanjem kamenja. Suhozidi su služili na brdovitim terenima za zadržavanje plodnog tla od erozije uslijed kiša i bujica vode. Umijeće suhozidanja pomalo pada u zaborav te bi ga bilo korisno osnažiti i popularizirati kao nematerijalnu baštinu dalmatinskog kraja, a time bi se otvorila i nova radna mjesta za obrtnike koji se bave izradom suhozida od benkovačkog kamenja.</p>
------------------------------	--

	<p>U ovaj projekt bi se mogli uključiti i poduzetnici koji se bave obradom kamenja kao i učenici srednje škole kneza Branimira koja pohađaju nastavu za graditeljska zanimanja. Bunari bi se mogli ograditi i zaštititi suhozidima.</p> <p>Sve ovo je potrebno kako bi se očuvala priroda i kulturno nasljeđe benkovačkog kraja te stvorili preduvjeti za bavljenje ruralnim turizmom te time iskoristili turistički potencijali Grada Benkovca. Razvoj ruralnog turizma osigurat će pojačanu gospodarsku aktivnost, otvaranje novih radnih mesta, zadržavanje stanovništva te osigurati održivost rezultata ovog projekta koja će se očitovati u generiranju sredstava potrebnih za daljnje održavanje graditeljske baštine u Gradu Benkovcu.</p> <p>Izgradnja i opremanje biciklističkih i šetačkih staza kao i uređenje zanimljivih sadržaja uz biciklističke staze osigurat će razvoj cjelogodišnjeg turizma što će turistima donijeti raznovrsne sadržaje zbog kojih će posjećivati Benkovac tijekom cijele godine i duže se u njemu zadržavati. A lokalnom stanovništvu, MSP i OPG će osigurati prilike za pozitivno poslovanje, otvaranje novih poduzeća, ostanak mladih u Benkovcu i privlačenje stanovnika s obzirom da će se otvoriti znatna količina radnih mesta.</p> <p>Uz <b>biciklističke staze</b> će se postaviti i nadstrešnice za odmor, a sve staze će se adekvatno označiti što će stvoriti preduvjete za razvoj biciklističkog turizma čime će se dodatno obogatiti turistička ponuda Grada Benkovca.</p> <p>Ovako bogata mreža biciklističkih staza u lijepom pejzažu, zasigurno će privući organizatore raznovrsnih sportskih događanja poput biciklističkih utrka koja danas privlače na tisuće sudionika koji dolaze sa svojim obiteljima te posjećuju lokalne atrakcije, objeduju u lokalnim restoranima te kupuju lokalne suvenire.</p> <p>Uređenjem <b>speleološkog objekta (jame)</b> zvane Pećina na biciklističkoj ruti upotpunit će se ponuda za sve željne istraživanja speleoloških objekata na ovom području.</p> <p><b>Napomena:</b></p> <p>Od ukupno 41 naselja koliko ih upravno obuhvaća Grad Benkovac kao jedinica lokalne samouprave njih 39 ima najmanje jedan bunar.</p> <p>Bilo bi dobro da se na karti <b>ucrtaju svi bunari</b> koji ulaze u opseg projekta (iz popisa na kojem se nalazi 104 bunara) i identificira vlasništvo zemljišta (k.č.) na kojem se nalaze na temelju evidencije bunara <i>Bunari na području Grada Benkovca</i> ili na temelju <i>Očevidnika vodnih dobara na području Grada Benkovac</i>.</p> <p>Potrebno je kontaktirati UO za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Zadarske županije da svoje mišljenje koji se dokumenti trebaju izraditi kako bi se moglo krenuti u obnovu bunara i suhozida. Tek po dobivanju tih informacija je moguće odrediti vrijeme potrebno za izradu potrebne dokumentacije te vrijeme potrebno za obnovu bunara i suhozida.</p> <p><b>Županijska razvojna strategija Zadarske županije 2011.-2013.</b> definira četiri strateška cilja od čega se</p>
--	---

	<p>zadnji može direktno povezati s ovim projektom:</p> <p><b>STRATEŠKI CILJ 4</b></p> <p>Unaprjeđenje zaštite okoliša i kvalitete života</p> <p>Projekt je u skladu s <b>Glavnim planom razvoja turizma Zadarske županije 2013. – 2023.</b> Glavni plan donosi tri strateška cilja od kojih je ovaj projekt uskladen sa sva tri, odnosno doprinosi provedbi sva tri cilja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uspostava održivog učinkovitog sustava upravljanja resursima i potencijalima turizma</li> <li>2. Smanjenje sezonalnosti kroz razvoj konkurentnog turističkog sektora</li> <li>3. Unaprjeđenje turističke infrastrukture i usluga, te zaštita okoliša</li> </ol> <p>Projekt je u skladu sa <b>Strateškim programom ukupnog razvoja Grada Benkovca 2012.-2016.</b> te doprinosi ostvarenju sva tri razvojna cilja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uspješno gospodarstvo</li> <li>2. Očuvanje i održivo korištenje resursa</li> <li>3. Visoka kvaliteta usluga stanovništvu</li> </ol> <p>Od mjera koje Strateški program navodi za ovaj projekt su relevantne sljedeće mjere:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nastaviti rješavati imovinsko-pravne odnose na području Grada Benkovca</li> <li>2. Poticati obnovu i razvoj tradicijskih obrta te oblikovanje, proizvodnju i prodaju izvornih suvenira</li> </ol> <p><i>Vizija: Benkovac, grad ekonomskog prosperiteta temeljenog na suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji, malom i srednjem poduzetništvu, te posebnoj turističkoj ponudi. Grad žiteljima ugodan za življenje, poduzetnicima prilika za ulaganje, a turistima privlačan za posjećivanje.</i></p> <p><b>Plan razvoja turizma destinacije Benkovac</b> vidi turističke proizvode u Benkovcu kao pretežitim dijelom dokoličarsko-edukacijske te dijelom sportsko-rekreacijske, a manjim dijelom odmorišne. Stoga se naš projekt u potpunosti uklapa u Plan razvoja turizma.</p>
Aktivnosti grupirane po EP:	<p><b>EP 1 Priprema dokumentacije</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Identificirati vlasništvo k.č. na kojima se nalaze odabrani objekti graditeljskog nasljeđa (bunari, gusterna i suhozidi) i odabранe rute biciklističke/trekking staze (temeljem idejnog rješenja)</li> <li>1.2. Identifikacija dužine i trase mreže biciklističkih/trekking staza</li> <li>1.3. Definirati tehničku dokumentaciju za svu infrastrukturu (staze, bunare, gusternu, suhozide, vidikovce, muzej, špilju, lovačku kuću ...)</li> <li>1.4. Raspisati javne nabave za izradu tehničke dokumentacije uključujući studiju izvedivosti</li> <li>1.5. Izrada tehničke dokumentacije</li> <li>1.6. Izrada elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja za okoliš</li> </ol> <p><b>EP 2 Građevinski radovi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Javna nabava za izvođenje građevinskih radova</li> </ol>

	<p>2.2. Javna nabava za građevinski nadzor nad izvođenjem radova</p> <p>2.3. Provedba ugovora za izvođenje radova</p> <p>2.4. Provedba ugovora o građevinskom nadzoru nad izvođenjem radova</p> <p><b>EP 3 Građevinski radovi vezani uz odvodnju/sanaciju otpada kod definiranih lokaliteta i na odabranim trasama ruta</b></p> <p>3.1. Sanacija odlagališta otpada</p> <p>3.2. Riješiti pitanje odvodnje otpadnih voda</p> <p><b>EP 4 Suradnja gospodarskog i obrazovnog sektora</b></p> <p>4.1. Uspostaviti suradnju poduzetnika i srednje škole za građevinska zanimanja te uključiti dionike u obnovu graditeljskog nasljeđa (praksa)</p> <p>4.2. Edukacija o izgradnji suhozida</p> <p>4.3. Edukativne radionice za djecu i stanovništvo o sigurnoj vožnji bicikлом</p> <p>4.4. Edukacija turističkih djelatnika (edukacije, studijska putovanja...)</p> <p><b>EP 5 Manifestacije i sadržaji</b></p> <p>5.1. Osmišljavanje zajedničkih aktivnosti i sadržaja</p> <p>5.2. Održavanje vinskih manifestacija</p> <p>5.3. Održavanje velikih sportskih manifestacija/utrka</p> <p><b>EP 6 Promidžba i vidljivost</b></p> <p>6.1. Promocija projekta – početna i završna konferencija za tisak, letak, objava vijesti o projektu na postojećim mrežnim stranicama Grada Benkovca i TZ-a te izrada svi popratnih materijala definiranih Uputama za korisnike za razdoblje 2014.-2020.: Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata (Zagreb, svibanj 2015. MRRFEU)</p> <p>6.2. Edukativne promo radionice o izradi suhozida/Promo film</p> <p>6.3. Uvezivanje bunara, suhozida i gusterne u zajedničku turističku ponudu povezanu tematskim rutama (uključujući i biciklističke staze)</p> <p>6.4. Promocija grada Benkovca kao cijelogodišnje turističke destinacije bazirano na očuvanoj prirodi, sportu, gastro i eno ponudi – sajmovi, bilboardi, umrežavanje s ostalim ciklo destinacijama, leci, brošure, prezentacije turističkim agencijama...</p> <p>6.5. Izrada mape tematskih ruta/staza</p> <p>6.6. Označavanje tematskih ruta i svih atrakcija uz rute</p> <p>6.7. Uvrštanje biciklističke staze u svjetske biciklističke staze</p>
--	--


	<p><b>EP 7 Upravljanje i administracija</b></p> <p>7.1. Sastanci projektnog tima      7.2. Izvještavanje – narativno i financijsko      7.3. Financijsko upravljanje projektom      7.4. Upravljanje aktivnostima      7.5. Upravljanje procesom javne nabave      7.6. Financijska revizija</p>
<b>Ključni rezultati:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Broj bunara obnovljen i stavljen u funkciju</li> <li>- Sanirana odlagališta otpada na područje Benkovca</li> <li>- Obnovljeni suhozidi</li> <li>- Obnovljena 1 gusterna</li> <li>- Obrazovani graditelji suhozida (sudionici aktivnosti mlađi od 25 godina i stariji od 54 godine)</li> <li>- Izgrađene staze za bicikliste i šetače</li> <li>- Obnovljeni poljski putovi</li> <li>- 1 jama Duboka pećina uređena i stavljena u funkciju (naselje Bulić u Benkovcu)</li> <li>- broj objekata/lokaliteta od značaja obnovljeno kao točka na tematskoj ruti</li> </ul>
<b>Pokazatelji:</b>	<p><b>Izgrađena ili obnovljena infrastruktura: 10</b></p> <p><b>Sudionici koji imaju posao, uključujući samozaposlene, po prestanku sudjelovanja: 1</b></p> <p><b>Aktivnosti podizanje svijesti/javne kampanje: 1</b></p> <p><b>Nezaposleni koji sudjeluju u programu osposobljavanja: 2</b></p> <p><b>Stručnjaci koji sudjeluju u programu osposobljavanja: 1</b></p> <p><b>Mlađi od 25 godina: 20</b></p> <p><b>Stariji od 54 godine: 10</b></p>
<b>Upravljanje projektom (opisati tim uključujući zaposlene i nova zapošljavanja):</b>	<p>Projektni tim:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Voditelj/ica projekta: 12%</li> <li>2. Koordinator/ica radova: 25%</li> <li>3. Administrativni referent/ica: 6%</li> <li>4. Financijsko-računovodstveni referent/ica: 6%</li> <li>5. Stručnjak/inja za javnu nabavu: 2%</li> </ol> <p>Novo zapošljavanje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Djelatnik/ica TZ novozaposleni: 100%</li> <li>2. Stručnjak za kulturno turističke sadržaje i proizvode 30% novozaposleni (ostatak od 70% raspoređeno je po drugim projektima sa relevantnim sadržajem)</li> </ol>

<b>Trajanje:</b>	<p><b>Identifikacija opsega projekta</b> i izrada idejnog rješenja (koncepta) usuglašavanje trase mreže ruta i lokaliteta: 6 mjeseci</p> <p><b>Izrada potrebne tehničke dokumentacije:</b> 9 mjeseci</p> <p><b>Izgradnja/obnova:</b> 12-18 mjeseci (ovisno o dužini staze i terenu te stupnju opremljenosti kao i sofisticiranosti gradnje i opremanja)</p> <p><b>Promocija:</b> Kontinuirano</p>
<b>Održivost:</b>	<p>Održivost se očituje u više segmenata:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Socijalno/demografska održivost:</b> zadržavanje postojećeg stanovništva i privlačenje novog u Benkovac zbog otvaranja novih radnih mjesta i mogućnosti zapošljavanja i samozapošljavanja</li> <li>2. <b>Finansijska i upravljačka održivost:</b> obnovom i stavljanjem u turističku funkciju graditeljskog nasljeđa, otvorit će se nova poduzeća i nova radna mjesta kako u građevinskom tako i u turističkom sektoru što će osigurati dostatne prihode za stanovništvo i poduzetnike te nastavno na to i prihode za lokalni proračun. Tim prihodima će se osigurati održavanje graditeljskog nasljeđa. Mreža tematskih ruta koje će biti pozicionirane na način da prolaze pored važnih prirodnih i kulturno-turističkih znamenitosti će osigurati tim točkama znatno veći broj posjetitelja koji će kupovati njihove proizvode (kulturne, gastronomске, enološke, suvenire i sl.) te će na taj način osigurati razvoj poduzetništva i povećanje prihoda od turizma (javni i privatni sektor). Obnovljenom i izgrađenom infrastrukturom upravljati će Grad Benkovac i TZ.</li> <li>3. <b>Okolišna održivost:</b> sanacijom odlagališta otpada uz lokacije na kojima se nalaze elementi graditeljskog nasljeđa kao i promjenom načina odvodnje otpadnih voda osigurat će se zdravstveno ispravna voda za ljude, životinje i biljke te će se smanjiti onečišćenje okoliša. Koristeći energetski učinkovito prijevozno sredstvo – bicikl - neće zagađivati okoliš.</li> <li>4. <b>Turistička održivost:</b> projektom se osigurava podloga za bavljenje održivim ruralnim turizmom. Ukoliko će tematske rute biti pozicionirane pored seoskih gospodarstava ili ugostiteljskih objekata ili spajati više turističkih sadržaja/znamenitosti, turistička održivost bit će značajnija. Sadržaji koji će se nuditi uz staze (vidikovci, bunari, muzeji, špilje, bunari, suhozidi i sl.) valorizirat će se te će se pored njih razviti priručna prodajna mjesta na kojima će lokalni OPG-ovi nuditi svoje proizvode za okruglu (hrana i piće).</li> </ol>

Terminski plan provedbe projekta		2017		2018				2019				2020				2021				2022				
		3 k v	4 k v	1 k v	2 k v	3 k v	4 k v																	
JN za programsko rješenje tematskih ruta																								
Programsko rješenje tematskih ruta (definiranje svih parametara buduće tematske cjeline i pripadajućih ruta)																								
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa																								
Elaborat o procjeni utjecaja na okoliš																								
Geodetski projekt																								
Idejni projekt																								
Ishođenje lokacijske dozvole																								
Studija izvedivosti																								
Glavni projekt																								
Ishođenje građevinske dozvole																								
Izvedbeni projekt + projekt opremanja																								
Izrada prijavnog obrasca za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava																								

	Javna nabava																									
	Provđba ugovora za izvođenje građevinskih radova obnove																									
	Plana upravljanja turističkom infrastrukturom																									
	Promocija																									

<b>Nazivi skica, fotografija i drugih grafičkih prikaza projektnih ideja</b>	Foto-dokumentacija svih bunara.  Dokumentacija biciklističkih staza
--	---

NAZIV PROJEKTA	UREĐENJE KARINSKE PLAŽE I PRIPADAJUĆE INFRASTRUKTURE
<b>Lokacija projekta</b>	Donji Karin. Lokacija je udaljena 15.5 km od Benkovca, 40 km od Zadra (državnom cestom D502), a 35 km od Zračne luke Žemunik.
	
<b>Vrsta projekta:</b>	Glavni
<b>Razvojni prioritet:</b>	<b>4RP: Os razvoja - Razvoj turističke ponude temeljene na selektivnim oblicima turizma</b>
<b>Opći cilj:</b>	<p><b>1. Prostorni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“ Iskoristiti potencijale prostornog značaja Grada Benkovca kroz očuvanje i održivo korištenje prostornih resursa.</li> </ul> <p><b>2. Društveni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“ Ojačati ulogu Grada Benkovca kao središta društvenog života Ravnih Kotara i Bukovice te povećati životni standard građana.</li> </ul> <p><b>3. Gospodarski:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Povećati kapacitete na području Grada Benkovca za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, s naglaskom na poljoprivrednu i ekološku proizvodnju, prerađivačke djelatnosti, trgovinu i održivi turizam.</li> </ul>
<b>Specifični cilj:</b>	Razvoj turističke infrastrukture u Donjem Karinu kroz uređenje karinske plaže
<b>Planska domena:</b>	<b>Kulturno nasljeđe i turizam;</b> okoliš krajolik i upravljanje prirodnim resursima
<b>Vrijednost:</b>	<p><b>Trošak pripreme projektne dokumentacije:</b> 500.000,00 kn uključujući PDV</p> <p>Trošak građevinskih radova i opremanja: 9.500.000,00 uključujući PDV</p> <p><b>Ukupna vrijednost projekta: 10.000.000,00 kn uključujući PDV</b></p>
<b>Financiranje:</b>	EFRR 85%  Javna (vlastita) sredstva 15%

<b>Prijavitelj:</b>	Grad Benkovac
<b>Iskustvo prijavitelja za provedbu projekata:</b>	Grad Benkovac je od 2002. godine do danas sudjelovao, kao prijavitelj ili partner, u provedbi 10 projekata financiranih iz sredstava Europske unije, sa ukupnom vrijednosti većom od 3.500.000,00 eura.  Dodatno, Grad Benkovac je od 1997. godine proveo 40 projekata financiranih iz nacionalnih sredstava sa ukupnom vrijednošću većom od 16.000.000,00 eura.
<b>Partneri:</b>	Turistička zajednica Grada Benkovca,  Benković d.o.o.,  Vodovod i odvodnja d.o.o.,  Elektra d.o.o.
<b>Ciljane skupine / krajnji korisnici</b>	<b>Ciljane skupine:</b> „ Stanovnici Grada Benkovca „ Lokalno stanovništvo naselja Donji Karin „ Posjetitelji u naselju „ Vlasnici kuća <b>Krajnji korisnici:</b> „ Ugostitelji „ Vlasnici kampa „ Iznajmljivači na području Bukovice i Ravnih Kotara „ Turisti „ Vlasnici kuća i njihovi gosti „ Dnevni posjetitelji iz šire okolice
<b>Zrelost projekta:</b>	Postoji stručno rješenje za izradu urbanističkog plana.  Za izradu tehničke dokumentacije potrebno je više od 6 mjeseci
<b>Investicijski ciklus projekta:</b>	1. Urbanistički plan broj 4 2. Urbanistički plan broj 1 3. Idejno rješenje 4. Rješavanje imovinsko pravnih odnosa 5. Elaborat o procjeni utjecaja na okoliš 6. Plan upravljanja turističkom infrastrukturom u Donjem Karinu 7. Geodetski projekt 8. Idejni projekt <sup>8</sup> 9. Studija izvedivosti 10. Glavni projekt

<sup>8</sup> Ishođenje lokacijske dozvole ukoliko se ne riješe imovinsko pravni odnosi

	<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Ishođenje građevinske dozvole</li> <li>12. Izvedbeni projekt + projekt opremanja</li> <li>13. Izrada prijavnog obrasca za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava</li> <li>14. Javna nabava za građevinske radove</li> <li>15. Javna nabava za građevinski nadzor nad izvođenjem radova</li> <li>16. Javna nabava za opremanje</li> <li>17. Provedba ugovora o izvođenju radova</li> <li>18. Provedba ugovora o opremanju</li> <li>19. Provedba ugovora o građevinskom nadzoru nad izvođenjem radova</li> <li>20. Tehnički pregled</li> <li>21. Uporabna dozvola</li> </ol>
<b>Provđbeni mehanizam:</b>	Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga EFRR
<b>Obrazloženje projekta</b>	<p>Donji Karin je jedino mjesto na području Grada Benkovca koje ima izlaz na more. Zbog atraktivnosti lokacije i položaja na mjestu gdje se dodiruju planina, rijeka i more u blizini franjevačkog samostana, zaštićenog kulturnog dobra, sve više turista prepoznaje turističke potencijale ovoga mjesta.</p> <p>Na području naselja Donji Karin živi 171 stanovnika, kojima nedostaje kvalitetna društvena infrastruktura i sadržaj. Na tom području postoje kuće za odmor od kojih se neke daju u najam, 2 ugostiteljska objekata koja posluju sezonski, a izgrađen je i kamp. Budući da je naselje i brojem stanovnika i brojem posjetitelja nakon Domovinskog rata doživjelo izraziti pad, izraziti porast broja noćenja koje od 2012. naovamo bilježi Grad Benkovac (2012: 3.245, 2015: 39.554) predstavlja važnu priliku za razvoj tog naselja, ali i daljnji doprinos povećanju broja posjetitelja i produžetku turističke sezone.</p> <p>Predmet projekta je dio građevinskog područja naselja Donji Karin koji se nalazi uz more i u kojem ima 206 izgrađenih kuća od kojih 42 kuće služe za odmor i iznajmljivanje a ostale za odmor vlasnika njihovih obitelji i prijatelja.</p> <p>Na tragu prethodno navedenih potencijala dolazaka, jedna od kvalitetnih mjer za poboljšanje turističkih aktivnosti u Gradu Benkovcu je prostornim planom definirana jedina turistička zona (turističko naselje površine 10 ha, maksimalnog kapaciteta do 500 kreveta) u Donjem Karinu, u neposrednom kontaktu s postojećim vikend naseljem.</p> <p>Postojeće vikend naselje u sklopu građevinskog područja naselja Donji Karin i prateća infrastruktura pružaju vrlo dobre uvjete za razvoj planirane turističke zone, ali i za proširenje i sadržajno preoblikovanje postojećih turističkih sadržaja. Također u sklopu mjesta Donji Karin uređen je kamp.</p> <p>Infrastruktura Donjeg Karina je u jako lošem stanju (iako Grad svake godine u skladu sa svojim mogućnostima ulaže određena sredstva), počevši od neprimjerenog položaja lučice pa do izgleda same plaže i pristupa istoj.</p> <p>Osim toga nedostatak središnjeg pješačkog dijela uz more predstavlja značajnu zapreku i ograničavajući je faktor povećanju broja posjetitelja i produljenju sezone. Osim toga, Karinsko more je najmanje more</p>

	<p>na Jadranu i važno je očuvati ekološku ravnotežu izgradnjom sustava otpadnih voda te poduzeti druge mjere zaštite okoliša.</p> <p>Sama staza, prema projektnoj ideji, bila bi uređena u neasfaltiranu šetnicu duljine od 700 metara, osvijetljenu ekološki prihvatljivom solarnom rasvjetom, opremljenu klupama i kantama za otpatke. Osim što bi ponudila sadržaj domaćem stanovništvu i posjetiteljima, ona bi povećala potencijal inače teško pristupačnih manjih plaža duž tog dijela obale.</p> <p>Ovim projektom želi se obnoviti karinska plaža, tj. izgraditi sustav odvodnje otpadnih voda, rekonstruirati vodovodnu mrežu, javnu rasvjetu, prometnice i javno parkiralište.</p> <p><b>Strateški program ukupnog razvoja Grada Benkovca 2012.-2016.</b> u svojoj viziji poziva se na turističku opredijeljenost kao jednu od strateških grana ključnih za gospodarski prosperitet. Ona se ovim projektom potiče i snaži. Doprinosi se i ostvarenju vizije kako je definirana Strateškim programom ukupnog razvoja:</p> <p><i>Benkovac, grad ekonomskog prosperiteta temeljenog na suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji, malom i srednjem poduzetništvu, te posebnoj turističkoj ponudi. Grad žiteljima ugodan za življenje, poduzetnicima prilika za ulaganje, a turistima privlačan za posjećivanje.</i></p> <p>Projekt je u skladu sa <b>Strateškim programom ukupnog razvoja Grada Benkovca 2012.-2016.</b> te doprinosi ostvarenju sva tri razvojna cilja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uspješno gospodarstvo</li> <li>2. Očuvanje i održivo korištenje resursa</li> <li>3. Visoka kvaliteta usluga stanovništvu</li> </ol> <p><b>Plan razvoja turizma destinacije Benkovac</b> vidi turističke proizvode u Benkovcu kao pretežitim dijelom dokoličarsko-edukacijske te dijelom sportsko-rekreacijske, a manjim dijelom odmorišne. Stoga se naš projekt, osobito proširenje sportskog centra, u potpunosti uklapa u Plan razvoja turizma.</p>
Aktivnosti grupirane po EP:	<p><b>EP 1 Priprema dokumentacije</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Raspisivanje natječaja za izradu UPU</li> <li>1.2. Izraditi UPU</li> <li>1.3. Rješavanje imovinsko-pravnih pitanja</li> <li>1.4. Raspisivanje javne nabave za izradu dokumentacije</li> <li>1.5. Izrada projektne dokumentacije uključujući studiju izvodivosti</li> <li>1.6. Ishođenje građevinske dozvole</li> <li>1.7. Izrada elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš</li> </ol> <p><b>EP 2 Građevinski radovi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Raspisivanje javne nabave za izvođenje građevinskih radova</li> <li>2.2. Raspisivanje javne nabave za građevinski nadzor nad izvođenjem radova</li> <li>2.3. Provedba ugovora za građevinske radove</li> <li>2.4. Provedba ugovora o građevinskom nadzoru nad izvođenjem radova</li> </ol>

	<p><b>EP 3 Opremanje</b></p> <p>3.1. Raspisivanje javne nabave za opremanje za dobavljače za različite vrste opreme (rasvjeta, klupe, kante za otpatke, oznake)</p> <p>3.2. Provedba ugovora o nabavi opreme</p> <p><b>EP 4 Promidžba i vidljivost</b></p> <p>4.5. Promocija projekta – početna i završna konferencija za tisak, letak, objava vijesti o projektu na postojećim mrežnim stranicama Grada Benkovca te izrada svi popratnih materijala definiranih Uputama za korisnike za razdoblje 2014.-2020.: Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata (Zagreb, svibanj 2015. MRRFEU)</p> <p>4.6. Priprema i provedba javne nabave za ugovaranje oglašivačke agencije</p> <p>4.7. Izrada plana promocije Donjeg Karina s novom infrastrukturom</p> <p>4.8. Provedba plana promocije: promotivna događanja, leci, društvene mreže i dr.</p> <p><b>EP 5 Upravljanje i administracija</b></p> <p>5.1. Sastanci projektnog tima</p> <p>5.2. Izvještavanje</p> <p>5.3. Financijsko upravljanje projektom</p> <p>5.4. Upravljanje aktivnostima projekta</p> <p>5.3. Upravljanje procesima javne nabave</p> <p>5.4. Financijska revizija projekta</p>
<b>Ključni rezultati:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Izgrađen sustav odvodnje otpadnih voda uz plažu</li> <li>- Rekonstruirana vodovodna mreža uz plažu</li> <li>- Obnovljena javna rasvjeta uz plažu</li> <li>- Izgrađeno šetalište</li> <li>- Obnovljene prometnice uz plažu</li> <li>- Obnovljeno javno parkiralište uz plažu</li> <li>- Izgrađena sportska luka</li> </ul>
<b>Pokazatelji:</b>	<b>Izgrađena ili obnovljena infrastruktura: 4</b>
<b>Upravljanje projektom (opisati tim uključujući zaposlene i nova zapošljavanja):</b>	<p>Projektom će upravljati Grad Benkovac, a TZ će biti nadležan za promotivne aktivnosti.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Voditelj/ica projekta: 12%</li> <li>2. Koordinator/ica radova: 25%</li> <li>3. Administrativni referent/ica: 6%</li> <li>4. Financijsko-računovodstveni referent/ica: 6%</li> <li>5. Stručnjak/inja za javnu nabavu: 2%</li> </ol>

<b>Trajanje:</b>	Trajanje pripreme: 2 godine  Trajanje radova i opremanja: 3 godine																																																																																																																																																														
<b>Održivost:</b>	1. <b>Socijalno/demografska održivost:</b> Projektom bi se posredno moglo utjecati na stabilizaciju postojećeg broja stanovnika i eventualno, kroz poboljšanje atraktivnosti za život, i poboljšanje demografske slike 2. <b>Finansijska i upravljačka održivost:</b> Za upravljanje infrastrukturom bit će zaduženi Grad Benkovac (javna rasvjeta, prometnice, parkiralište) odnosno komunalno poduzeće Vodovod i odvodnja d.o.o. za sustav otpadnih voda i vodovodnu 3. <b>Okolišna održivost:</b> projekt će biti pripremljen uzimajući u obzir maksimalne standarde okolišne održivosti. U projektu će biti korišteni obnovljivi izvori energije – solarna rasvjeta i sustav odvodnje prilagođen svim razinama regulative u pogledu otpadnih voda.																																																																																																																																																														
<b>Terminski plan provedbe projekta:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th colspan="2">2017</th><th colspan="4">2018</th><th colspan="4">2019</th><th colspan="4">2020</th><th colspan="4">2021</th><th></th></tr> <tr> <th></th><th>3</th><th>4</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>1</th><th>2.</th><th>3</th><th>4</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Izrada Urbanističkog plana broj 4 i broj 1</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>k</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td></td></tr> <tr> <td>Idejno rješenje</td><td>v</td><td>v</td><td>v</td><td>v</td><td>v</td><td>v</td><td>v</td><td>v</td><td>v</td><td>v</td><td>v</td><td>v</td><td>v</td><td>v</td><td>v</td><td>v</td><td>v</td><td>v</td><td></td></tr> <tr> <td>Rješavanje imovinsko pravnih odnosa</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Elaborat o procjeni utjecaja na okoliš</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Plan upravljanja turističkom infrastrukтурom</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>																				2017		2018				2019				2020				2021						3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2.	3	4	1	2	3	4		Izrada Urbanističkog plana broj 4 i broj 1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	k	.	.	.	.	.	.		Idejno rješenje	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		Rješavanje imovinsko pravnih odnosa																				Elaborat o procjeni utjecaja na okoliš																				Plan upravljanja turističkom infrastrukтурom																			
	2017		2018				2019				2020				2021																																																																																																																																																
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2.	3	4	1	2	3	4																																																																																																																																													
Izrada Urbanističkog plana broj 4 i broj 1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	k	.	.	.	.	.	.																																																																																																																																													
Idejno rješenje	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v																																																																																																																																													
Rješavanje imovinsko pravnih odnosa																																																																																																																																																															
Elaborat o procjeni utjecaja na okoliš																																																																																																																																																															
Plan upravljanja turističkom infrastrukтурom																																																																																																																																																															

	Geodetski projekt														
	Idejni projekt														
	Studija izvedivosti														
	Glavni projekt														
	Izvedbeni projekt														
	Izrada prijavnog obrasca za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava														
	JN za izvođenje građevinskih radova														
	JN za građ. nadzor nad izvođenjem radova														
	JN za projektantski nadzor														
	JN za opremanje														
	Provjeda ugovora o izvođenju radova														

	Provđba ugovora o građevinskom nadzoru nad izvođenjem radova																					
	Provđba ugovora o prevođenju																					
	Tehnički pregled																					
	Uporabna dozvola																					
Nazivi skica, fotografija i drugih grafičkih prikaza projektnih ideja																						

NAZIV PROJEKTA	MREŽA DOMOVA
Lokacija projekta	Naselja: Smilčić, Nadin, Vukšić i Lisičić
Vrsta projekta:	Komplementarni
Razvojni prioritet:	1RP: Os razvoja: Razvoj Benkovca kao centra društvenog života Ravnih Kotara i Bukovice
Opći cilj:	<p><b>1. Prostorni:</b></p> <p>“ Iskoristiti potencijale prostornog značaja Grada Benkovca kroz očuvanje i održivo korištenje prostornih resursa.</p> <p><b>2. Društveni:</b></p> <p>“ Ojačati ulogu Grada Benkovca kao središta društvenog života Ravnih Kotara i Bukovice te povećati životni standard građana.</p>
Specifični cilj:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Osporobiti sekundarne društvene centre na području Grada Benkovca radi osiguranja geografski ravnomjerno raspoređenih uvjeta razvoja na cijelokupnom području Grada</li> <li>Izgraditi društveni kapital lokalnog stanovništva osiguranjem društvene infrastrukture za provođenje aktivnosti društvenog, kulturnog, obrazovnog i rekreativnog karaktera</li> </ol>
Planska domena:	Društvene djelatnosti, usluge u zajednici, odgoj i obrazovanje; Mobilnost, promet i stanovanje

<b>Vrijednost:</b>	Trošak pripreme projektne dokumentacije: 500.000,00 kn uključujući PDV  Trošak građevinskih radova i opremanja: 9.500.000,00 uključujući PDV  <b>Ukupna vrijednost projekta: 10.000.000,00 kn uključujući PDV</b>
<b>Financiranje:</b>	EFRR 85% ;  Javna (vlastita) sredstva 15%
<b>Prijavitelj:</b>	Grad Benkovac
<b>Iskustvo prijavitelja za provedbu projekata:</b>	Grad Benkovac je od 2002. godine do danas sudjelovao, kao prijavitelj ili partner, u provedbi 10 projekata financiranih iz sredstava Europske unije, sa ukupnom vrijednosti većom od 3.500.000,00 eura.  Dodatno, Grad Benkovac je od 1997. godine proveo 40 projekata financiranih iz nacionalnih sredstava sa ukupnom vrijednošću većom od 16.000.000,00 eura.
Partneri:	Partneri: MO Lisičić, MO Nadin, MO Vukšić, MO Smilčić, sportski klubovi, KUD-ovi i ostale udruge iz ovih naselja, Zavičajni muzej Grada Benkovca
<b>Ciljane skupine / krajnji korisnici</b>	<b>Ciljana skupina:</b> stanovnici te poljoprivrednici i poduzetnici navedenih naselja. Ciljna skupina obuhvaća sve dobne skupine. Za navedene ciljne skupine realizacija projekta će značiti osiguranje društvene infrastrukture za prakticiranje aktivnosti društvenog, kulturnog, obrazovnog i sportsko-rekreativnog karaktera. Trenutno se u naseljima za potrebe mjesnih odbora i društvene potrebe koriste privatne kuće i područne škole. Izgradnjom društvenih domova osigurat će se prostor za potrebe sastajanja lokalnog stanovništva, organiziranja lokalnih manifestacija, priredbi, sastanaka, radionica. Također, društveni domovi koristit će se u svrhu održavanja aktivnosti lokalnih udruga i mjesnih odbora. Lokalno vlasništvo nad projektom, ostvareno kroz upravljanje društvenim domovima putem nadležnih mjesnih odbora (po sistemu rotacije MO lokalnog središnjeg naselja i MO-a gravitirajućih naselja) pored integracije stanovništva područja jamčit će da je pružanje usluga u društvenim domovima prilagođeno potrebama lokalnog stanovništva. Dodatno, iskorištavanjem mogućnosti iznajmljivanja prostorija društvenih domova stvorit će se uvjeti za stjecanje prihoda koje se potom može rasporediti na zadovoljavanje lokalnih potreba.  <b>Korisnici:</b> projekta su svi stanovnici na području Grada Benkovca koji će profitirati osnaživanjem zajednice. Osnaživanje će se postići organiziranjem lokalnog stanovništva u civilnom sektoru, jačanjem njihovih upravljačkih vještina i promicanjem aktivne zajednice. Dodatno, formiranjem sekundarnih društvenih centara postići će se uvjeti za primjenu načela supsidijarnosti i time rasteretiti naselje Benkovac kao primarni društveni centar.  Upravo iz razloga posebnih funkcija (kultura i kulturna baština u turizmu) domova u Nadinu i Smilčiću turisti/posjetitelji također predstavljaju jednu grupu korisnika
<b>Zrelost projekta:</b>	Ukupno za projekt potrebno je više od 6 mjeseci za izradu projektne dokumentacije.  Samo za Vukšić je izrađena projektna dokumentacija

<b>Investicijski ciklus projekta:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Idejno rješenje</li> <li>2. Rješavanje imovinsko pravnih odnosa</li> <li>3. Elaborat o procjeni utjecaja na okoliš</li> <li>4. Geodetski projekt</li> <li>5. Idejni projekt<sup>9</sup></li> <li>6. Studija izvedivosti</li> <li>7. Glavni projekt</li> <li>8. Ishođenje građevinske dozvole</li> <li>9. Izvedbeni projekt + projekt opremanja</li> <li>10. Izrada prijavnog obrasca za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava</li> <li>11. Javna nabava za izvođenje građevinskih radova</li> <li>12. Javna nabava za građevinski nadzor nad izvođenjem radova</li> <li>13. Javna nabava za opremanje</li> <li>14. Provedba ugovora za izvođenje radova</li> <li>15. Provedba ugovora o građevinskom nadzoru nad izvođenjem radova</li> <li>16. Provedba ugovora o opremanju</li> <li>17. Tehnički pregled</li> <li>18. Uporabna dozvola</li> <li>19. Osmišljavanje programa i sadržaja koji će se odvijati u Domovima</li> <li>20. Plan upravljanja domovima</li> <li>21. Promocija</li> </ol>
<b>Provđeni mehanizam:</b>	Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga EFRR
<b>Obrazloženje projekta</b>	<p>Prema važećoj Analizi područja osim samog naselja Grada Benkovca imamo još 5 mikrolokacija odnosno središta:</p> <p><b>Pristeg 315</b> (Donje Ceranje, Dobra Voda, Gornje Ceranje, Miranje, Radošinovci) <b>Nadin 406</b> (Lišane Tinjske, Raštević, Tinj, Zagrad) <b>Smilčić 244</b> (Donje Biljane, Donji Kašić, Gornje Biljane, Islam Grčki) <b>Vukšić 507</b> (Bulić Donji Lepuri Kolarina Kožlovac Prović) <b>Lisičić 263</b> (Bjelina, Brgud, Bruška, Donji Karin, Medviđa, Podgrađe, Popovići, Rodaljice).</p> <p>Nedostatak društvene infrastrukture u naseljima na području Grada Benkovca jedan je od važnih uzroka nedostatne kvalitete života a naročito niske razine društvenog kapitala lokalnog stanovništva. Nedostatna kvaliteta života temeljnim je uzrokom smanjenja broja stanovnika u ruralnim naseljima Grada Benkovca i stoga u izravnoj korelaciji sa padom vitalnog indeksa stanovništva. Pad broja stanovnika rezultatom je emigracijskih kretanja lokalnog stanovništva prema urbanim sredinama ili u inozemstvo.</p> <p>Upravno područje Grada Benkovca obuhvaća 41 naselje odnosno 516.19 km<sup>2</sup> površine. Udaljenost od najsjevernije do najjužnije odnosno od najistočnije do najzapadnije točke iznosi nešto više od 30 km. Obzirom na veliku površinu Grada Benkovca ustanovljena je potreba za definiranjem lokalnih središnjih</p>

<sup>9</sup> Ishođenje lokacijske dozvole ukoliko se ne riješe imovinsko pravni odnosi

	<p>naselja čija se funkcija sastoji u pružanju društvenih usluga izvan samog središta mikroregije, odnosno naselja Benkovac, radi osiguranja uvjeta za ravnomjeren razvoj na cjelokupnom području Grada. Pritom svako naselje sa statusom lokalnog središnjeg naselja obuhvaća i njemu gravitirajuća naselja kako je navedeno u Analizi područja.</p> <p>Na području Grada Benkovca, sukladno podacima popisa stanovništva iz 2011. godine, živi 11,026 stanovnika. Od toga samo naselje Benkovac, kao središte mikroregije, zajedno sa naseljima koja mu gravitiraju, broji 5,858 stanovnika. Sukladno navedenom, izgradnjom i opremanjem društvenih domova u lokalnim središnjim naseljima Lisičić, Nadin, Smilčić i Vukšić osigurala bi se nužna društvena infrastruktura za 3,305 stanovnika odnosno 63,95% stanovništva izvan naselja Benkovac i njemu gravitirajućih naselja.</p> <p>Nizak socijalni kapital lokalnog stanovništva iskazan je kroz sporadične oblike organiziranja u civilnom sektoru. Prema podacima Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Benkovca aktivno je tek 16 udruža sa sjedištem registriranim izvan naselja Benkovac. Od toga tek 10 udruža djeluje na području naselja Lisičić, Nadin, Smilčić i Vukšić. Izgradnjom i opremanjem društvenih domova stvorit će se prostorne prepostavke za prakticiranje udruživanja u civilnom sektoru kao temeljnog oblika izgradnje društvenog kapitala.</p> <p>Izgradnja i opremanje društvenih domova, te uvođenje novih sadržaja u naseljima Lisičić, Nadin, Smilčić i Vukšić sastoje se u koheziji i integraciji zajednice te jačanju osjećaja identiteta i pripadanja konkretnom prostoru. Pored podizanja opće kvalitete života provođenjem edukativnih aktivnosti i upravljanja po principu rotacije lokalno će stanovništvo steći znanja i vještine u području upravljanja i korištenja sredstava iz EU fondova čime će se ekonomski osnažiti šire područje. Također, socijalne interakcije dovest će do uspostavljanja povjerenja među dionicima koja ima potencijal potaknuti na zadružne oblike organiziranja u privredi, a naročito poljoprivredi, čija je proizvodna usitnjenost velika prepreka gospodarskom razvoju područja.</p> <p>Društveni domovi će osim svojih osnovnih funkcija tj. potreba MO i osnovnih društvenih potreba stanovništva naselja imati i funkcije u službi razvoja gospodarstva, turizma, kulture i poljoprivrede.</p> <p>Društveni domovi će u budućnosti moći imati i multifunkcionalnu svrhu. Mogući sadržaji su: ugostiteljski objekt ili kafić, vinoteka u kojoj bi bila izložena sva vina s područja grada Benkovca, priručna kuhinja, sanitarni čvor, prostor za moguću proizvodnju vina ili vinski podrum i sl. Ovakvi sadržaji poslužili bi za razvoj vinskih cesta u budućnosti.</p> <p>Nadalje osim turističkih sadržaja budući obnovljeni domovi biti će korišteni i u edukativno-kulturne svrhe kao mjesta okupljanja i poticanja sveukupnih aktivnosti gospodarskog i društvenog života. Ovime će novi sadržaji između ostalog biti i podrška arheološkom i kulturnom turizmu u procesu eksperimentalne arheologije ali i drugih tema. Ovime bi zgrade domova mogle biti obogaćene suvenircicama, izložbenim prostorom, knjižnicom-čitaonicom i sl.</p> <p>Osim navedenog domovi će biti ujedno i:</p> <p>-prostor za OPG-e i eko proizvodnju ( informativno marketinški punkt )</p>
--	---

	<p>-prostor za tematiku seoskog i eko turizma, uređenja biciklističkih staza (lokalno putevima bunara, vinskih cesta, puteva maslina, vodenica, vidikovaca.) i šire biciklom Benkovac- Obrovac -Velebit i natrag</p> <p>-prostor za podršku svim proizvodnjama koje se mogu aktivirati u mjestu a dio su djelatnosti koje obavljaju stanovnici ili će ih razviti kao buduće programe (hladnjače, sušionice, proizvodnja zdrave hrane : džemova , sokova, sušenog i svježeg voća)</p> <p>Ovaj projekt je u skladu sa <b>Strateškim programom ukupnog razvoja Grada Benkovca 2012.-2016.</b> koji identificira kao zasebnu mjeru ovo temu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekonstruirati i dograditi društvene domove u naseljima na području Grada Benkovca</li> </ol> <p>Također, projekt doprinosi ostvarenju sva tri razvojna cilja <b>Programa:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uspješno gospodarstvo</li> <li>2. Očuvanje i održivo korištenje resursa</li> <li>3. Visoka kvaliteta usluga stanovništvu</li> </ol>
<b>Aktivnosti grupirane po EP:</b>	<p><b>EP 1 Priprema dokumentacije</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa</li> <li>1.2. Raspisivanje natječaja za izradu dokumentacije</li> <li>1.3. Izrada projektne dokumentacije uključujući studiju izvodivosti</li> <li>1.4. Ishođenje građevinske dozvole</li> <li>1.5. Izrada elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš</li> </ol> <p><b>EP 2 Građevinski radovi i opremanje</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Raspisivanje javne nabave za izvođenje građevinskih radova</li> <li>2.2. Raspisivanje javne nabave za građevinski nadzor nad izvođenjem radova</li> <li>2.3. Raspisivanje javne nabave za energetski pregled i certificiranje</li> <li>2.4. Provedba ugovora za izvođenje radova (zgrada i okoliš)</li> <li>2.5. Provedba ugovora o građevinskem nadzoru nad izvođenjem radova</li> <li>2.6. Provedba energetskog pregleda i certificiranja</li> <li>2.7. Raspisivanje javne nabave za opremanje objekta</li> <li>2.8. Provedba ugovora o opremanju objekta</li> <li>2.9. Opremanje čitaonice/učionice</li> <li>2.10. Opremanje dječje igraonice</li> <li>2.11. Opremanje kuhinje</li> <li>2.12. Opremanje uredske prostorije</li> <li>2.13. Opremanje sobe za sastanke</li> <li>2.14. Opremanje izložbenih prostora</li> <li>2.15. Opremanje suvenirnica</li> </ol>

	<p><b>EP 3 Jačanje kapaciteta MO i obogaćivanje sadržaja domova</b></p> <p>3.1. Uspostava upravljačke strukture na razini nadležnih mjesnih odbora</p> <p>3.2. Ospozobljavanje članova upravljačke strukture u području upravljanja imovinom, procedura nabave i financija</p> <p>3.2. Organizacija posjeta funkcionalnim i aktivnim društvenim domovima u područjima sa sličnim socijalnim obilježjima u cilju stjecanja praktičnih uvida</p> <p>3.3. Osmišljavanje sadržaja domova</p> <p><b>EP 4 Promidžba i vidljivost</b></p> <p>4.1. Promocija projekta – početna i završna konferencija za tisak, letak, objava vijesti o projektu na postojećim mrežnim stranicama Grada Benkovca te izrada svi popratnih materijala definiranih Uputama za korisnike za razdoblje 2014.-2020.: Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata (Zagreb, svibanj 2015. MRRFEU)</p> <p>4.2. Promocija mreže domova i novih sadržaja</p> <p><b>EP 5 Upravljanje i administracija</b></p> <p>5.1. Sastanci projektnog tima</p> <p>5.2. Izvještavanje</p> <p>5.3. Financijsko upravljanje projektom</p> <p>5.4. Upravljanje aktivnostima projekta</p> <p>5.5. Upravljanje procesom javne nabave</p> <p>5.6. Financijska revizija projekta</p> <p>5.7. Vanjska evaluacija projekta</p>
<b>Ključni rezultati:</b>	- Obnovljena/izgrađena 4 društvena doma u mikrolokacijama/središtima s proširenim funkcijama
<b>Pokazatelji:</b>	<b>Izgrađena ili obnovljena infrastruktura: 4</b>
<b>Upravljanje projektom (opisati tim uključujući zaposlene i nova zapošljavanja):</b>	<p>Projektni tim:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Voditelj/ica projekta: 12%</li> <li>2. Koordinator/ica radova: 25%</li> <li>3. Administrativni referent/ica: 6%</li> <li>4. Financijsko-računovodstveni referent/ica: 6%</li> <li>5. Stručnjak/inja za javnu nabavu: 2%</li> </ol> <p>Novo zapošljavanje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stručnjak za kulturno turističke sadržaje i proizvode 30% novozaposleni (ostatak od 70% raspoređeno je po drugim projektima sa relevantnim sadržajem)</li> </ol>
<b>Trajanje:</b>	<b>Priprema tehničke dokumentacije: 12 mjeseci</b>

	<b>Izgradnje/rekonstrukcija/opremanje:</b> 24 mjeseca  <b>Osmišljavanje sadržaja:</b> 3 – 6 mjeseci (može se odvijati paralelno s obnovom i opremanjem)																																																																																														
<b>Održivost:</b>	<p>Održivost se očituje u više segmenata:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Socijalno/demografska održivost:</b> zadržavanje postojećeg stanovništva i privlačenje novog u Benkovac zbog boljih uvjeta kulturno-društvenih sadržaja za stanovnike općenito.</li> <li><b>Finansijska i okolišna održivost:</b> obnovom i stavljanjem u turističku funkciju graditeljskog nasljeđa, otvoriti će se nova poduzeća i nova radna mjesta kako u građevinskom tako i u turističkom sektoru što će osigurati dosta prihode za stanovništvo i poduzetnike te nastavno na to i prihode za lokalni proračun. Tim prihodima će se osigurati održavanje graditeljskog nasljeđa. Mreža tematskih ruta koje će biti pozicionirane na način da prolaze pored važnih prirodnih i kulturno-turističkih znamenitosti će osigurati tim točkama znatno veći broj posjetitelja koji će kupovati njihove proizvode (kulturne, gastronomске, enološke, suvenire i sl.) te će na taj način osigurati razvoj poduzetništva i povećanje prihoda od turizma (javni i privatni sektor). Obnovljenom i izgrađenom infrastrukturom upravljati će Grad Benkovac i TZ.</li> <li><b>Okolišna održivost:</b> zbog bolje toplinske izolacije trošiti će se manje energenata što će smanjiti potrošnju neobnovljivih izvora energije, a time i emisije stakleničkih plinova.</li> <li><b>Turistička održivost:</b> kulturno-zabavne sadržaje će moći konzumirati i posjetitelji. Ljeti, kada je veći dotok turista, će se organizirati komercijalni sadržaji u dvorištu Doma kulture koji će biti namijenjeni posjetiteljima te kroz koje će se prezentirati benkovački običaji, gastro i eno scena kao i muzički izričaj dalmatinskog kraja.</li> </ol>																																																																																														
<b>Terminski plan provedbe projekta</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">2017</th> <th colspan="4">2018</th> <th colspan="4">2019</th> <th colspan="4">2020</th> <th colspan="4">2021</th> </tr> <tr> <th>3. kv</th> <th>4. kv</th> <th>1. kv</th> <th>2. kv</th> <th>3. kv</th> <th>4. kv</th> <th>1. kv</th> <th>2. kv</th> <th>3. kv</th> <th>4. kv</th> <th>1. kv</th> <th>2. kv</th> <th>3. kv</th> <th>4. kv</th> <th>1. kv</th> <th>2. kv</th> <th>3. kv</th> <th>4. kv</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Idejno rješenje</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Rješavanje imovinsko pravnih odnosa</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Elaborat o procjeni utjecaja na okoliš</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		2017		2018				2019				2020				2021				3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	Idejno rješenje																			Rješavanje imovinsko pravnih odnosa																			Elaborat o procjeni utjecaja na okoliš																														
	2017		2018				2019				2020				2021																																																																																
	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv																																																																													
Idejno rješenje																																																																																															
Rješavanje imovinsko pravnih odnosa																																																																																															
Elaborat o procjeni utjecaja na okoliš																																																																																															

	Plan upravljanja domovima																	
	Geodetski projekt																	
	Idejni projekt																	
	Studija izvedivosti																	
	Glavni projekt																	
	Izvedbeni projekt																	
	Izrada prijavnog obrasca za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava																	
	JN za izvođenje građevinskih radova																	
	JN za građevinski nadzor nad izvođenjem radova																	
	JN za opremanje																	
	Provjedba ugovora za izvođenje radova																	

	Provđba ugovora o građevinskom nadzoru nad izvođenjem radova														
	Provđba ugovora o opremanju														
	Uporabna dozvola														
	Osmišljavanje programa i Jačanje kapaciteta MO														
Nazivi skica, fotografija i drugih grafičkih prikaza projektnih ideja															

NAZIV PROJEKTA	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE POSLOVNE ZONE BENKOVAČKO SELO
Lokacija projekta	Lokacija je određena DPU PZ Benkovačko Selo, <a href="https://goo.gl/maps/gCPEQvrCkkk">https://goo.gl/maps/gCPEQvrCkkk</a>
Vrsta projekta:	Glavni
Razvojni prioritet:	2RP: Os razvoja - Razvoj Benkovca kao centra poduzetništva Ravnih Kotara i Bukovice
Opći cilj:	<p>1. Prostorni:</p> <p>“ Iskoristiti potencijale prostornog značaja Grada Benkovca kroz očuvanje i održivo korištenje prostornih resursa.</p> <p>3. Gospodarski:</p>

	„ Povećati kapacitete na području Grada Benkovca za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, s naglaskom na poljoprivrednu i ekološku proizvodnju, prerađivačke djelatnosti, trgovinu i održivi turizam.
<b>Specifični cilj:</b>	Izgradnja infrastrukture u PZ Benkovačko selo: unutarnje cestovne mreže i priključka na državnu cestu, telekomunikacijske mreže, elektroenergetske mreže, javne rasvjete, vodovodne mreže, sustava odvodnje i sustava plinoopskrbe te spajanje odvodnje na postojeći kolektor (smješten ispod željezničke pruge).
<b>Planska domena:</b>	<b>Okoliš, krajolik i upravljanje prirodnim resursima; industrija i poduzetničko okruženje</b>
<b>Vrijednost:</b>	<b>Trošak pripreme projektne dokumentacije:</b> 300.000,00 kn uključujući PDV  <b>Trošak građevinskih radova i opremanja:</b> 15.000.000,00 uključujući PDV  <b>Ukupna vrijednost projekta:</b> <b>15.300.000,00 kn uključujući PDV</b>
<b>Financiranje:</b>	EFRR 85%  Javni (vlastiti) izvori 15%
<b>Prijavitelj:</b>	Grad Benkovac
<b>Iskustvo prijavitelja za provedbu projekata:</b>	Grad Benkovac je od 2002. godine do danas sudjelovao, kao prijavitelj ili partner, u provedbi 10 projekata financiranih iz sredstava Europske unije, sa ukupnom vrijednošću većom od 3.500.000,00 eura.  Dodatno, Grad Benkovac je od 1997. godine proveo 40 projekata financiranih iz nacionalnih sredstava sa ukupnom vrijednošću većom od 16.000.000,00 eura.
<b>Partneri:</b>	Vodovod i odvodnja d.o.o, EVN i HEP d.o.o.
<b>Ciljane skupine / krajnji korisnici</b>	<b>Ciljane skupine:</b>  Sadašnji i potencijalni mali i srednji poduzetnici nastanjeni u zoni,  <b>Krajnji korisnici:</b>  Sadašnji i potencijalni mali i srednji poduzetnici nastanjeni u zoni, stanovnici 10 susjednih općina i stanovnici Grada Obrovca (općine Novigrad, Posedarje, Donji Zemunik, Škabrnja, Polača, Pakoštane, Kistanje, Lišane Ostrovičke, Stankovci te Sveti Filip i Jakov), Udruženje obrtnika Benkovac, Grad Benkovac, Zadarska županija, nezaposleni na području Grada Benkovca i ostatka Zadarske županije  Trenutno su u zoni nastanjena 3 MSP:  IPSE d.o.o., Kamen Benkovac d.o.o. i Ceste Zadarske županije d.o.o.
<b>Zrelost projekta:</b>	Projektna ideja;  Izrađen DPU i parcelacija prometnih koridora i građevinskih parcela za planirane trafostanice  Za izradu tehničke dokumentacije potrebno je manje od 6 mjeseci

	Radi se o zemljištu u vlasništvu RH i potrebno je iznaci način rješavanja imovinsko-pravnih odnosa kojim će se omogućiti izgradnja infrastrukture predviđena projektom.
<b>Investicijski ciklus projekta:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Idejno rješenje</li> <li>2. Rješavanje imovinsko pravnih odnosa</li> <li>3. Elaborat o procjeni utjecaja na okoliš</li> <li>4. Geodetski projekt</li> <li>5. Idejni projekt<sup>10</sup></li> <li>6. Studija izvedivosti</li> <li>7. Glavni projekt</li> <li>8. Ishođenje građevinske dozvole</li> <li>9. Izraditi UPU</li> <li>10. Izvedbeni projekt</li> <li>11. Izrada prijavnog obrasca za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava</li> <li>12. Javna nabava za izvođenjem građevinskih radova</li> <li>13. Javna nabava za građevinski nadzor nad izvođenjem radova</li> <li>14. Provedba ugovora za izvođenje radova</li> <li>15. Provedba ugovora o građevinskom nadzoru nad izvođenjem radova</li> <li>16. Tehnički pregled</li> <li>17. Uporabna dozvola</li> <li>18. Plan upravljanja zonom</li> <li>19. Promocija</li> </ol>
<b>Provedbeni mehanizam:</b>	Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga EFRR

<sup>10</sup> Ishođenje lokacijske dozvole ukoliko se ne riješe imovinsko pravni odnosi

<b>Obrazloženje projekta</b>	<p>Za poslovnu zonu Benkovačko Selo izrađen je Detaljni plan uređenja te je izvršena parcelacija prometnih koridora i građevinskih parcela za planirane trafostanice. Predviđeni prostor za poslovnu zonu prostire se na površini od 37 ha. Unutar obuhvata planirano je 30 građevinskih parcela namijenjenih za: izgradnju građevina proizvodne namjene (pretežito zanatske), izgradnju manjih proizvodnih pogona sa naglaskom na tradicionalnu proizvodnju (proizvodnja kamena, poljoprivrednih proizvoda). Uz ovo mogu biti izgrađeni i drugi uslužni sadržaji: trgovine, parkirališni sadržaji, garaže, sportski sadržaji.</p> <p><b>Od infrastrukture predviđena je gradnja: unutarnje cestovne mreže i priključka na državnu cestu, telekomunikacijske mreže, elektroenergetske mreže, javne rasvjete, vodovodne mreže, sustava odvodnje i sustava plinoopskrbe te spajanje odvodnje na postojeći kolektor (smješten ispod željezničke pruge).</b></p> <p>Realizacijom ovoga projekta, sadašnji i potencijalni korisnici imat će potpuno opremljenu infrastrukturu za početak poslovanja i stvaranje profita za sebe kao i za zajednicu. To će otvoriti mogućnost za novo zapošljavanje smanjujući stopu nezaposlenosti. Nezaposlene osobe imat će pristup radnim mjestima u mjestu prebivališta ili susjednoj općini.</p> <p>Županijska razvojna strategija Zadarske županije 2011.-2013. definira četiri strateška cilja od čega se dva mogu direktno povezati s ovim projektom:</p> <p><b>STRATEŠKI CILJ 2</b></p> <p><i>Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva</i></p> <p><b>STRATEŠKI CILJ 4</b></p> <p><i>Unaprjeđenje zaštite okoliša i kvalitete života</i></p> <p>S obzirom na dijelove infrastrukture poput bio pročistača i sunčane elektrane možemo ustvrditi da projekt ima elemente energetske učinkovitosti koja je tema svih strateških dokumenata na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini. Operativni programi, osobito OPKK prepoznaje ju kao iznimno važnu.</p> <p><b>Strateški program ukupnog razvoja Grada Benkovca 2012.-2016.</b> kao jednu od važnih tema razrađuje poslovne zone i njihovu ulogu u razvoju gospodarstva. Zbog važnosti teme izdvaja kao zasebnu mjeru:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nastaviti izgrađivati komunalnu infrastrukturu za potrebe poduzetnika u poslovnim zonama</li> </ol> <p>Također, projekt doprinosi ostvarenju sva tri razvojna cilja <b>Programa:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uspješno gospodarstvo</li> <li>2. Očuvanje i održivo korištenje resursa</li> <li>3. Visoka kvaliteta usluga stanovništvu</li> </ol>
<b>Aktivnosti grupirane po EP:</b>	<p><b>EP 1 Priprema dokumentacije</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izmjene i dopune DPU-a</li> <li>2. Izrada nedostajuće projektne dokumentacije uključujući studiju izvedivosti</li> <li>3. Ishođenje građevinske dozvole</li> <li>4. Izrada elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš</li> </ol>

	<p><b>EP 2 Građevinski radovi</b></p> <p>2.1. Raspisivanje javne nabave za izvođenje građevinskih radova      2.2. Raspisivanje javne nabave za građevinski nadzor nad izvođenjem radova      2.3. Provedba ugovora za izvršenje radova na infrastrukturi      2.4. Provedba ugovora o građevinskom nadzoru nad izvođenjem radova</p> <p><b>EP 3 Promidžba i vidljivost</b></p> <p>3.1. Promocija projekta – početna i završna konferencija za tisak, letak, objava vijesti o projektu na postojećim mrežnim stranicama Grada Benkovca te izrada svi popratnih materijala definiranih Uputama za korisnike za razdoblje 2014.-2020.: Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata (Zagreb, svibanj 2015. MRRFEU)      3.2. Marketinške aktivnosti (izdavanje brošure, uređenje web stranice)      3.3. Radionica o podizanju svijesti o potrebi očuvanju okoliša a posebno zaštite voda</p> <p><b>EP 4 Upravljanje i administracija</b></p> <p>4.1. Sastanci projektnog tima, izvještavanje, revizija      4.2. Izrada plana upravljanja zonom</p>
<b>Ključni rezultati:</b>	- izgrađena infrastruktura je u funkciji
<b>Pokazatelji:</b>	<p><b>Izgrađena ili obnovljena infrastruktura: 1</b></p> <p><b>Sudionici koji imaju posao, uključujući samozaposlene, po prestanku sudjelovanja: 1</b></p>
<b>Upravljanje projektom (opisati tim uključujući zaposlene i nova zapošljavanja):</b>	<p>Projektni tim:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Voditelj/ica projekta: 12%</li> <li>2. Koordinator/ica radova: 25%</li> <li>3. Administrativni referent/ica: 6%</li> <li>4. Finansijsko-računovodstveni referent/ica: 6%</li> <li>5. Stručnjak/inja za javnu nabavu: 2%</li> </ol> <p>Novo zapošljavanje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upravitelj PZ 100%</li> </ol>
<b>Trajanje:</b>	<p>Izrada dokumentacije: 9 mjeseci</p> <p>Izrada infrastrukture: 12 mjeseci</p>
<b>Održivost:</b>	Održivost se očituje u više segmenata:

	<p>1. <b>Socijalno/demografska održivost:</b> Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za rad postojećih poduzeća i otvaranje novih poduzeća koja eksploriraju i prodaju benkovački kamen koja će zapošljavati novu radnu snagu što će osigurati ostanak stanovništva u Gradu Benkovcu i privlačenje novog jer će im se osigurati radna mjesta.</p> <p>2. <b>Finansijska i upravljačka održivost:</b> Zbog smanjenja troškova prijevoza smanjit će se ulazni troškovi u poduzećima koja se bave eksploracijom i prodajom benkovačkog kamen, a koja će biti smještena u PZ što će kao posljedicu imati nižu i konkurentniju cijenu finalnog proizvoda te osigurati nove klijente, a vjerojatno i povećan izvoz proizvoda. Zbog smanjenog prometa kamiona koji trenutno lokalnim cestama prevoze kamen će se uštedjeti na čestoj obnovi kolnika.</p> <p>3. <b>Okolišna održivost:</b> S obzirom da će se smanjiti prijevoz kamena, trošit će se manje energenata što će utjecati na smanjenje zagađenja i emisije CO2 i SO2. Sunčana elektrana i biološko pročišćavanje otpadnih voda doprinijet će energetskoj učinkovitosti i očuvanju prirode kroz korištenje obnovljivih izvora energije.</p> <p>4. <b>Turistička održivost:</b> S obzirom da će se poduzeća dislocirati iz Grada Benkovca, stanovništvo će se moći baviti turizmom što sada na pojedinim dijelovima Grada nije moguće zbog buke i prašine koji prate ovu industriju.</p>																			
<b>Terminski plan provedbe projekta</b>			2017		2018		2019		2020		2021									
			3. k v	4. k v	1. k v	2. k v	3. k v	4. k v	1. k v	2. k v	3. k v	4. k v	1. k v	2. k v	3. k v	4. k v	1. . . k v	2. . . k v	3. . . k v	4. . . k v
Idejno rješenje																				
Rješavanje imovinsko pravnih odnosa																				
Elaborat o procjeni utjecaja na okoliš																				
Plan upravljanja zonom																				
Geodetski projekt																				
Idejni projekt																				
Studija izvedivosti																				
Glavni projekt																				
Izvedbeni projekt																				

	JN za izvođenje građevinskih radova												
	JN za građevinski nadzor nad izvođenjem radova												
	Provjeda ugovora za izvođenje radova												
	Provjeda ugovora o građevinskom nadzoru nad izvođenjem radova												
	Tehnički pregled												
	Uporabna dozvola												
	Promocija												
<b>Nazivi skica, fotografija i drugih grafičkih prikaza projektnih ideja</b>													

<b>NAZIV PROJEKTA</b>	<b>REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH I IZGRADNJA NOVIH DJEČJA IGRAIŠTA</b>
<b>Lokacija projekta</b>	Potrebno je izraditi kartu na kojoj će biti ucrtana sva dječja igrališta u Gradu Benkovcu.
<b>Vrsta projekta:</b>	Komplementarni
<b>Razvojni prioritet:</b>	<b>1RP: Os razvoja: Razvoj Benkovca kao centra društvenog života Ravnih Kotara i Bukovice</b>
<b>Opći cilj:</b>	<p><b>1. Prostorni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“ Iskoristiti potencijale prostornog značaja Grada Benkovca kroz očuvanje i održivo korištenje prostornih resursa.</li> </ul> <p><b>2. Društveni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“ Ojačati ulogu Grada Benkovca kao središta društvenog života Ravnih Kotara i Bukovice te povećati životni standard građana.</li> </ul>
<b>Specifični cilj:</b>	Izgradnja dječjih igrališta radi podizanja kvalitete života stanovnika Benkovca.
<b>Planska domena:</b>	<b>Društvene djelatnosti, usluge u zajednici, odgoj i obrazovanje; Mobilnost, promet i stanovanje</b>
<b>Vrijednost:</b>	<b>Trošak pripreme projektne dokumentacije:</b> 50.000,00 kn uključujući PDV

	<p>Trošak infrastrukturnih radova i opremanja: 250.000,00 uključujući PDV</p> <p><b>Ukupna vrijednost projekta: 300.000,00 kn uključujući PDV</b></p>
<b>Financiranje:</b>	<p>EFRR 85%</p> <p>Javna (privatna) sredstva 15%</p>
<b>Prijavitelj:</b>	Grad Benkovac
<b>Iskustvo prijavitelja za provedbu projekata:</b>	<p>Grad Benkovac je od 2002. godine do danas sudjelovao, kao prijavitelj ili partner, u provedbi 10 projekata financiranih iz sredstava Europske unije, sa ukupnom vrijednosti većom od 3.500.000,00 eura.</p> <p>Dodatno, Grad Benkovac je od 1997. godine proveo 40 projekata financiranih iz nacionalnih sredstava sa ukupnom vrijednošću većom od 16.000.000,00 eura.</p>
<b>Partneri:</b>	-
<b>Ciljane skupine / krajnji korisnici</b>	<p><b>Ciljane skupine:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“ Predškolska djeca</li> <li>“ Školska djeca</li> </ul> <p><b>Krajnji korisnici:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“ Stanovnici Grada Benkovca</li> <li>“ Vrtići i škole – djeca</li> <li>“ Turisti</li> </ul>
<b>Zrelost projekta:</b>	Za izradu tehničke dokumentacije potrebno je manje od 6 mjeseci
<b>Investicijski ciklus projekta:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izrada potrebne dokumentacije (projekt hortikulturnog uređenja – glavni projekt prema pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima)</li> <li>2. Izrada prijavnog obrasca za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava</li> <li>3. Javna nabava za izvođenje građevinskih radova</li> <li>4. Javna nabava za građevinski nadzor nad izvođenjem radova</li> <li>5. Provedba ugovora za izvođenje radova (izgradnja, ograđivanje i opremanje dječjih igrališta)</li> <li>6. Provedba ugovora o građevinskom nadzoru nad izvođenjem radova</li> <li>7. Izrada plana održavanja dječjih igrališta (mjere sigurnosti)</li> </ol>
<b>Provodenbeni mehanizam:</b>	Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga
<b>Obrazloženje projekta</b>	<p>Grad Benkovac u 4 naselja ima izgrađena dječja igrališta dok u 37 naselja nema dječjeg igrališta. U naselju Benkovac izgrađena su dva dječja igrališta, jedno je izgrađeno u centru i jedno u dijelu grada Barice.</p> <p>Napravljena je analiza broja male djece po naseljima te je utvrđeno gdje, s obzirom na potrebe/količinu djece, treba planirati izgradnju dječjih igrališta.</p> <p>Postoji potreba za izgradnjom 10 dječjih igrališta u sljedećim naseljima rangiranima sukladno podacima iz popisa stanovništva o broju djece u dobi od 0-14 godina:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vukšić</li> </ol>

	<p>2. Raštević 3. Tinj 4. Miranje 5. Korlat 6. Nadin 7. Pristeg 8. Šopot 9. Lisičić 10. Smilčić</p> <p>Postoji potreba za dodatnim opremanjem i obnovom postojećih dječjih igrališta u naseljima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Benkovac</li> <li>2. Benkovačko Selo</li> <li>3. Buković</li> <li>4. Gornje Biljane</li> </ul> <p>Projekt je u skladu sa <b>Strateškim programom ukupnog razvoja Grada Benkovca 2012.-2016.</b> te doprinosi ostvarenju dva od tri razvojna cilja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Očuvanje i održivo korištenje resursa</li> <li>2. Visoka kvaliteta usluga stanovništvu</li> </ul> <p>Strateškim programom definira niz mjera kojima doprinosi ostvarenju cilja Strateškog programa. Jedna od mjera odnosi se i na ovaj projekt:</p> <p>Proširiti kapacitet športsko-rekreativnih centara na području Grada Benkovca</p>
Aktivnosti grupirane po EP:	<p><b>EP 1 Priprema dokumentacije</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1. Identificirati lokacije za nova igrališta</li> <li>1.2. Izraditi glavne projekte</li> <li>1.3. Raspisati javnu nabavu za projektiranje novih i starih igrališta</li> <li>1.4. Izrada elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja za okoliš</li> </ul> <p><b>EP 2 Građevinski radovi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1. Raspisati javnu nabavu za izvođenje radova i opremanje za nova i postojeća igrališta</li> <li>2.2. Raspisati javnu nabavu za građevinski nadzor nad izvođenjem radova</li> <li>2.3. Provedba ugovora za izvođenju radova i opremanje</li> <li>2.4. Provedba ugovora o građevinskom nadzoru nad izvođenjem radova</li> </ul> <p><b>EP 3 Promidžba i vidljivost</b></p>

	<p>3.1. Promocija projekta – početna i završna konferencija za tisak, letak, objava vijesti o projektu na postojećim mrežnim stranicama Grada Benkovca te izrada svi popratnih materijala definiranih Uputama za korisnike za razdoblje 2014.-2020.: Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata (Zagreb, svibanj 2015. MRRFEU)</p> <p>3.2. Radionice za djecu i roditelje o važnosti bavljenja sportom i pravilima ponašanja</p> <p><b>EP 4 Upravljanje i administracija</b></p> <p>4.1. Sastanci projektnog tima</p> <p>4.2. Izvještavanje</p> <p>4.3. Financijsko upravljanje projektom</p> <p>4.4. Upravljanje projektnim aktivnostima</p> <p>4.5. Upravljanje postupkom javne nabave</p> <p>4.6. Financijska revizija projekta</p>
<b>Ključni rezultati:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Osnovljeno 6 dječjih igrališta u Gradu Benkovcu</li> <li>- Izgrađeno 10 novih igrališta u Gradu Benkovcu</li> </ul>
<b>Pokazatelji:</b>	<b>Izgrađena ili obnovljena infrastruktura: 16</b>
<b>Upravljanje projektom (opisati tim uključujući zaposlene i nova zapošljavanja):</b>	<p>Projektni tim:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Voditelj/ica projekta: 12%</li> <li>2. Koordinator/ica radova: 25%</li> <li>3. Administrativni referent/ica: 6%</li> <li>4. Financijsko-računovodstveni referent/ica: 6%</li> <li>5. Stručnjak/inja za javnu nabavu: 2%</li> </ol>
<b>Trajanje:</b>	<p>Izrada potrebne tehničke dokumentacije za sva igrališta: 6 mjeseci</p> <p>Izgradnja/obnova i opremanje: 12 mjeseci</p>
<b>Održivost:</b>	<p>Održivost se očituje u više segmenata:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Socijalna/demografska održivost:</b> Ovim projektom mladim obiteljima s djecom biti će osigurani kvalitetniji uvjeti života te će se potencijalno manje mladih obitelji odlučiti na odlazak iz Grada.</li> <li>2. <b>Financijska i upravljačka održivost:</b> izgrađenom i obnovljenom infrastrukturom upravljati će Grad Benkovac a održavanje će biti financirano, redovito, iz proračunskih sredstava.</li> <li>5. <b>Okolišna održivost:</b> prilikom izrade tehničke dokumentacije, u projektnom zadatku će se jasno naglasiti da se treba voditi briga o utjecaju na okoliš te o svim relevantnim elementima vezanim uz utjecaj na okoliš. Tijekom radova zahvati će biti provedeni na način da su u potpunosti u suglasnosti sa, tada važećim, relevantnim zakonskim okvirom vezanim uz utjecaj na okoliš.</li> <li>3. <b>Turistička održivost:</b> Obnovljena infrastruktura primarno će služiti lokalnom stanovništvu. Međutim, posredno će i turisti koji Benkovac posjećuju s djecom moći koristiti dječja igrališta.</li> </ol>

Terminski plan provedbe projekta																				
	2017		2018				2019				2020				2021					
	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv														
Izraditi glavne projekte																				
Izrada prijavnog obrasca za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava																				
Javna nabava za projektiranje i opremanje novih i starih igrališta																				
Javna nabava za građevinski nadzor nad izvođenjem radova																				
Provđba ugovora o izvođenju radova i opremanju																				
Promocija projekta																				
Radionice za djecu i roditelje o važnosti																				

	bavljenja sportom, sigurnosti i pravilima ponašanja														
<b>Nazivi skica, fotografija i drugih grafičkih prikaza projektnih ideja</b>															

Projekti koji su prikazani u sljedećim detaljnim projektnim obrascima nisu bili dio prioritizacije:

NAZIV PROJEKTA	OTVORENI POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA MSP-A
Lokacija projekta	Područje Grada Benkovca
Vrsta projekta:	Program dodjele bespovratnih sredstava
Razvojni prioritet:	2RP: Os razvoja - Razvoj Benkovca kao centra poduzetništva Ravnih Kotara i Bukovice
Opći cilj:	Povećati kapacitete na području Grada Benkovca za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, s naglaskom na poljoprivrednu i ekološku proizvodnju, prerađivačke djelatnosti, trgovinu i održivi turizam.
Specifični cilj:	Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva te poljoprivrednih gospodarstava kroz ulaganja u infrastrukturu i unaprjeđenje usluga i proizvoda
Planska domena:	Industrija i poduzetničko okruženje; Poljoprivreda i ruralni razvoj; Kulturno nasljeđe i turizam
Vrijednost:	UKUPNO: 17 mil. kn
Financiranje:	EFRR; stope sufinanciranja određuju se u fazi pripreme poziva obzirom na elemente državnih potpora i inteziteta potpore
Prijavitelj:	MSP, obrti i OPG-i sa područja grada Benkovca
Iskustvo prijavitelja za provedbu projekata:	np
Partneri:	np
Ciljane skupine / krajnji korisnici	MSP, obrti i OPG-i sa područja grada Benkovca
Zrelost projekta:	Projekt je razvijen na programskoj razini. Potrebna je izrada Uputa za prijavitelje i ostale natječajne dokumentacije.

	Za izradu tehničke dokumentacije potrebno je do 6 mjeseci.
<b>Investicijski ciklus projekta:</b>	np
<b>Provedbeni mehanizam:</b>	Otvoreni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava
<b>Obrazloženje projekta</b>	<p>Gospodarski razvoj Grada Benkovca baziran je prije svega na prerađivačkoj industriji i trgovini na veliko i malo, ali uz to veoma važan faktor razvoja benkovačkog područja je i tradicionalno rasprostranjena poljoprivredna djelatnost (ratarstvo i stočarstvo) te eksplatacija kamena.</p> <p>2014.godine u Benkovcu je poslovalo 108 poduzetnika sa ukupnim brojem od 933 zaposlenih. Iste te godine, na području Grada Benkovca poslovalo je i 122 obrta.</p> <p>Turizam na području Grada Benkovca može se promatrati kroz 4.683 dolazaka u 2015.godini, te ukupno 39.544 ostvarena noćenja. S obzirom na blizinu nacionalnih parkova Paklenica i Krka, te dobru prometnu povezanost postoji potencijal za značajan razvoj ove ekonomski grane.</p> <p>U ovom trenutku na području Grada Benkovca nedostupni su uvjeti za razvoj poduzetništva – od opremljene infrastrukture poslovnih zona do kontinuirane savjetodavne i edukativne potpore postojećim i poduzetnicima početnicima.</p>
<b>Aktivnosti grupirane po EP:</b>	np
<b>Ključni rezultati:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Povećani proizvodni kapaciteti i poslovna konkurentnost poduzetnika na području Grada Benkovca</li> <li>- Pripremljena infrastruktura za razvoj novoosnovanih poduzeća</li> <li>- Podignuta razina opremljenosti i kompetentnosti obrtnika za kvalitetniji nastup na tržištu</li> <li>- Nadopunjena i dodatno razvijena turistička ponuda</li> <li>- Povećana konkurentnost OPG-a</li> <li>- Proведен poziv za dodjelu bespovratnih sredstava</li> </ul>
<b>Pokazatelji:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poduzeća koja primaju potporu u bilo kojem obliku iz EFRR (bez obzira predstavlja li potpora državnu potporu ili ne): 30</li> </ol>
<b>Prihvatljive aktivnosti prijavitelja:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ulaganje u materijalnu imovinu</li> <li>2. Ulaganje u nematerijalnu imovinu</li> <li>3. Ulaganje u marketing i promociju proizvoda</li> <li>4. Ulaganje u edukaciju</li> <li>5. Savjetodavne usluge neophodne za projekt</li> </ol>
<b>Prihvatljivi troškovi:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- troškovi gradnje/rekonstrukcije poslovnih prostora</li> <li>- troškovi gradnje/rekonstrukcije prostora za najam u turističke svrhe (smještajni kapaciteti)</li> <li>- troškovi novih strojeva, postrojenja i opreme</li> <li>- troškovi uređenja i opremanja objekta/radionice</li> <li>- troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver i softver)</li> <li>- troškovi nabave patenata, autorskih prava i sl.</li> <li>- troškovi marketinških aktivnosti</li> <li>- troškovi usavršavanja</li> </ul>

	<p>- troškovi upravljanja projektom, provedbe nabave, revizije projekta, izrade projektne dokumentacije, itd.</p> <p>(detaljno će prihvatljivi troškovi biti opisani u Uputama za prijavitelje)</p>																																																																																														
<b>Upravljanje projektom (opisati tim uključujući zaposlene i nova zapošljavanja):</b>	np																																																																																														
<b>Trajanje:</b>	Do iskorištenja sredstava																																																																																														
<b>Održivost:</b>	Sve zaprimljene projektne prijave moraju dokazati sve elemente održivosti.																																																																																														
<b>Terminski plan provedbe projekta</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">2017</th> <th colspan="4">2018</th> <th colspan="4">2019</th> <th colspan="4">2020</th> <th colspan="4">2021</th> </tr> <tr> <th>3. k v</th> <th>4. k v</th> <th>1. k v</th> <th>2. k v</th> <th>3. k v</th> <th>4. k v</th> <th>1. k v</th> <th>2. k v</th> <th>3. k v</th> <th>4. k v</th> <th>1. k v</th> <th>2. k v</th> <th>3. k v</th> <th>4. k v</th> <th>1. k v</th> <th>2. k v</th> <th>3. k v</th> <th>4. k v</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Priprema projekta / natječajne dokumentacije</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Raspisivanje natječaja / ugovaranje</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Provedba projekata</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		2017		2018				2019				2020				2021				3. k v	4. k v	1. k v	2. k v	3. k v	4. k v	Priprema projekta / natječajne dokumentacije																			Raspisivanje natječaja / ugovaranje																			Provedba projekata																														
	2017		2018				2019				2020				2021																																																																																
	3. k v	4. k v	1. k v	2. k v	3. k v	4. k v	1. k v	2. k v	3. k v	4. k v	1. k v	2. k v	3. k v	4. k v	1. k v	2. k v	3. k v	4. k v																																																																													
Priprema projekta / natječajne dokumentacije																																																																																															
Raspisivanje natječaja / ugovaranje																																																																																															
Provedba projekata																																																																																															
<b>Nazivi skica, fotografija i drugih grafičkih prikaza projektnih ideja</b>																																																																																															

<b>NAZIV PROJEKTA</b>	Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za neprofitne organizacije
<b>Lokacija projekta</b>	Područje Grada Benkovca
<b>Vrsta projekta:</b>	Program dodjele bespovratnih sredstava
<b>Razvojni prioritet:</b>	<b>1RP: Os razvoja - Razvoj Benkovca kao centra društvenog života Ravnih Kotara i Bukovice</b>

<b>Opći cilj:</b>	Ojačati ulogu Grada Benkovca kao središta društvenog života Ravnih Kotara i Bukovice te povećati životni standard građana.
<b>Specifični cilj:</b>	Poboljšati društvene i socijalne usluge i sadržaje za bolju kvalitetu života građana Benkovca te povećati mogućnosti za zapošljavanje na području grada Benkovca
<b>Planska domena:</b>	Kulturno nasljeđe i turizam; Društvene djelatnosti, usluge u zajednici, odgoj i obrazovanje
<b>Vrijednost:</b>	15 milijuna HRK
<b>Financiranje:</b>	ESF 100%
<b>Posredničko tijelo razine 1:</b>	Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
<b>Korisnik:</b>	Grad Benkovac
<b>Potencijalni prijavitelji:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Udruge</li> <li>• Ustanove</li> <li>• Grad Benkovac</li> <li>• Trgovačka društva</li> <li>• Zadruge</li> <li>• Potporne poduzetničke institucije</li> <li>• Škole i učilišta u javnom i privatnom vlasništvu</li> </ul>
<b>Ciljane skupine / krajnji korisnici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nezaposleni</li> <li>• Djeca i mladi</li> <li>• Starije osobe</li> <li>• Osobe s invaliditetom</li> <li>• Korisnici minimalne zajamčene naknade</li> </ul>
<b>Zrelost projekta:</b>	<p>Projekt je razvijen na programskoj razini.</p> <p>Potrebna je izrada Uputa za prijavitelje i ostale natječajne dokumentacije.</p> <p>Za izradu tehničke dokumentacije potrebno je do 6 mjeseci.</p>
<b>Provđbeni mehanizam:</b>	Poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
<b>Obrazloženje projekta</b>	Društvene djelatnosti imaju važnu ulogu za život stanovnika i u velikoj mjeri mogu utjecati na smanjenje depopulacije. U Gradu Benkovcu postoje relativno dobro razvijene temeljne usluge za građane uključujući postojanje obrazovnih institucija, organiziranu zdravstvenu skrb, sportske i kulturne sadržaje, broj aktivnih organizacija civilnog društva koje svojim radom doprinose povećanju kvalitete života građana. Ipak, uočavaju se slabosti određenih segmenata društvenog života i usluga: nedostatak razvijenih sadržaja za slobodno vrijeme djece i mladih te s tim povezano loša opremljenost predškolskih i školskih objekata u skladu sa suvremenim standardima, nepostojanje programa cijeloživotnog učenja koji bi pozitivno utjecali na tržište rada, nedostatne usluge za ranjive skupine itd. Isto tako, gospodarska kriza i nizak životni standard nepovoljno utječu na razvoj usluga u zajednici pa se predlaže korištenje dostupnih bespovratnih sredstava za poboljšanje socijalnih usluga u zajednici.

	<p>Dobna struktura stanovništva prati opća negativna kretanja na ovom području o čemu svjedoči i pad mlađe populacije, odnosno porast kod starijeg dijela populacije u posljednja dva popisna razdoblja (2001./2011.). Uz nepovoljnu demografsku sliku, problem za tržište rada predstavlja i neusklađenost ponude i potražnje, odnosno nedovoljno kvalificirane radne snage za postojeće poslove. S druge strane, velik je broj dugotrajno nezaposlenih – posebice marginaliziranih skupina kao što su žene ili mladi.</p> <p>Ključni akteri koji bi mogli pozitivno utjecati na navedene probleme su ustanove i udruge na području Grada Benkovca. Dobro kapacitirane ustanove i udruge koje postoje i djeluju, temelj su provedbe uspješnih programa i projekata u području obrazovnih, rekreativskih, kulturnih, turističkih i socijalnih programa i usluga za građane, te usluga na tržištu rada.</p>
<b>Prihvatljive aktivnosti:</b>	<p>U okviru predloženog programa dodjele bespovratnih sredstava sljedeće aktivnosti se smatraju prihvatljivim. Lista aktivnosti nije konačna te prijavitelji mogu predložiti slične aktivnosti koje doprinose navedenom specifičnom cilju</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upravljanje projektom i administracija;</li> <li>2. Organizacija pomoći u kući za starije i nemoćne osobe kojima je potrebna pomoć</li> <li>3. Osiguravanje usluge osobnog asistenta u okviru svakodnevnih aktivnosti osoba s invaliditetom</li> <li>4. Organiziranje i rad dnevnih i poludnevnih boravaka ili klubova za osobe s invaliditetom i za starije osobe</li> <li>5. Organizacija dodatnih sadržaja za djecu s poteškoćama u razvoju i poremećajima u ponašanju</li> <li>6. Razvoj i organizacija aktivnosti volontiranja za socijalno isključene skupine</li> <li>7. Razvoj kulturne, društveno-korisne, sportske aktivnosti za socijalno isključene skupine</li> <li>8. Razvoj mreže pružatelja socijalnih usluga i jačanje njihovih kapaciteta</li> <li>9. Razvoj i/ili provedba postojećih ili novih socijalnih usluga</li> <li>10. Razvoj i provedba individualiziranih programa osposobljavanja i usavršavanja za ciljne skupine</li> <li>11. Aktivnosti razvoja i pružanja individualiziranih radionica za razvoj socijalno-interpersonalnih vještina potrebnih za podizanje razine zapošljivosti</li> <li>12. Radionice za poticanje socijalne uključenosti usmjerenе posebice na osobe s invaliditetom i dugotrajno nezaposlene osobe</li> <li>13. Poticanje i organiziranje socijalnog poduzetništva kao oblika zapošljavanja ciljanih skupina</li> <li>14. Poticanje samozapošljavanja kroz razvoj poslovnih planova, edukacije o poduzetništvu, pomoći pri pokretanju poslovanja i marketingu</li> <li>15. Razvoj aktivnosti usmjerenih na profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere</li> <li>16. Razvoj i uvođenje novih obrazovnih programa za potrebe razvoja područja</li> <li>17. Aktivnosti osposobljavanja nezaposlenih osoba ciljanih skupina za turističkog vodiča/pratioca</li> <li>18. Razvoj i implementacija novih inovativnih turističkih sadržaja i aktivnosti kao dio šire turističke ponude grada</li> <li>19. Razvoj i organizacija novih kulturnih događanja i manifestacija u gradu</li> <li>20. Razvoj i organizacija sportskih manifestacija i sadržaja za lokalne stanovnike i turiste</li> <li>21. Promicanje zdravih stilova života za sve dobne skupine</li> <li>22. Promicanje volonterizma, volonterskog rada u zajednici</li> <li>23. Aktivnosti regeneracije kroz društveno koristan rad i participaciju građana</li> </ol>

	24. Promidžba i vidljivost
<b>Ključni rezultati:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proведен Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava</li> <li>- Ojačane organizacije civilnog društva na području Grada Benkovca u različitim sektorima</li> <li>- Pružena pomoć stanovnicima iz slijedećih skupina: starije i nemoćne osobe kojima je potrebna pomoć; osobe s invaliditetom, djeca s poteškoćama u razvoju i poremećajima u ponašanju, socijalno isključene skupine, dugotrajno nezaposleni</li> <li>- Podignuta razine zapošljivosti različitih ranjivih skupina</li> <li>- Potaknuti razvoj socijalnog poduzetništva kao oblika zapošljavanja ciljanih skupina</li> <li>- Potaknuto samozapošljavanje te profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere</li> <li>- Uvedeni novi obrazovni programi za potrebe razvoja područja</li> <li>- Razvijeni i u funkciji novi inovativni turistički sadržaji i aktivnosti kao dio šire turističke ponude grada uključujući i kulturne i sportske manifestacije u gradu</li> </ul>
<b>Pokazatelji:</b>	<p>Sudionici koji imaju posao, uključujući samozaposlene, po prestanku sudjelovanja: 15</p> <p>Broj izrađenih programa obrazovanja: 10</p> <p>Broj polaznika obrazovnih programa (nezaposleni uključujući dugotrajno nezaposlene, nezaposleni koji sudjeluju u programu osposobljavanja, pripadnici romske i drugih nacionalnih manjina itd.): 50</p> <p>Broj novozaposlenih osoba: 15</p> <p>Broj osoba obuhvaćenih mjerama socijalnog uključivanja: 25</p> <p>Broj mlađih od 25 godine: 150</p> <p>Broj starijih od 54 godine (nezaposleni uključujući dugotrajno nezaposlene, : 50</p> <p>Broj sudionika s invaliditetom: 20</p> <p>Broj aktivnosti podizanja svijesti/javne kampanje (društveno korisne akcije): 25</p> <p>Broj stručnjaka koji sudjeluju u osposobljavanju: 20</p>
<b>Trajanje:</b>	Do iskorištenja sredstava
<b>Održivost:</b>	Financiranje rezultata projekta nakon njegovog završetka osigurat će organizacije i institucije koje će provoditi projekte i to iz vlastitih sredstava, sredstava JLS i EU fondova. Očekuje se da će kreirane usluge i programi biti dalje provođeni od strane organizacija koje su zadužene za provedbu projekata te da će razina kompetencija za provedbu istih kao i za traženje sredstava za njihovu održivost biti na adekvatnoj razini.
<b>Terminski plan provedbe projekta</b>	

		Godišnji raspored aktivnosti																	
		2017		2018				2019				2020				2021			
		3. k v	4. k v	1. k v	2. k v	3. k v	4. k v	1. k v	2. k v	3. k v	4. k v	1. k v	2. k v	3. k v	4. k v	1. k v	2. k v	3. k v	4. k v
	Priprema projekta / natječajne dokumentacije																		
	Raspisivanje natječaja / ugovaranje																		
	Provjeda projekata																		
<b>Nazivi skica, fotografija i drugih grafičkih prikaza projektnih ideja</b>																			

<b>NAZIV PROJEKTA</b>	Projekt poticanja zapošljavanja (aktivne mjere)
<b>Lokacija projekta<sup>11</sup></b>	Područje Grada Benkovca
<b>Vrsta projekta:</b>	Program dodjele bespovratnih sredstava
<b>Razvojni prioritet:</b>	2RP: Os razvoja - Razvoj Benkovca kao centra poduzetništva Ravnih Kotara i Bukovice
<b>Opći cilj:</b>	Ojačati ulogu Grada Benkovca kao središta društvenog života Ravnih kotara i Bukovice te poboljšati životni standard građana
<b>Specifični cilj:</b>	Promicanje održivog i kvalitetnog zapošljavanja putem poticanja obrazovanja, samozapošljavanja, zapošljavanja, poduzetništva i osnivanja poduzeća.  Povećati broj gospodarskih subjekata i gospodarskih aktivnosti, povećati razinu znanja i vještina poduzetnika i povećanje zapošljavanja

<sup>11</sup> Koristite google maps ili skicirajte lokaciju projekta u odnosu na glavne cestovne pravce i/ili značajnije građevine/naselja

<b>Planska domena:</b>	Sve planske domene
<b>Vrijednost:</b>	8.700.000,00 HRK
<b>Financiranje:</b>	ESF 100%
<b>Posredničko tijelo razine 1:</b>	Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
<b>Korisnik:</b>	Grad Benkovac
<b>Potencijalni prijavitelji:</b>	Subjekti malog gospodarstva koji imaju sjedište odnosno prebivalište na području Grada Benkovca, fizičke osobe mlade i nezaposlene (posebno ranjive skupine)
<b>Ciljane skupine / krajnji korisnici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nezaposlene osobe</li> <li>• Ranjive skupine</li> </ul>
<b>Zrelost projekta:</b>	<p>Projekt je razvijen na programskoj razini.</p> <p>Potrebna je izrada Uputa za prijavitelje i ostale natječajne dokumentacije.</p>
<b>Provedbeni mehanizam:</b>	Izravna dodjela bespovratnih sredstava
<b>Obrazloženje projekta</b>	<p>Grad Benkovac provodit će tri mjere aktivnog poticanja zapošljavanja radi smanjenja stope nezaposlenosti, stvaranja održivih radnih mesta i poticanja razvoja gospodarstva na širem području Grada.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usmjeravanje i podrška samozapošljavanju i poduzetništvu NEET-ova, što obuhvaća posebnosti rada s tom ciljanom skupinom, s naglaskom, između ostalog, na uvođenje koncepta samozapošljavanja i poduzetništva i njihovih različitih oblika, pomoći u procjeni održivosti opcije samozapošljavanja u skladu s karakteristikama i sposobnostima osobe, usmjeravanje i podrška u provođenju ideja u poslovne planove, neprekidna podrška tijekom provedbe, mentoriranja, dalnjih aktivnosti, ali i izravna finansijska potpora pokretanju novih tvrtki (uključujući i mehanizme mikro-kreditiranja i drugih programa zaduživanja). Ovakva vrsta potpore predstavlja <i>de minimis potpore (potpore male vrijednosti sukladno Uredbi EK 1407/13) i sukladno Zakonu o državnim potporama, davatelj potpore dužan je izvještavati Ministarstvo financija o dodijeljenim potporama male vrijednosti</i>. Također, za provedbu ovakve aktivnosti poželjno je izraditi program potpora male vrijednosti te ga javno objaviti. (Isto vrijedi i za ostala tijela javne vlasti poput Komora, Poduzetničko potpornih institucija, županija, udruga poslodavaca)</li> <li>2. Pružanje izravnih potpora i naknada za zapošljavanje, odnosno finansijske potpore poslodavcima za poticanje zapošljavanja NEET-ova kao skupine koja je u nepovoljnijem položaju na tržištu rada, te osobito podskupina koje su u nepovoljnijem položaju, kao što su mladi s niskim stupnjem obrazovanja; zapošljavanje se podupire do 12 mjeseci i omogućuje pojedincima koji su u nepovoljnijem položaju da steknu relevantno radno iskustvo i neovisnosti u svom radu te tako povećaju svoju zapošljivost na otvorenom tržištu rada. Ova aktivnost odvijat će se kao <i>aktivnost pružanja izravnih potpora i naknada za zapošljavanje, odnosno finansijske potpore poslodavcima za poticanje zapošljavanja NEET-ova, ali sukladno Zakonu o državnim potporama</i>. Grad Benkovac će Program potpora prethodno dostaviti Ministarstvu financija koji izdaje Mišljenje.</li> <li>3. Aktivnosti usmjerenе sudjelovanju NEET-ova u (deficitarnim) obrtničkim zanimanjima i stjecanje odgovarajućih praktičnih vještina stipendiranjem i subvencijama za naukovanja te bolje usklađivanje obrazovanja sa zahtjevima tržišta rada i olakšavanje prijelaza iz škole</li> </ol>

	na posao. Grad Benkovac provodit će aktivnosti usmjereni sudjelovanju NEET-ova u (deficitarnim) obrtničkim zanimanjima i stjecanju odgovarajućih praktičnih vještina stipendiranjem i subvencioniranjem za naukovanja na osnovi ovog IP-a i drugih relevantnih strateških i razvojnih dokumenta.
<b>Prihvatljive aktivnosti:</b>	U okviru predloženog programa dodjele bespovratnih sredstava sljedeće aktivnosti se smatraju prihvatljivim. Lista aktivnosti nije konačna te prijavitelji mogu predložiti slične aktivnosti koje doprinose navedenom specifičnom cilju: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Otvaranja obrta ili osnivanja trgovackog društva</li> <li>- Zapošljavanje radnika</li> <li>- Stručno usavršavanje</li> <li>- Polaganje stručnih i strukovnih ispita</li> <li>- Aktivnosti mentoriranja</li> <li>- Aktivnosti promocije</li> </ul>
<b>Ključni rezultati:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proведен Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava</li> <li>- Ostvarene potpore dovele su do smanjenja nezaposlenosti u Gradu Benkovcu</li> </ul>
<b>Pokazatelji:</b>	<p>Sudionici koji imaju posao, uključujući samozaposlene, po prestanku sudjelovanja: 30</p> <p>Broj novozaposlenih osoba: 20</p> <p>Broj osoba koji su zadržale posao 12 mjeseci nakon što su izašli iz mjere: 10</p> <p>Broj poduzeća koje je poduzelo mjeru za unaprjeđenje poslovanja: 20</p> <p>Broj radnika koji su stekli dodatno znanje i vještine: 30</p> <p>Broj stipendiranih/subvencioniranih učenika s deficitarnim zanimanjima: 30</p> <p>Broj izdanih potpora za zapošljavanje: 10</p> <p>Ciljane skupine mjera su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Nezaposleni, uključujući dugotrajno nezaposlene</li> <li>➢ Mlađi od 25 godina</li> <li>➢ stariji od 54 godine</li> <li>➢ Sudionici s invaliditetom</li> <li>➢ Broj sudionika pripadnika romske i drugih nacionalnih manjina</li> </ul>
<b>Trajanje:</b>	Do iskorištenja sredstava
<b>Održivost:</b>	Financiranje rezultata projekta nakon njegovog završetka osigurat će poduzeća koje će provoditi projekte i to iz vlastitih sredstava, sredstava JLS i EU fondova.
<b>Terminski plan provedbe projekta</b>	

		2017		2018				2019				2020				2021			
		3. k v	4. k v	1. k v	2. k v	3. k v	4. k v												
	Priprema projekta / natječajne dokumentacije																		
	Raspisivanje natječaja / ugovaranje																		
	Provjeda projekata																		
<b>Nazivi skica, fotografija i drugih grafičkih prikaza projektnih ideja</b>																			

<b>NAZIV PROJEKTA</b>	Priprema projektne dokumentacije i jačanje kapaciteta za provedbu intervencijskoga plana
<b>Lokacija projekta</b>	Područje provedbe IP-a
<b>Vrsta projekta:</b>	Horizontalni
<b>Razvojni prioritet:</b>	Ovaj projekt nije vezan uz provedbu pojedinog RP nego doprinosi učinkovitoj provedbi Intervencijskoga plana i preduvjet je za ispunjenje svih razvojnih ciljeva te se time svrstava u pojedinačni projekt.
<b>Opći cilj:</b>	<p><b>1. Prostorni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“ Iskoristiti potencijale prostornog značaja Grada Benkovca kroz očuvanje i održivo korištenje prostornih resursa.</li> </ul> <p><b>2. Društveni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“ Ojačati ulogu Grada Benkovca kao središta društvenog života Ravnih Kotara i Bukovice te povećati životni standard građana.</li> </ul> <p><b>3. Gospodarski:</b></p> <p>Povećati kapacitete na području Grada Benkovca za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, s naglaskom na poljoprivrednu i ekološku proizvodnju, prerađivačke djelatnosti, trgovinu i održivi turizam.</p>

<b>Specifični cilj:</b>	Osigurati učinkovitu provedbu Intervencijskoga plana ulaganjem u izradu projektne (tehničke dokumentacije) i jačanje ljudskih resursa Grada Benkovca.
<b>Planska domena:</b>	sve
<b>Vrijednost:</b>	Grupa A: 10 MIL KN <sup>12</sup>  Grupa B: 3 MIL KN
<b>Financiranje:</b>	EFRR 85%, Javna vlastita sredstva 15%
<b>Prijavitelj:</b>	Grad Benkovac
<b>Iskustvo prijavitelja za provedbu projekata:</b>	Grad Benkovac ima značajne kapacitete u pripremi i provedbi infrastrukturnih i razvojnih projekata, posebice zbog obnove infrastrukture koja je devastirana tijekom Domovinskog rata. Grad je do sada pripremao i provodio projekte u području komunalne infrastrukture, stambenih zgrada, javne infrastrukture raznih namjena i poslovne infrastrukture, te za takvu vrstu investicija postoje kapaciteti u gradskoj upravi i gradskim tvrtkama.  Izazov provedbe projekata unutar IP-a je u činjenici da će biti potrebni dostačni kapaciteti u upravljanju projektima iz razloga što je broj projekata i visina ulaganja dosta visoka za koje Grad nema dovoljan broj osposobljenog osoblja.  Stoga je putem ovog projekta potrebno zaposliti nove i osposobiti postojeće kadrove za kvalitetnu i učinkovitu provedbu projekata iz Intervencijskoga plana.
<b>Partneri:</b>	/
<b>Ciljane skupine / krajnji korisnici</b>	<b>Ciljane skupine:</b>  Grad Benkovac (odjeli i zaposlenici)  Novozaposleni na provedbi IP-a
<b>Zrelost projekta:</b>	Tehnička dokumentacija nije potrebna.
<b>Investicijski ciklus projekta:</b>	Grupa A:  Priprema i provedba javne nabave za:  - Izrade studija izvedivosti  - Izrade projektne i tehničke dokumentacije  Grupa B:  1. Priprema i provedba Natječaja za zapošljavanje u Gradu Benkovcu 2. Priprema i provedba javne nabave za konzultantske usluge (jačanje kapaciteta, edukacija djelatnika) 3. Priprema i provedba javne nabave za nabavu opreme u svrhu učinkovite provedbe IP-a

<sup>12</sup> Obzirom da je iznos za izradu tehničke dokumentacije uračunat u pojedinačne vrijednosti projekata u okviru akcijskog plana prikazan je samo iznos za grupu 2/B Jačanje kapaciteta za provedbu IP-a

<b>Provđbeni mehanizam:</b>	Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga
<b>Obrazloženje projekta</b>	<p>Kao preduvjet uspješne realizacije razvojnih projekata iz Intervencijskoga plana, potrebno je pravovremeno pripremiti i izraditi svu projektnu i tehničku dokumentaciju, te provesti aktivnosti jačanja kapaciteta Grada Benkovca za provedbu IP-a.</p> <p>Veliki broj infrastrukturnih projekata koji će se sufinancirati sredstvima EFRR-a na razini su projektne ideje, odnosno u vrlo ranoj fazi razvoja, te je kao prvi korak u njihovoј provedbi potrebno pripremiti svu potrebnu projektnu i tehničku dokumentaciju. To će, detaljnije definirano za svaki projekt ponaosob, uključivati:</p> <p>Grupa A aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Priprema tehničke dokumentacije</b> uključujući idejni urbanističko-arhitektonski projekt, idejni projekt, glavni projekt i izvedbeni projekt, projekt opreme i projekt uklanjanja</li> <li>• <b>Reguliranje potrebnih doprinosa</b> (npr. vodni doprinosi, komunalni doprinosi za dobivanje dozvole za infrastrukturni projekt (glavni projekt))</li> <li>• <b>Izrada Studija izvedivosti</b> i analiza troškova i koristi</li> <li>• <b>Izrada natječajne dokumentacije</b> za nabavu radova, robe ili usluga</li> <li>• <b>Izrada studije utjecaja na okoliš</b> gdje je to potrebno (uz prethodno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode)</li> <li>• <b>Razrada investicijskog ciklusa</b> (analiza postojeće dokumentacije, utvrđivanje dokumentacije potrebne za razvoj i provedbu projekta, procjena finansijske vrijednosti projekta)</li> <li>• <b>Izrada strateških i planskih dokumenata</b> (strategije, planovi, analize strategija, detaljni plan uređenja, poslovni planovi, marketing planovi i sl.)</li> <li>• <b>Ostala dokumentacija</b> i aktivnosti nužne za razvoj i početak provedbe projekta iz odobrenog Intervencijskog plana.</li> <li>• Ostale usluge koje se tiču pripreme projektne dokumentacije (npr. revizija projekta)</li> </ul> <p>Provđba Intervencijskoga plana podrazumijeva dostaone i kvalitetne upravljačke kapacitete na razini jedinice lokalne samouprave. Naime, Grad Benkovac biti će nadležan za provedbu projekata u vrijednosti većoj od 25 milijuna eura u šestogodišnjem periodu. Uz to, bit će potrebno pratiti provedbu cijelog IP-a i voditi brigu o ispunjavanju njegovih pokazatelja. Izazov provedbe projekata unutar IP-a je u činjenici da će biti potrebni dostaoni kapaciteti u upravljanju projektima financiranim ESIF sredstvima za koje Grad nema dovoljan broj osposobljenog osoblja.</p> <p>Stoga je putem ovog projekta potrebno zaposliti nove i osposobiti postojeće kadrove za kvalitetnu i učinkovitu provedbu projekata iz Intervencijskoga plana.</p> <p>Grupa B aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Edukacije</b> i srodne aktivnosti u svrhu jačanja kapaciteta prijavitelja i partnera za upravljanje Intervencijskim planom (edukacije iz područja upravljanja projektima, javne nabave, edukacije iz područja različitih alata za planiranje poput GIS sustava i sl.)</li> <li>• <b>Savjetodavne usluge</b> u svrhu jačanja kapaciteta prijavitelja i partnera za upravljanje Intervencijskim planom (aktivnosti praćenja i upravljanja projektima IP-a, provedbe javne nabave, uspostava i korištenje različitih alata za planiranje i provedbu lokalnih razvojnih projekata poput GIS i sl.)</li> <li>• <b>Zapošljavanje</b> novih zaposlenika kod prijavitelja i partnera za potrebe upravljanja Intervencijskim planom</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revizija projekta</li> </ul> <p>Prilikom pripreme portfolia projekata provedena je analiza radnog opterećenja te je prema planiranim projektima i njihovoj provedbi situacija slijedeća:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Član projektnog tima</th><th>Postotak radnog vremena (%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Voditelj/ica projekta:</td><td>163</td></tr> <tr><td>Koordinator/ica radova:</td><td>272</td></tr> <tr><td>Admin. referent/ica</td><td>77</td></tr> <tr><td>Financijsko računovodstveni referent/ica</td><td>77</td></tr> <tr><td>Stručnjak/inja za javnu nabavu</td><td>26,5</td></tr> <tr><td colspan="2"><b>NOVA ZAPOŠLJAVANJA</b></td></tr> <tr><td>Jačanje kapaciteta stručnjak</td><td>100</td></tr> <tr><td>Jačanje kapaciteta administrator</td><td>100</td></tr> <tr><td>Stručnjaci za razvoj kulturnih sadržaja</td><td>165</td></tr> <tr><td>Upravitelj/ravnatelj Doma kulture</td><td>100</td></tr> <tr><td>Stručnjak za marketing i operativno poslovanje</td><td></td></tr> <tr><td>Doma kulture</td><td>100</td></tr> <tr><td>Djelatnik TZ-a</td><td>100</td></tr> <tr><td>Stručnjak za promidžbu</td><td>160</td></tr> <tr><td>Upravitelj/upravitelji domova</td><td>100</td></tr> <tr><td>Upravitelj PZ</td><td>100</td></tr> <tr><td>Stručnjak/ci za razvoj poduzetništva i inovacije</td><td>100</td></tr> <tr><td>Stručnjak/ci za kamenarstvo</td><td>100</td></tr> <tr><td>Stručnjak/ci za maslinarstvo i uljarstvo</td><td>100</td></tr> <tr><td>Stručnjak/ci za vinarstvo (Sveučilište u Zadru)</td><td>100</td></tr> </tbody> </table>	Član projektnog tima	Postotak radnog vremena (%)	Voditelj/ica projekta:	163	Koordinator/ica radova:	272	Admin. referent/ica	77	Financijsko računovodstveni referent/ica	77	Stručnjak/inja za javnu nabavu	26,5	<b>NOVA ZAPOŠLJAVANJA</b>		Jačanje kapaciteta stručnjak	100	Jačanje kapaciteta administrator	100	Stručnjaci za razvoj kulturnih sadržaja	165	Upravitelj/ravnatelj Doma kulture	100	Stručnjak za marketing i operativno poslovanje		Doma kulture	100	Djelatnik TZ-a	100	Stručnjak za promidžbu	160	Upravitelj/upravitelji domova	100	Upravitelj PZ	100	Stručnjak/ci za razvoj poduzetništva i inovacije	100	Stručnjak/ci za kamenarstvo	100	Stručnjak/ci za maslinarstvo i uljarstvo	100	Stručnjak/ci za vinarstvo (Sveučilište u Zadru)	100
Član projektnog tima	Postotak radnog vremena (%)																																										
Voditelj/ica projekta:	163																																										
Koordinator/ica radova:	272																																										
Admin. referent/ica	77																																										
Financijsko računovodstveni referent/ica	77																																										
Stručnjak/inja za javnu nabavu	26,5																																										
<b>NOVA ZAPOŠLJAVANJA</b>																																											
Jačanje kapaciteta stručnjak	100																																										
Jačanje kapaciteta administrator	100																																										
Stručnjaci za razvoj kulturnih sadržaja	165																																										
Upravitelj/ravnatelj Doma kulture	100																																										
Stručnjak za marketing i operativno poslovanje																																											
Doma kulture	100																																										
Djelatnik TZ-a	100																																										
Stručnjak za promidžbu	160																																										
Upravitelj/upravitelji domova	100																																										
Upravitelj PZ	100																																										
Stručnjak/ci za razvoj poduzetništva i inovacije	100																																										
Stručnjak/ci za kamenarstvo	100																																										
Stručnjak/ci za maslinarstvo i uljarstvo	100																																										
Stručnjak/ci za vinarstvo (Sveučilište u Zadru)	100																																										
Aktivnosti grupirane po EP:	<p><b>EP 1 - grupa aktivnosti A:</b></p> <p>1.1. raspisivanje javne nabave za izradu projektne i tehničke dokumentacije.</p> <p>1.2. provedba ugovora o izradi projektne i tehničke dokumentacije.</p> <p><b>EP 2 - grupa aktivnosti B – tehnička pomoć</b></p> <p>1.1. priprema i provedba javne nabave za konzultantske usluge (jačanje kapaciteta, edukacija djelatnika)</p> <p>1.2. priprema i provedba javne nabave za vanjsku reviziju (jačanje kapaciteta, edukacija djelatnika)</p> <p><b>EP 3 – grupa aktivnosti B – zapošljavanje i stručno usavršavanje</b></p> <p>3.1. priprema i provedba natječaja za zapošljavanje u Gradu Benkovcu 2-3 osobe za čitavo vrijeme trajanja projekta (od druge polovice 2017. do kraja 2022.)</p> <p>3.2. stručno usavršavanje 5 djelatnika za provedbu projekta (upis u e-knjižicu)</p> <p>3.3. stručno usavršavanje 2 djelatnika za postupke javne nabave</p> <p>3.4. stručno usavršavanje 2 djelatnika za GIS tehnologiju i autocad</p> <p>3.5. radionice za ostale sudionike na projektima (djelatnici Grada i partneri na projektima)</p> <p>3.6. 5 studijskih putovanja (u svakoj godini provedbe po 1) za različite područja ulaganja i sektore</p> <p><b>EP 4 – grupa aktivnosti B – nabava opreme i ostalih usluga</b></p> <p>4.1. nabava softvera za GIS tehnologiju</p>																																										

	<p>4.2. nabava 1 licence za autocad</p> <p>4.3. nabava softvera za upravljanje projektom</p> <p>4.4. nabava softvera za upravljanje javnom nabavom</p> <p>4.5. nabava opreme za GIS tehnologiju</p> <p>4.6. opremanje JIP-a sa novom računalnom opremom (5 računala) sa licenciranim programima ( ms office paket)</p> <p>4.7. nabava dva printer-a sa skenerom (za dva ureda u kojima se provodi projekt)</p> <p>4.8. nabava kopirnog uređaja</p> <p>4.9. nabava tri prijenosna računala</p> <p>4.10. nabava projektor-a</p> <p>4.11. nabava vanjskog hard diska</p>
	<p><b>EP 5 Promidžba i vidljivost</b></p> <p>5.1. Marketinške aktivnosti i promocija</p>
	<p><b>EP 6 Upravljanje i administracija</b></p> <p>6.1. Sastanci projektnog tima</p> <p>6.2. Izvještavanje</p> <p>6.3. Financijsko upravljanje projektom</p> <p><b>6.4. Upravljanje projektnim aktivnostima</b></p>
<b>Ključni rezultati:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Izrađena projektna i tehnička dokumentacija za projekte Intervencijskoga plana</li> <li>- Provedena nova zapošljavanja i angažirana tehnička pomoć</li> <li>- JIP kvalitetno opremljen i osposobljen za provedbu Intervencijskog plana</li> </ul>
<b>Pokazatelji:</b>	<b>Sudionici koji imaju posao, uključujući samozaposlene, po prestanku sudjelovanja: 2</b>
<b>Upravljanje projektom (opisati tim uključujući zaposlene i nova zapošljavanja):</b>	<p>Projektni tim:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stručno vođenje provedbe Intervencijskog plana ujedno i voditelj/ica projekta jačanja kapaciteta JIP-a: 100% novozaposleni</li> <li>2. Administrator/ica provedbe IP-a: 100% novozaposleni</li> <li>3. Koordinator/ica radova (ovlašteni inženjer građevine, arhitekt ili dr. tehnička struka.) 10%, Grad Benkovac</li> <li>4. Stručni suradnik za građevinske poslove – 10%, Grad Benkovac</li> <li>5. Stručnjak/inja za javnu nabavu 20%, Grad Benkovac</li> </ol>
<b>Trajanje:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 31. prosinca 2019. godine za <b>Grupu aktivnosti A</b></li> <li>• 30. lipnja 2023. za <b>Grupu aktivnosti B.</b></li> </ul>
<b>Održivost:</b>	Izgrađeni ljudski kapaciteti za provedbu kompleksnih programa i projekata, omogućiti će Gradu da ubuduće provodi veliki broj projekata financiranih ESIF sredstvima.

Terminski plan provedbe projekta		2017		2018				2019				2020				2021			
		3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv												
Priprema projekta / natječajne dokumentacije																			
Raspisivanje natječaja / ugovaranje																			
Provjeda projekata																			
<b>Nazivi skica, fotografija i drugih grafičkih prikaza projektnih ideja</b>																			

### III.2.2 Vremenski plan provedbe

Priprema i provedba pojedinih projekata koji su izabrani kao prioritetni odvijati će se prema planu priloženom u tablici niže u tekstu. Detalje o projektima, njihovim provedbenim elementima i fazama donosi Akcijski plan, Prilog 3 ovog dokumenta.

**Tablica: Vremenski plan provedbe**

Sifra projekta	Naziv projekta	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1RP1	Vodovodne mreže u Benkovacu	p	p	p	i	i	i	
1RP1	Benkovacki sajam - unapređenje infrastrukture i rekonstrukcija stare gradskog suda	p	p	p	i	i	i	i
1RP2	Rekonstrukcija stare gradskog suda	p	p	p	i	i	i	i
4RP1	Uređenje Zavičajnog muzeja Benkavac	p	p	p	i	i	i	i
1RP3	Dom kulture Benkavac	p	p	p	i	i	i	
1RP4	Rekonstrukcija i sanacija nerazvrstanih cesta	p	p	i	i	i	i	i
4RP2	Razvoj tematskih ruta starih antičkih i srednjovjekovnih gradova na prostoru Uredjenje karinaka plaze i pristupaće infrastrukture			p	p	p	p	i
4RP3	Mreža domova	p	p	p	p	p	i	i
2RP1	Izgradnja komunalne infrastrukture Poslovne zone Benkovsko selo	p	p	p/i	i	i	i	
1RP6	Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih dječjih igrališta	p	p	p	i	i	i	
2RP3	Otvoreno poziv na dostavu projektnih prijedloga MSP-a	p	p	p	i	i	i	
1RP7	Otvoreno poziv na dostavu projektnih prijedloga neprilitnih	p	p	p	i	i	i	
2RP4	Projekt poticanja započinjanja (aktivne pripreme) projektnih dokumentacija i jačanje kapaciteta za	p	p	p	i	i	i	
PP1		p	p	i	i	i	i	

**Legenda:**

p - preparation, priprema

i - implementation, provedba

### III.3 UPRAVLJANJE

#### III.3.1 Organigram i odgovornosti u provedbi IP-a

Sustav upravljanja i kontrole programa oslanja se na raspodjelu funkcija i odgovornosti koje su za nacionalnu razinu okvirno definirane Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u finansijskom razdoblju 2014. - 2020. (NN 92/2014) i relevantnim Uredbama o tijelima u sustavima upravljanja za pojedine fondove, odnosno ciljeve. U odnosu na Operativni program „Kohezija i konkurentnost“ i Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“, relevantna je Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem *Ulaganje za rast i radna mjesta* (NN 107/2014, 23/2015).

Detaljna podjela odgovornosti između upravljačkih tijela i gradova nositelja IP-a regulirat će se internim aktima dvaju ministarstava koja vrše funkciju upravljačkih tijela te tripartitnim **sporazumima o provedbi intervencijskih planova**.


**Upravljačko tijelo (UT)** za OPKK je MRRFEU, dok OPULJP-om upravlja MRMS.

Prema gore spomenutoj Uredbi (NN 107/2014, 23/2015), za provedbu specifičnog cilja OPKK 9b1 *Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva* nadležno posredničko tijelo prve razine (PT1) je također sam MRRFEU. Tu funkciju u MRRFEU vrši Uprava za regionalni razvoj koja ima ulogu koordinatora Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije, kako prema MRMS, tako i spram gradova nositelja IP-ova. Funkciju posredničkog tijela razine 2 (PT2) za cilj 9b1 vrši Središnja agencija za financiranje i ugovaranje (SAFU). Za cilj 9.i.2 OPULJP-a (*Jačanje aktivnog uključivanja kroz implementaciju integriranih projekata za obnovu 5 nerazvijenih pilot područja*) funkciju posredničkog tijela prve razine vrši također sam MRMS, dok je za provedbu na razini PT2 nadležan Hrvatski Zavod za zapošljavanje (HZZ).

**Uloga Upravljačkih tijela (MRRFEU/MRMS) u provedbi IP-a:**

- priprema i objava poziva na dostavu projektnih prijedloga za portfelj projekata IP-a, uključujući aktivnosti informiranja i komunikacije na nivou Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije
- sufinanciranje provedbe IP-a u skladu s pravnim okvirom za korištenje ESI fondova
- uspostava i upravljanje radom koordinacijskog tijela Programa – Koordinacijskog odbora, koji će koordinirati i sustavno pratiti provedbu IP-a
- pružanje informacija nositelju intervencijskog plana (Gradu) o tijeku provedbe projekata za koje on nije ujedno i korisnik projekta, a u svrhu upravljanja i izvještavanja o napretku u provedbi IP-a u cjelini
- praćenje izvršenja ciljeva i pokazatelja IP-a, te upravljanje i kontrola nad eventualnim izmjenama planova provedbe IP-a u suradnji s gradovima

Glavni instrument koordinacije tijekom provedbe je **Koordinacijski odbor** Programa, čiji pridruženi članovi su i predstavnici 5 pilot područja, tj. gradova nositelja IP-ova.

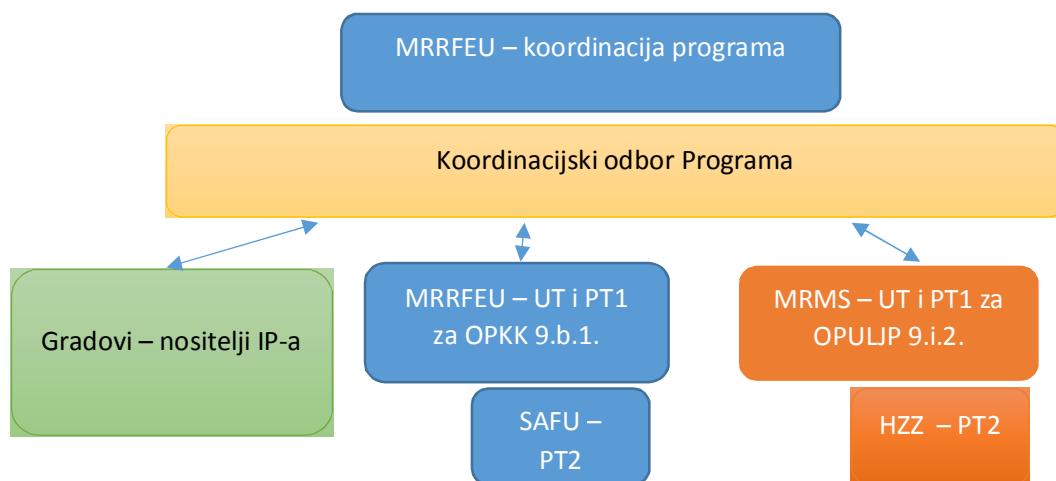

### **Grad Benkovac**

Kao nositelj IP-a, Grad Benkovac na čelu s gradonačelnikom kao odgovornom osobom snosi odgovornost za provedbu svih projekata previđenih Akcijskim planom IP te odgovornost za ostvarenje pokazatelja na razini razvojnih ciljeva i prioriteta.

Kao nositelj IP-a, Grad će imati sljedeće odgovornosti:

- sustavno prikupljanje i obrada podataka o napretku provedbe IP-a, praćenje fizičkog i financijskog napretka provedbe projekata za koje je grad korisnik kao i za IP u cjelini
- izvještavanje o provedbi IP-a prema Koordinacijskom odboru i Partnerstvu za IP
- predlaganje izmjena i/ili dopuna Akcijskog plana – Plana praćenja u konzultaciji s Partnerstvom za IP
- sustavno izgrađivanje sposobnosti, posebnih znanja i vještina djelatnika koji rade na poslovima provedbe i praćenja provedbe IP-a
- provođenje mjera informiranja i vidljivosti za IP
- prema potrebi sudjelovanje u radu Koordinacijskog odbora

U provedbi pojedinačnih projekata, Grad, ali i drugi potencijalni nositelji projekata nadležni su za:

- ispravna i pravovremena priprema projektnih prijedloga i prijava na pozive
- upravljanje individualnim projektima u skladu s uvjetima ugovora (financijski i tehnički management)
- praćenje i ocjenu izvršenja projekta te izvještavanje prema PT2

Na razini pojedinih projekata sve gore navedene funkcije Grada i drugih korisnika/nositelja projekata bit će operacionalizirane u ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava i u obliku detaljnih planova rada.

Stvaranje mreže suradničkih institucija je dio šire uloge informiranja i promidžbe koju Grad ima, a koja je naročito važna. Naime, Grad zbog svojih zakonom određenih ovlasti ima mogućnost prikupljanja i

pristupa informacijama koji dugima nisu dostupni, pa stoga nosi i odgovornost za kanaliziranje informacija i/ili projektnih ideja. Ovo uključuje i potporu potencijalnim korisnicima ugovora o bespovratnim sredstvima koji će se provoditi u sklopu IP-a.

**Jedinica za IP** operativno je zadužena za izvođenje svih gore navedenih funkcija Grada u odnosu na provedbu i praćenje Intervencijskoga plana. Tijekom pripreme IP-a, JIP Grada Benkovca bio je sastavljen od zaposlenika Grada. JIP je za obavljanje svojih funkcija u ime Grada odgovorna gradonačelniku. Gradonačelnik imenovanja i zaduženja članova JIP-a definira Odlukom koja će se, sukladno odredbama Sporazuma o provedbi IP-a i provedenoj analizi radnoga opterećenja te planu zapošljavanja, po potrebi revidirati.

**Partnerstvo za IP** koje je osnovano na početku procesa pripreme IP-a, a čine ga relevantni dionici, bit će uključeno u praćenje provedbe IP-a. PIP sudjeluje u praćenju provedbe IP-a kao savjetodavno tijelo, redovito zaprimajući izvješća o provedbi IP-a.

#### **Ostali dionici uključeni u proces organizacije i odgovornosti za provedbu individualnih projekata**

Za provedbu individualnih razvojnih projekata Grad Benkovac uključiti će i operativna tijela kao što su upravni odjeli Grada, različite lokalne javne institucije i poduzeća. U svakom projektnom prijedlogu definirana su tijela koje će upravljati aktivnostima i nabavom kao nositelj i ili kao partner.

Intervencijski plan provodit će se kao niz projekata/operacija. Pojedinačni projekti potencijalno će se sastojati od jednog ili više ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Njihov odabir provodit će UT-i posredstvom svojih posredničkih tijela, i to dvama ključnim provedbenim mehanizmima:

1. **Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga** – mehanizam namijenjen u IP-u već identificiranim projektima (projekti u portfelju), kod kojih su korisnici definirani u samome IP-u i stoga će poziv biti ograničen na njih. Uz projekte iz portfelja, priprema tehničke dokumentacije i izgradnja kapaciteta koji će Gradu omogućiti da financira pripremu projektne dokumentacije te ojača kapacitete za provedbu IP-a također će se implementirati ograničenim pozivom na dostavu.
2. **Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga** - mehanizam poziva na dostavu prijedloga prvenstveno namijenjen onim IP projektima čiji korisnici nisu unaprijed definirani u IP-u.

#### III.3.2 Plan praćenja provedbe IP-a i održivost projektnih rezultata

Praćenje obuhvaća finansijski i fizički napredak provedbe IP-a. Svrha praćenja jest provjeriti je li provedba IP-a – mjerena pomoću nekoliko vrsta i razina pokazatelja – u skladu s predviđenim planom provedbe te hoće li prethodno postavljen skup ciljeva biti ispunjen u planiranom opsegu i vremenu.

Za Intervencijske planove, praćenje provedbe provodite će se na trima razinama:

- **Projektna razina:** korisnik (potpisnik ugovora) prema PT2 (SAFU za projekte OPKK i HZZ za OPULJP). Izvještavanje na ovoj razini definirano je ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava.

- **Programska (IP) razina:** Grad je obveznik izvještavanja Koordinacijskom odboru Programa, kojeg čine predstavnici MRRFEU i MRMS i svi uključeni gradovi, ali i prema svojem partnerstvu za IP. Obaveze, frekvencija i formati izvješća za ovu razinu izvještavanja bit će definirani Sporazumom o provedbi IP-a. Za funkciju izvještavanja u Gradu nadležan je JIP.
- **Razina OP-a:** ustrojstvene jedinice unutar MRRFEU i MRMS (jedinice koje obavljaju funkcije PT1, prema upravljačkim tijelima, uključujući i prema Odborima za praćenje OP-ova i ultimativno Europskoj komisiji). Izvještavanje na ovoj razini definirano je Pravilnicima o postupanju MRRFEU i MRMS.

Sustav praćenja IP-a obuhvatit će sljedeće korake:

#### Plan praćenja

Plan praćenja izrađivat će se na godišnjoj razini kao dio Akcijskog Plana (prilog IP-u). Obuhvatit će popis planiranih projekata, pokazatelje provedbe, zaduženja oko prikupljanja podataka i izvještavanja, dinamiku izvedbe praćenja te troškove aktivnosti praćenja.

#### Objektivno provjerljivi pokazatelji

Praćenje se provodi unutar definiranog okvira za praćenje provedbe, što podrazumijeva uspostavu sustava kvantificiranih pokazatelja i odgovarajućih izvora provjere kojima utvrđujemo jesu li sadržaj i proces realizirani u sklopu zadanih razvojnih prioriteta. Pokazatelji u IP-u definirani se na razini učinka, rezultata/neposrednih rezultata i ostvarenja IP-a, čime se omogućuje uvid u napredak na operativnoj razini, ali i stanje provedbe u okviru dugoročne realizacije IP-a. Pokazatelji na razini ciljeva imaju dugoročnu dimenziju i prikazuju ciljane vrijednosti do kraja 2023. godine, što znači da će stvarnu ocjenu uspješnosti biti moguće odrediti tek nakon završene konačne evaluacije, odnosno nakon isteka planiranog provedbenog perioda.

#### Prikupljanje, obrada i analiza podataka o provedbi projekata IP-a

Ovaj korak u procesu praćenja obuhvaća prikupljanje podataka o provedbi razvojnih prioriteta, odnosno projekata koji su dio Akcijskog plana. Podaci će od nositelja projekata tijekom provedbe prikupljati JIP te će ih sistematizirati i analizirati u skladu s Planom praćenja. Ova aktivnost provodit će se kontinuirano tijekom cijelog razdoblja provedbe IP-a. Metode za prikupljanje podataka uključit će:

- prikupljanje podataka kroz sustav izvještavanja na razini projekta (korisnici izvještavaju prema JIP-u, koji prikuplja podatke),
- sistematizaciju i analizu podataka iz provedbe projekata u Gradu, tj. JIP-u,
- analizu izvješća o provedbi, razgovore s dionicima i ciljanim skupinama i prikupljanje i analizu podataka iz formalnih izvora podataka i/ili evidencije različitih institucija uključenih u provedbu (u nadležnosti JIP-a).

### Izvještavanje o provedbi

Podaci o provedbi će se nakon analize strukturirati u izvješća o napretku provedbe IP-a, koja će Jedinica za IP slati na pregled i odobrenje Koordinacijskom odboru za provedbu IP-a, a prethodno na uvid i odobrenje PIP-u. Izvješća će biti podloga za procjenu uspjeha IP-a te donošenje odluka o potencijalnim korektivnim mjerama te daljnjoj provedbi razvojnih smjerova. Jednom godišnje, izvještaj o provedbi IP-a (na kraju kalendarske godine) bit će prezentiran Partnerstvu kako bi se dobilo mišljenje i potpora za daljnju provedbu.

Detaljni plan i dinamika izvještavanja, kao i propisani obrasci, bit će sastavni dio Sporazuma o provedbi IP-a.

### Izmjene Intervencijskoga plana

Tijekom provedbe Intervencijskoga plana bit će moguće izmjene plana na način da se ne mijenja definirani strateški okvir, nego po potrebi plan provedbe (relevantno poglavlje dokumenta) i Akcijski plan. Detaljni uvjeti i procedure za izmjenu IP-a biti će definirane u **Sporazumu o provedbi IP-a**.

#### III.3.3 Kapaciteti za provedbu IP-a

Grad Benkovac ima značajne kapacitete u pripremi i provedbi infrastrukturnih i razvojnih projekata, posebice zbog obnove infrastrukture koja je devastirana tijekom Domovinskog rata. Grad je do sada pripremao i provodio projekte u području komunalne infrastrukture, stambenih zgrada, javne infrastrukture raznih namjena i poslovne infrastrukture, te za takvu vrstu investicija postoje kapaciteti u gradskoj upravi i gradskim tvrtkama.

Jedinica za IP grada Benkovca osnovana je sa zadatkom izrade Intervencijskoga plana. Tijekom pripreme IP-a činilo ju je 5 zaposlenika Grada Benkovca, a njihove kompetencije pokrivaju sve relevantne sektore Intervencijskoga plana (poduzetništvo, društvene djelatnosti, izgradnja, komunalna infrastruktura, turizam).

Provedba IP-a podrazumijeva značajne kapacitete na razini nositelja IP-a i tu u područjima:

- Pripreme projekata
- Upravljanja projektima (poznavanje ESIF procedura)
- Financijskog upravljanja projektima
- Izvještavanja na razini projekata
- Praćenja i izvještavanja na razini Intervencijskoga plana
- Sektorska znanja za svaki projekt

Postojeća Jedinica za IP dobra je polazišna točka u stvaranju kapaciteta za provedbu IP-a, te tehnička pomoć predlaže njihovo zadržavanje, međutim, njihovi postojeći kapaciteti nisu dostatni te ih je potrebno značajno ojačati. Plan zapošljavanja bit će izrađen temeljem analize radne opterećenosti i analize

postojećih kapaciteta i poslužiti kao osnova za planiranje dodatnog zapošljavanja u okvirima horizontalnog projekta IP-a „Priprema projektne dokumentacije i jačanje kapaciteta za provedbu intervencijskoga plana“. Kroz horizontalni projekt, bit će dostupna sredstva gradu Benkovcu za jačanje kapaciteta i stvaranje kvalitetnog i dobro kapacitiranog tima za provedbu IP-a.

Jačanje kapaciteta za aktivnosti pripreme i provedbe projekata, te praćenja provedbe IP-a, mogu uključivati:

- Imenovanje postojećih zaposlenika Grada u JIP;
- Zapošljavanje novih osoba u Gradu i njihovo imenovanje u JIP;
- Edukacija i jačanje kapaciteta svih članova JIP-a.

**Preliminarna analiza radne opterećenosti** za provedbu IP Benkovca pripremljena je na temelju detaljnih projektnih obrazaca u kojima je opisan projektni tim, te vremenskoga plana provedbe IP-a. U pripremi horizontalnog projekta, tablica će biti dodatno revidirana, uz diferencijaciju postojećih i potrebnih kapaciteta i poslužit će kao temelj za plan zapošljavanja i pripremu horizontalnog projekta. Tablica koja slijedi sumira broj i količinu pozicija potrebnih za provedbu IP-a:

Član projektnog tima	Postotak radnog vremena (%)
Voditelj/ica projekta:	163
Koordinator/ica radova:	272
Admin. referent/ica	77
Financijsko računovodstveni referent/ica	77
Stručnjak/inja za javnu nabavu	26,5
<b>NOVA ZAPOŠLJAVANJA</b>	
Jačanje kapaciteta stručnjak	100
Jačanje kapaciteta administrator	100
Stručnjaci za razvoj kulturnih sadržaja	165
Upravitelj/ravnatelj Doma kulture	100
Stručnjak za marketing i operativno poslovanje	
Doma kulture	100
Djelatnik TZ-a	100
Stručnjak za promidžbu	160
Upravitelj/upravitelji domova	100
Upravitelj PZ	100
Stručnjak/ci za razvoj poduzetništva i inovacije	100
Stručnjak/ci za kamenarstvo	100
Stručnjak/ci za maslinarstvo i uljarstvo	100
Stručnjak/ci za vinarstvo (Sveučilište u Zadru)	100

Kao što je iz navedene tablice vidljivo uslijed planiranog radnog opterećenja postojećih zaposlenika Grada Benkovca, članova JIP-a dodatna zapošljavanja su nužna. Postoji dodatno radno opterećenje kod stručnjaka za razvoj kulturnih događanja i stručnjaka za promidžbu no ovaj problem pokušat će se riješiti kroz veći broj vanjskih ugovora o uslugama koje će se u okviru pojedinačnih projekata moći provesti.

## PRILOZI

---

PRILOG 1 ANALIZA PODRUČJA GRADA BENKOVCA

PRILOG 2 POSTER PLAN GRADA BENKOVCA

PRILOG 3 AKCIJSKI PLAN IP-A GRADA BENKOVCA

Sadržaj intervencijskog plana isključiva je odgovornost Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Grada Benkovca.

Više o ESI fondovima na stranicama [www.razvoj.gov.hr](http://www.razvoj.gov.hr) i portalu [www.strukturnifondovi.hr](http://www.strukturnifondovi.hr)
